Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Índice de Armado de Pliegos

1. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.-
2. PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-
3. PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES.-
4. CARTEL DE OBRA.-
5. LISTADO DE ANEXOS.-
6. PROYECTO COMPLETO DE PROTOTIPOS.-
7. PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-
8. COMPUTOS.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

OBRAS PÚBLICAS

DECRETO Nº 27/06 GOB – ANEXO - LICITACIÓN PÚBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

BASES GENERALES REGLAMENTARIAS DE CONTRATACION

ÍNDICE

CAPITULO I – DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1º-OBJETO
ARTICULO 2º-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
ARTICULO 3º-ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES

CAPITULO II – DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4º-SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 5º-HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 6º-REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 7º-CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN ARTICULO 8º -ADQUISICIÓN, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN
ARTICULO 9º -DOMICILIO
ARTICULO 10º-PRESENTACION DE PROPUESTAS ARTICULO 11º-PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE ARTICULO 12º-GARANTÍAS
ARTICULO 13º-CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS
ARTICULO 14º-PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES ARTICULO 15º-PLAN DE ACOPIOS
ARTICULO 16º-ACTO LICITATORIO
ARTICULO 17º-ANTICIPOS

CAPITULO III – DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

ARTICULO 18º-MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS ARTICULO 19º-ADJUDICACIÓN
ARTICULO 20º-CONTRATO
ARTICULO 21º-DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA
ARTICULO 22º-AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO
ARTICULO 23º-ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

CAPITULO IV – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ARTICULO 24º-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FÍN ARTICULO 25º-INICIACIÓN DE LA OBRA
ARTICULO 26º-LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA
ARTICULO 27º-CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
ARTICULO 28º-CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - PEDIDOS DE CONTRATISTA
ARTICULO 29º-ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES
ARTICULO 30º-SALARIO DEL PERSONAL OBRERO
ARTÍCULO 31º-NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO ARTÍCULO 32º-CONTRATACIÓN DE SEGUROS
ARTICULO 33º-MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTICULO 34º-MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA ARTICULO 35º-PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS ARTICULO 36º-MATERIALES RECHAZADOS
ARTICULO 37º-MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION ARTICULO 38º-MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
ARTICULO 39º-TRABAJOS DEFECTUOSOS
ARTICULO 40º-OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE
ARTICULO 41º-TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION
ARTICULO 42º- PRECIOS UNITARIOS
ARTICULO 43º-INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA
ARTICULO 44º-CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO
ARTICULO 45º-MULTAS
ARTICULO 46º-CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS ARTICULO 47º-GASTOS IMPRODUCTIVOS
ARTICULO 48º-SUBCONTRATOS
ARTICULO 49º-TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO ARTICULO 50º-CESIÓN DE DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

CAPITULO V – ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51º-MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
ARTICULO 52º-AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES ARTICULO 53º-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA
ARTICULO 54º-APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS ARTICULO 55º-PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS
ARTICULO 56º-SUPRESIÓN DE ÍTEM
ARTICULO 57º- REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL

CAPITULO VI – DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO.

ARTICULO 58º-MEDICIÓN DE LAS OBRAS ARTICULO 59º-
MEDICIÓN FINAL
ARTICULO 60º-NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN ARTICULO 61º-CERTIFICADOS DE PAGO
ARTICULO 62º-FONDO DE REPAROS
ARTICULO 63º-INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VII – DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN ARTICULO 64º-CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS ARTICULO 65º-RECEPCIÓN PROVISORIA
ARTICULO 66º-RECEPCIÓN DEFINITIVA

CAPITULO VIII – DE LA RESCISIÓN Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67º-RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - ARTICULO 68º-REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: NORMATIVA Y METODOLOGÍA

CAPÍTULO X – PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO

ARTICULO 69º-PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

OBRAS PÚBLICAS LICITACIÓN PÚBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1º - **OBJETO:** Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o servicio de industria que deba realizarse de acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustarán las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecu- ciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como así también la Rescisión y sus efectos.

ARTICULO 2º - **DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS**: Los Pliegos General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la documentación necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso especí- fico, siendo firmada por las partes e integrándose al Contrato.

ARTICULO 3º - **ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES**: A los efectos de la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados en el Artículo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado a licitación del Comitente.
OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas condiciones un trabajo licitado.
ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada.
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento en que éste adquiere validez legal.
AUTORIDAD COMPETENTE. ADMINISTRACION. REPARTICIÓN. COMITENTE.
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la función de Dirección de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitación y compromisos contractuales.
DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la Dirección de la obra.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra Pública.
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.
SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-
LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en formular ofertas.
CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar.

CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS -

ARTICULO 4º - SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS: La contratación de Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por el Artículo 10º Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº 635l: **a)** Contrato de obra pública que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administración delegada; 5) por combinación de estos sistemas entre sí; 6) por otros sistemas que como excepción se pueden establecer - **b)** Concesión de obras públicas.
El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICULO 5º - HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones.

ARTICULO 6º - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:
La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitación, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administración, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. **En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura.**

La propuesta se presentará de la siguiente forma: el **"SOBRE Nº 1"** que contendrá en su interior los documentos detallados en el Punto **"CONTENIDO SOBRE Nº 1".-**

Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el que conste el número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original y dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original.
Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo extendido por la Administración. En caso de que el oferente esté constituido por Unión Transitoria de Empresas – U.T.E., la constancia de adquisición del legajo deberá estar extendida a nombre de dicha unión; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitución de U.T.E. para la obra, será válido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.

b) El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1 M.E.H.O. y S.P.

c) La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:
1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.- o en la Tesorería General de la Provincia.
2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotización en bolsa a favor del Comitente o al portador.
3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.
4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R..
5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administración Pública Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley Nº 4.035 del último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado presentará una declaración jurada de no haberlo hecho.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. - los de cada una de ellas; así como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situación. Constancias de inscripción ante los Organismos Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Números de inscripción del Proponente en: Dirección General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción en el Impuesto al Valor Agregado, Dirección General de Rentas de Entre Ríos - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la administración.

f) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres (3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo.

g) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente en los últimos quince (15) años.

j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

k) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto Nº 5908/98.

l) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y ejecución del contrato, en la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Avance de obra, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido.

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

p) Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del presente pliego.

q) Líneas de créditos bancarios si las tuviera.

r) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance.

s) Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, además de presentar todo lo indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO".

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 – arts. 377 y sgtes.- con certificación de firmas ante Escribano Público.
Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra.
4) La designación de un representante de la U.T.E..-
5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

v) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la Industria de la Construcción.

w) Así también deberán presentar:

1 **sociedades comerciales**, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o autoridad de contralor:

- constancia de inscripción como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
- **Empresas Unipersonales**:
- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del Código de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación.

z) Sobre Nº 2.

a)Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de rechazo de la propuesta presentada.

Contenido Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2 - **Propuesta Económica** - debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación:

a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por válido el original.

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem.

d) Los precios de referncia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformaidad a lo establecido en el artículo 7° del Decreto N° 2715/16 MPIyS

e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.

La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la descalificación inmediata de la oferta correspondiente.-

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de **"Variantes"**, los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b) - certificado de capacidad de contratación anual (copia certificada) - inciso c) garantía de oferta – inciso z) Sobre Nº 2 - serán causales de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 - Propuesta Económica - por la autoridad que presida el acto.-

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, **será rechazada la Propuesta**.-

ARTICULO 7º - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a saber:

a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su área de influencia, régimen de cursos de agua, características topográficas y climáticas que importen al desarrollo de la obra y la situación de linderos.

Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución de los trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendrá en cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea **por unidad de medida o por ajuste alzado**, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8º - ADQUISICIÓN – CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN: Todo interesado en concurrir a la licitación debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitación, el que será entregado por el precio que se fije en el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio y número telefónico.-

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que consideren necesarias durante la preparación de las propuestas, para una mejor interpretación de los documentos gráficos y escritos de la licitación.

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitación, excluida esta última.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentación por medio de volantes numerados que pasarán a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, notificándolas al domicilio registrado.-

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

tercer día hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitación, dándose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún cuando no se concurra a dicha recepción.

ARTICULO 9º - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el interesado deberá constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Paraná, donde se efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Paraná - Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos.

El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10º - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional.

El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en la licitación.

No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada ítem.

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará prioridad al escrito en letras.

El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentación contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligación de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días posteriores a la recepción definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidirá en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se efectúa por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización.

Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los análisis de precios que se acompañen, al punto de demostrar desproporciones y des- viaciones que denoten falta de seriedad en la formulación y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotización que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningún cambio ni deformación en la propuesta.

ARTICULO 11º - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorización al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentación de la oferta de este último, obligatoria para el proponente.

La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego Particular podrá exigir en su caso, la presentación del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficación a tinta.

Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su naturaleza impida su mejor concreción a máquina.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materialización.

Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demás datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego Complementario, las variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodología de control, formas de medición, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada ítem y penalidades. El total de estos requisitos deberá contar con la aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique una obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12º - GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías:

a)**DE OFERTA:** UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantía o el comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la propuesta.

b)**PARA LA CONTRATACION**: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado.

I. Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, deberá ser depositada en la TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedirá la constancia con mención del Nº de la Licitación y denominación de la obra para la cual se efectúa el depósito.

II. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan "Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o bonos emitidos por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex-cupón corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos efectivice el importe de la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administración procederá a retener la cantidad que corresponda

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha notificación.

III. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de los recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación:

a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil **(1)**.

b) Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el Banco Central de la República Argentina.

IV. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos deberán concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos exigidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

c) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantías respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las

(1) Observación:Artículo sustituido por Art. 1583-1587 Código Civil y Comercial de la Nacion

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

obligaciones a su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13º - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS: Las Empresas que concurran a la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de contratación anual, otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS, conforme
exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYSP-

Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la fecha del Acto Licitatorio.-

La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la presentación de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos en el que conste una Capacidad de Contratación Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en años.

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la Repartición. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14º - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: El Oferente esta obligado a presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentación. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas que regirán como modelo a seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba especificar. Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para cada ítem o grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas.

Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al total de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se deberá consignar monto alguno). Se acompañará además una curva de inversiones.

El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto. Igualmente, se tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén específicamente previstos en los pliegos de licitación, tal como lo estipula la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la documentación contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la programación inicial.

El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida resolución fundada en aceptación por parte de la Administración. No serán justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demás condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicará mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podrá establecer los períodos de tiempo en que se efectuarán los acopios.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formará parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, según se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificación y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los valores básicos de certifica- ción, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems o rubros motivo del acopio.

Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se efectuarán en fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administración por el tiempo que demande la relación contractual, deberán estar res- paldados por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisición por la Administración, a los precios de plaza y a su simple requeri- miento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 12 - "Garantías" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del Organismo Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de división y excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, como asimismo estipular una limitación de plazo para la utilización luego de la certificación, lapso en el cual deberán realizarse los desacopios.

ARTICULO 16º - **ACTO LICITATORIO**: En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto de la Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.

A continuación se procederá a la apertura de los **Sobres Nº 1 - exteriores -,** verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los **Sobres Nº 2 - propuestas económicas,** leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y **si estuviera contemplado**, se procederá a la apertura de los sobres que contengan **Variantes.**

Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen. Las expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación.

De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo.

ARTICULO 17º - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en su totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido por el Artículo 12º del presente Pliego.

CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO -

ARTICULO 18º - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos desde la fecha de la Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado al presentar su propuesta.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automáticamente por Treinta (30) días más.

El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley 6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19º - ADJUDICACIÓN : La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación. La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguirá la metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial Nº 9353.

El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si se la considera conveniente. En aquellos casos que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes se llamará a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevará a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Públicas y el Decreto Reglamentario, aplicando también las normas allí previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitación Pública. Licitación Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de aquel. En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Artículo y comunicará el hecho a la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos para la aplicación de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de las bases de la licitación.

La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de

resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el plazo establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20º - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecución de las obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perderá el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de la Administración y además se comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP - ART. 3º: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN.

La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la documentación oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista deberá abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el depósito de garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto según la disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días corridos. El Organismo Comitente procederá de oficio para aquellos que no lo

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

solicitaron, a devolver los depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la adjudicación al domicilio denunciado en la Licitación.

ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la alteración o modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo con el Artículo 12º del presente.

ARTICULO 23º - ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal como se infiere del análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que deberá prestar. Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos serán corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primarán según el orden asignado a continuación:

1. Ley de Obras Públicas.
2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas.
3. Contrato.
4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente Pliego).
5. Pliego General de Condiciones Único.
6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4).
7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
8. Planos tipo.
9. Planos de detalle.
10. Planos Generales.
11. Cómputos.
12. Presupuestos.
13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los mismos y se consideran como especificaciones complementarias.

CAPÌTULO IV - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24º - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Inspección.

IAPV IAPV IAPV

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a satisfacción del Comitente que posee los títulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administración y verificados por la Inspección (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una modificación de este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión y ejecución del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue más conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecución.

La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la obra.

El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ítem específico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el ítem previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a la Administración y autorización por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripción del proyecto o documentación de base para formular la oferta, dará derecho al Contratista a solicitar la fijación de nuevo precio en el ítem en cuestión.

ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación dentro de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicación de la Administración al Contratista deberá realizarse con diez (10) días de anticipación a la fecha de iniciación que se fije.

En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedará obligado a conservar por su cuenta y que servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La remoción de los mismos deberá ser comunicada a la Administración con la debida anticipación. Para el caso de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y deberá efectuarse la notificación con sesenta (60) días corridos de antelación.

A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, útiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revi- sión de los replanteos de detalles que la Administración considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuará un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares establecerán el lapso del plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al contratista, este tendrá derecho a requerir:

a) Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daños o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su ejecución con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá presentarse dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de los trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de testigos o autoridades competente; se considerará que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administración, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como causal sujeta a rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del plazo máximo de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26º - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán:

1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio.
2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3. Libro Diario.
4. Libro de Movimiento de Materiales.
5. Libro de Sueldos y Jornales.
6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro de sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija. El formato de los mismos será de tamaño IRAM A4- deben tener numeración correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspección.

ARTICULO 27º - CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en obras similares. Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia de Entre Ríos. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación de que se trate, será establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo Comitente antes de la iniciación de los trabajos. La aceptación de la oferta de licitación no implica la aceptación del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerará autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de terrenos o lechos de ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conducción. Toda inasistencia deberá justificarse por escrito ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspección y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en relación a su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán en el Pliego Complementario de Condiciones.

La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la Administración Pública hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo de un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios.

ARTICULO 28º - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervisión de las obras estará a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hará conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fábrica. La inobservancia de esta obligación, hará pasible al Contratista de las sanciones que la Administración resuelva aplicar, conforme a los Artículos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o eximirá de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de estructuras y de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspección, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal carácter.

La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión. Serán imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescisión del contrato.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión de Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentación, no siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observación o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejará constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) días corridos, dichas observaciones deberán ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decisión al respecto. Vencido dicho plazo, caducará todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedarán fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o presentar los suyos para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos con respecto a la fecha de su utilización en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinación de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideración por parte de la Administración.

El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición actualizadas que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones podrán requerir

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u otros indicativos de las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisión y control respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración que tenga en relación al organismo Comitente. –

ARTICULO 29º - ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dicten.-
Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a la aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351.-

Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerirá el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hará pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administración abonar directamente al personal

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspección la documentación necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:
Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se desempeñe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de cargas sociales, pagadas, según lo prevé la Ley. Dicha nómina deberá contener:

a) Apellido y nombre del obrero.
b) Documento de identidad.
c) Domicilio.
d) Categoría.
e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones.
f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30º: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO –
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberá mantener permanentemente al día el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo Nº 56 de la Ley Nº 20774.-

El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamación y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) años de residencia en la misma. Todo personal deberán conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos - I.A.P.S.E.R..- los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por parte del Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros, impedirá el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar mediante constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente será hasta la recepción definitiva. La administración se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la garantía de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese período.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al estado de las señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relación al tipo de obra y lugar de realización.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o fuerza mayor.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse las obras.

ARTICULO 34º - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepción se regirá de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspección. La no obser- vación o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximirá al contratista de su responsabilidad para la ejecución de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio de ello, por vía de excepción y mediante autorización escrita, podrá disponerse la aceptación de materiales usados que permitan llegar a una opinión favorable, sujeto al ajuste de precios más conveniente a la Administración. Aquellos casos que no se estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de rechazo inapelable.

Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración.

Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para aquellos casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la comunicación de la aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos para los que se inspeccionen en obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los necesarios para el envío de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de fabricación exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por las

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas. El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, requieran el mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor período que el fijado en el plazo de garantía de la misma y según lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedará obligado a responder por sí o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesión de garantía deberá hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este caso.

Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina en la planilla de datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el Organismo Comitente tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepción de respuesta da por cumplimentada la obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario podrá llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna índole.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto en los Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial.

ARTICULO 35º - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estará a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisión, extra- cción, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del personal de Inspección que fuere necesario. La extracción de muestras será determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración podrá disponer la realización en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación no menor de diez (10) días corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente las pruebas o ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la Inspección en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobación, los que serán autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, serán redactados directamente o por traductor público nacional con título habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los parámetros medidos se expresarán en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o elemento de importación.

La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier índole se procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacon- dicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocación, instalación y funcionamiento.

ARTICULO 36º - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa notificación con indicación del lugar del depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

La Administración no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37º - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la ADMINISTRACION podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la documentación contractual.

En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del proyecto que establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en las Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto de los artículos remitidos, dejándose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspección.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposición por mal empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podrá convenir a su exclusiva aceptación el resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al comprometido.

El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamación alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil (2) y la Ley Nº 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos últimos casos le serán abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos.

(2) Observación : Código Civil y Comercial de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán ser apilados en un punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspec- ción disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas serán abonados al Contratista previa demostración de su importe.

ARTICULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalación adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido.

La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Código Civil(3)

Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la Administración.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección podrá ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen com- probados, los gastos originados estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 40º - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente igual validez; donde se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

(3) Observación: Código Civil y Comercial de la Nacion

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 41º - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedará eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con los otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de materiales y enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demás contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra con- cluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidación.

Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodología distinta); el costo que demande la utilización de los materiales que suministre la Administración a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provisión y depreciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos ítem, se estipulan en el Artículo Nº 55 de este Pliego “Precios de nuevos ítem”.

ARTICULO 43º - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación mínima de sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o construcciones ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días corridos de anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización de la Administración.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El CONTRATISTA será responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado.

La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos obstáculos no figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de los obstáculos que deban preverse.

ARTICULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando como base de comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la aplicación de sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciación o marcha de los trabajos.

El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Artículo Nº 509 del Código Civil)(4) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas que quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna.

(4) Observación: Artículo sustituido por Art. 886-887-888 del Código Civil y Comercial de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá derecho a solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La Administración podrá acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la disminución del ritmo y ampliación del plazo se expone en el Capítulo V - Artículos referidos a prórroga en los plazos contra- ctuales.

ARTICULO 45º - MULTAS: Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentación anexa que así lo indique.

ARTICULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente las condiciones existentes al momento de la contratación.
Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la rescisión del contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones recíprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato.

La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido específicamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, serán inventariados previa inspección para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimará su reposición en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

afectación de las garantías y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier índole, salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad.

La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnización y/o reparaciones por daños, el Contratista deberá presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompañando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente.

Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún cuando se trate de siniestros de pública notoriedad.

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará el término dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto por aplicación de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones respectivas.

La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación deberá resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e inventario requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de no producirse resolución dentro de dicho término.

Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Artículo referido a "seguros".

ARTICULO 47º - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, serán reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la Administración dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconoci- miento por incumplimiento del término previsto.

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o parcial o la disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluirá en ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar cesión o asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontratación de parte de la misma deberá obtener previamente la autorización por escrito de la Administración.

A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las firmas por Escribano Público.

Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el Contratista.

Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposi- ciones de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes podrá ceder o transferir el **contrato** total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 6351 - Artículo Nº 44º -.

La autorización para ceder o transferir el **contrato** por parte de la Administración deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unión Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente establecerá las condiciones en que admitirá la misma.

ARTICULO 50º - CESIONES DE DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS:

A)**Cesiones de Derechos o de Créditos:** En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguirá :

a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecución de las obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administración, con el importe líquido que resulten una vez operada la compensación estipulada en el inc. B) del presente artículo y previa deducción de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a **Certificados de Obras expedidos** y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la Administración se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351).-

c). Las cesiones a que se refiere los incisos **a) y b)** anteriores, sólo podrán hacerse por el importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.-

B)**Compensación de Créditos y Deudas:** La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la compensación correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de acuerdo a las siguientes causas:

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisión contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del Contratista, tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.
Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se establecerá en el Pliego Complementario de Condiciones o documentación anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentará los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluación y autorización del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estará sujeto a los términos estipulados en el Artículo 44ª **-** y deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorización.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administración, mediando para ello la presentación del Contratista solicitando la ampliación del plazo contractual, juntamente con la justificación que acredite la lesión financiera en relación al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondrá la prórroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente resolución.

En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha del hecho que originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su consideración.

ARTICULO 52º - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las inversiones para el período considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regirá el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) días corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada o porque la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicación, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que será reconocido por la Administración.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendrán precios nuevos.

ARTICULO 54º - APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS: En consideración a las modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún ítem un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario por análisis y de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de aumento, solo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho ítem.

b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios básicos de licitación estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho.

ARTICULO 55º - PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la Administración por analogía con los precios contractuales o en su defecto por análisis de precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionará los porcentajes que el Contratista haya fijado en los análisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado.

Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el costo real; más los gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspección constatará los materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditación del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM: Cuando se supriman ítems, que no superen las condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinándose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento será el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán los gastos generales por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

2) Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57º - REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el Contratista deba reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

ARTICULO 58º - MEDICIÓN DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se medirán mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero en ningún caso podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Organismo Comitente deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad en la medición o calificación deberán ser formuladas en la primer oportunidad de su constatación, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspección deberá documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspección considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59º - MEDICIÓN FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de terminada la obra se procederá a su medición final.

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá efectuar una presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación del Contratista.

ARTICULO 60º - NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN: Las normas generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el orden de prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y formas de medición para cada rubro o ítem, seguirán las normas especificas que establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentación contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por ítem en relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las cantidades ejecutadas en el período correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será acompañado con la planilla de Cómputo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición se realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de certificación, el cual será estimado por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del ítem.

Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto a la presentación de los análisis de precios.

ARTICULO 61º - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán los recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de las áreas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios.

La emisión de los certificados y el plazo de pago quedará supeditado al cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administración podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la emisión de los certificados de obra, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Públicas.-

El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados.

Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la adecuación a exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendrá derecho a la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales tendrán carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en el certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposición de la Administración.

El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la Recepción Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se procederá a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente se comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten.

IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 62º - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la correcta ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente Pliego.-

ARTICULO 63º - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la documentación contractual. Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nación Argentina.

CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN -

ARTICULO 64º - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la Administración y de común acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales liberarán la parte proporcional de garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la recepción definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) días corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65º - RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administración fijará un plazo para la ejecución de las observaciones que se formulasen, transcurrido el

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención de Terceros. Los gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deducción del certificado final o de las garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la habilitación de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la recepción provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantía fijado en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el período de garantía. En esos casos el Contratista será fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo deberá acompañar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones para su presentación.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al efecto.

ARTICULO 66º - RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectúe la Administración, la cual intimará al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no excederá el plazo de garantía original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación de la liquidación, intimándose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Públicas.

La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código Civil.(5)

CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP.-

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS -

ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGÍA: Se efectuará conforme al Decreto N° 2715/16 MPIyS y normas complementarias.-

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTÍCULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el **Artículo 6º - inc. t)** - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes

(5) Observación: Artículo sustituido por Art. 1273-1274-1275-1277 del Código Civil y Comercial de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

de origen extranjero, además de todos los requisitos detallados y exigidos en el **Artículo 6º** - deberán presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley Nº 23.458 que aprueba la Convención suprimiendo la exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
b) Declaración jurada de la nacionalidad del oferente.
c) Contar con un Representante legal en la República Argentina, munido de carta poder.
d) La personería mediante documentación equivalente y cumplimentar además los requisitos exigidos por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.
e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, según corresponda, deberán estar:

- aprobados por el Órgano competente similar en el exterior.
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el país, de conformidad a las normas contables vigentes en la República Argentina.
- estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor oficial con título nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traducción por dicho Colegio.
g) Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con sus Certificados de Importación de la Aduana Nacional.

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Provincia de Entre Ríos

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

BASES TECNICAS GENERALES

INDICE

1. **NORMATIVA DE PROYECTOS**
1.1 REGLAMENTACIONES
1.2 NORMAS URBANAS
1.3 NORMAS DE DISEÑO DE LA VIVIENDA
1.4 NORMAS DE CONSTRUCCION

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

BASES TECNICAS GENERALES

1. NORMATIVA DE PROYECTOS

1.1. Reglamentaciones

Los proyectos a financiar dentro de la presente operatoria, deberán cumplir estrictamente con las reglamentaciones de estas bases técnicas, en cuanto no se opongan a lo establecido en las Bases Generales de Contratación que forman parte de este pliego. Respecto a las normas, reglamentos, códigos y ordenanzas jurisdiccionales, el Organismo Ejecutor, conjuntamente con la Municipalidad respectiva determinarán sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen colisión con las presentes Bases Técnicas Generales y las fijarán cuando no existan, las que se expresarán en el Pliego de Condiciones Particulares.
Para los efectos de su cumplimiento, las siguientes especificaciones y normas (urbanas, de vivienda y de construcción) se considerarán como niveles o requisitos funcionales mínimos de cumplimiento obligatorio, los que únicamente podrán adecuarse a las diversidades y variantes regionales, en los casos en que tal adecuación implique la optimización de las soluciones técnicas, espaciales y económicas de los proyectos. Cualquiera sea la modalidad de licitación prevista en la convocatoria, los oferentes podrán cotizar proyectos propios o variantes de diseño, elementos, materiales, sistema y/o procedimientos constructivos distintos a los especificados en el proyecto siempre y cuando igualen o mejoren los umbrales mínimos estipulados en estas normas.
Asimismo el incumplimiento de las presentes reglamentaciones, podrá determinar la nulidad o descalificación de la oferta.

1.2. Normas urbanas

1.2.1. El terreno

1.2.1.1. Localización

Los terrenos a ser utilizados para el emplazamiento de conjuntos habitacionales deberán estar ubicados en áreas urbanas, consolidadas o a consolidar, preferentemente que presenten disponibilidad de infraestructura y servicios urbanos existentes, con capacidad para atender al conjunto proyectado.
Respecto a criterios de localización y usos del suelo tendrá que requerirse el visado correspondiente por la Municipalidad respectiva en común criterio con el Organismo Ejecutor.
Para todas las diferentes alternativas de localización, deberá demostrarse necesariamente la factibilidad real de servicios para poder conectar el conjunto habitacional a las redes de infraestructura de saneamiento básico, vial y de energía existentes, para lo cual tendrá que contarse con los estudios pertinentes, debidamente certificados por la repartición específica en cada caso, provincial o municipal correspondiente.
En los acápites 1.2.2.4. y 1.2.2.5. se indican los requerimientos básicos y condiciones que deberán cumplimentar los proyectos que se oferten, a nivel de infraestructura interna, de nexo y de equipamiento comunitario, los que incuestionablemente gravitarán en la selección final de los terrenos a proponer.
Asimismo será necesario presentar certificado de factibilidad y mantenimiento de servicios urbanos de la Municipalidad correspondiente, la que asumirá a su cargo los servicios de

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

recolección de residuos, conservación, barrido y limpieza de calles y de transporte urbano, del respectivo conjunto.

1.2.1.2. Calidad

Esta deberá respaldarse mediante estudios técnicos que permitan demostrar la aptitud del terreno elegido para la construcción de conjuntos habitacionales. Para ello se hará necesario cumplimentar los análisis que determinen la conveniencia o no de su utilización y por lo tanto la incidencia en el costo final del proyecto, el que deberá ajustarse estrictamente a los valores fijados en la licitación. Asimismo dichos requisitos serán de realización indispensable, pues en ningún caso se autorizarán adicionales imputables a rubros de obra, derivados de condiciones no previstas del suelo, tanto en los casos en que los terrenos sean aportados por los Organismos Ejecutores, como por los oferentes. Esta salvedad será válida tanto para obras de infraestructura como para fundaciones edilicias. Los estudios que más adelante se indican deberán formar parte del Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas cuando el terreno sea aportado por el comitente o de la oferta cuando este sea proporcionado por el oferente, y tendrán que centrarse principalmente en garantizar las siguientes condiciones:

- Aptitud, calidad y capacidad portante del suelo, demostrando las características del mismo y el tipo de fundaciones convenientes a utilizar para la obra a construir.
- Topografía y niveles, que hayan sido considerados en el diseño del proyecto de forma técnicamente aceptable y que su incidencia en los costos de construcción quede debidamente incluidos en la oferta, tanto para obras de infraestructura, como edilicia.
- No inundabilidad, para lo cual deberá demostrarse que no existen riesgos de eventuales inundaciones del terreno, debiendo aportarse aprobación de la Dirección de Hidráulica Provincial o del Organismo competente en la jurisdicción.
- Permeabilidad capaz de asegurar una rápida absorción de las aguas de lluvia.

Y cualquier otra condición que el Organismo Ejecutor o el oferente estimen necesario para una más conveniente evaluación del terreno.

1.2.2. La urbanización

1.2.2.1. Densidad

Las densidades, factores de ocupación y uso del suelo, serán adoptados de las normas provinciales y/o municipales vigentes. En caso de no existir, se procederá a establecerlos de común acuerdo entre el Organismo Ejecutor y la Municipalidad respectiva, fijando la máxima densidad de ocupación del suelo aceptable para la propuesta.

Dicha información se indicará en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.2.2.2. Diseño de conjunto

Los diseños de los conjuntos habitacionales procurarán proponer una organización del espacio, que exprese la necesaria unidad y armonía de los diversos componentes que lo conforman tanto de lo edificado como de los espacios abiertos, respondiendo adecuadamente a los requerimientos sociales, culturales y económicos de sus habitantes, e integrándose a su contexto construido y natural.

Recomiéndase dar especial tratamiento a la disposición de los edificios, evitando en lo posible situaciones de monotonía por repetición de una sola tipología y de agrupamiento de unidades, proponiendo preferentemente mezcla de tipos y agrupamientos, así como la complementación de vivienda unifamiliar y multifamiliar en conjuntos que superen las cien viviendas, pero considerando en todo caso, las características y densidades propias del lugar.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Procurarán dar una adecuada respuesta a los condicionantes climáticos de la región en que se localice, tanto las viviendas como los demás espacios que se generen en el conjunto.
En términos generales se tenderá en todos los casos a buscar la optimización del diseño, proponiendo una racional utilización del espacio urbano y una adecuada respuesta a las condicionantes del hábitat.
Asimismo estos aspectos se verán relacionados con las características de la población a asentar, la localización del conjunto, la densidad a adoptar como más apta a su situación urbana, por la variable costo / volumen de producción que definirá la economía de escala que aplicada a la cantidad de viviendas a construir produzcan un beneficio porcentual de reducción de costos y por la incidencia que sobre el conjunto tengan el valor del terreno y la infraestructura.
En cuanto a los criterios a adoptar para la altura, distribución y separación de los edificios, deberá remitirse a asegurar el soleamiento diario mínimo que fijen las normas municipales o provinciales. En su defecto dicho mínimo será establecido conjuntamente por el municipio y el Organismo Ejecutor. Los valores asignados se adecuarán a la latitud y condiciones Particulares de localización.
La ubicación de los edificios (vivienda unifamiliar y/o multifamiliar) procurará asegurar el aprovechamiento racional del terreno y contribuir, a la configuración de áreas libres aptas para el desarrollo de actividades comunitarias, recomendándose que dichas áreas sean concebidas con el criterio de complementar visual y espacialmente el ámbito propio de cada vivienda y su conjunto.
Para complementar el tratamiento de los espacios libres se podrá recurrir a la forestación del conjunto, contemplando la utilización de especies autóctonas rústicas que permitan reducir al máximo los costos de mantenimiento y reposición. Los Pliegos de Condiciones Particulares, podrán establecer la cantidad y especies a utilizar.
Su disposición contemplará el control y protección de los agentes climáticos de la zona (sol, viento, temperatura, etc.).
Deberán considerarse para situaciones de viviendas en alturas y en zonas de alta y media densidad y para viviendas frente a senderos peatonales, áreas para estacionamientos de vehículos particulares atendiendo a: el tamaño del conjunto proyectado; las condiciones del área urbana del entorno; y el índice de motorización de la población del lugar y a asentar. La cantidad mínima a considerar será establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.
Para cumplimentar los requerimientos de las presentes condiciones de diseño se exigirá la responsabilidad técnica de la urbanización por profesionales universitarios habilitados, lo mismo que para el proyecto de los diferentes aspectos involucrados, quienes deberán avalar los diseños de la vivienda y la urbanización, como así también las construcciones respectivas.
En el caso de no encontrarse el terreno comprendido dentro de regulación urbanística, se requerirá la intervención de un planificador urbano, a los efectos de proponer la regulación de esa tierra. Dicha propuesta normativa deberá aprobarse previamente por la Municipalidad correspondiente en consulta, a su requerimiento, con el organismo jurisdiccional respectivo.

1.2.2.3. Fraccionamiento

Para proceder al fraccionamiento, subdivisión y/o parcelamiento del terreno y en consideración a las condiciones de diseño que proponga el oferente se cumplimentarán los siguientes requerimientos:

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

- Conformación de bloques o amanzanamientos, los que deberán dimensionarse asegurando la continuidad de las vías de interconexión existentes o previstas. La trama del nuevo conjunto deberá ser compatible con la trama urbana existente, para facilitar su integración física.

En todos los casos se tenderá al racional aprovechamiento del terreno y a una optimización de su fraccionamiento, tendientes a reducir al máximo posible el porcentaje de calles e infraestructura.

El diseño del conjunto y de las redes de infraestructuras de distribución interna, deberá concordar con la delimitación de los sectores, para poder incorporar luego el mismo criterio a su conservación y mantenimiento por parte de los consorcistas.

- Índice de la superficie libre

La superficie libre mínima común y no edificada de los conjuntos habitacionales, será de 6 m2/hab. para viviendas individuales y 10 m2/hab. para viviendas colectivas.

Para los efectos del cálculo se considerarán:

4 habitantes para la vivienda de 2 dormitorios y 6 habitantes para la vivienda de 3 dormitorios.

Esta superficie se computará excluyendo la propia de la parcela y estará destinada al espacio exterior previsto para los siguientes usos:

1) plazas, espacios verdes, parquizados, recreativos y deportivos.
2) circulaciones peatonales internas de los bloques y áreas de estacionamiento.
3) áreas previstas para equipamiento comunitario incluyendo los espacios exteriores propios de los equipamientos.

- **Mensura con fraccionamiento:** Para todos los conjuntos habitacionales, el plano de mensura se deberá ejecutar una vez techadas las viviendas y deberá incluir, además de la subdivisión, las mejoras de las mismas y siempre que se indique expresamente en el Pliego de Condiciones Particulares o sea de exigencia municipal, las superficies de reserva de uso público o exclusivo destinadas a equipamiento comunitario, así como las circulaciones y estacionamientos, que
- deberán ser donados a la Municipalidad.

1.2.2.4. Infraestructura del conjunto y de conexión

Los conjuntos habitacionales deberán incluir obligatoriamente las redes de infraestructura interna básica y las respectivas conexiones a las redes externas existentes o contemplar sistema de saneamiento básico autónomo, si no existieran las anteriores en la localidad, para su normal funcionamiento, las que se ajustarán en ambos casos a las normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o fiscalizadores de los servicios, de jurisdicción nacional, provincial y/o municipal.

En cuanto a las obras de infraestructura de conexión o enlace a las redes troncales, deberán acotarse las mismas a lo estrictamente necesario, procurando utilizar terrenos que no demanden una inversión costosa para su habilitación y que por lo tanto ya cuenten con infraestructura disponible para su uso.

A los efectos de la disponibilidad de servicios, todas las ofertas deberán acompañar certificación de la autoridad competente que demuestra la capacidad o dotación suficiente para la provisión de abastecimiento de la población a instalar en el conjunto, salvo en el caso de terrenos del Organismo Ejecutor, quien lo adjuntara al Pliego de Condiciones Particulares. En caso de no existir tal capacidad, se deberá requerir de los organismos correspondientes, la fijación de los requisitos técnicos para cumplir con la dotación suficiente del conjunto.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

En caso de requerirse obras complementarias de viviendas e infraestructura y obras de nexo para el desarrollo del conjunto, se comprenderá a las mismas como parte integrante del paquete global de infraestructura a financiar.

-

1.2.2.4.1. Condiciones generales

- En términos generales, el diseño de las redes tenderá a considerarse como parte integradora de todo el proyecto y como tal es necesario plantearlo como el sistema ordenador del espacio y generador de la trama urbana que estructura el conjunto.
- El sistema de infraestructura procurará vincularse estrechamente con las densidades habitacionales a adoptar y con la optimización del diseño de las mismas, proyectando urbanizaciones que destinen la menor cantidad de superficie, previendo redes de servicios lo más concentrados posibles.

A los efectos de prever una adecuada programación de los procesos de obra y cumplir con los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, antes de la primera entrega parcial de vivienda, se exigirá la ejecución de la totalidad (100%) de las obras de conexiones de infraestructura a las redes troncales respectivas y de un avanzado estado de las obras de urbanización e infraestructura interna, principalmente de aquellas que impliquen movimientos de suelo e instalación subterránea. Estas últimas deberán estar completadas antes de ejecutarse el 50% acumulado de obra de las viviendas o en su defecto deberán ser programadas su terminación por etapas concordantes, con cada entrega parcial de viviendas estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares con la correspondiente habilitación de todos los servicios respectivos.

- En todos los casos los conjuntos deberán prever empalme directo al sistema vial existente.
- Para el dimensionamiento de las redes se tomarán en cuenta exclusivamente los requerimientos propios que demande el conjunto habitacional. No se financiaran instalaciones de ningún tipo que tengan el propósito de previsiones para futuras ampliaciones o servicios a otros usuarios.
- Las instalaciones de transformación o reservas de fluidos serán solamente para reserva del conjunto habitacional.

1.2.2.4.2. Redes de distribución de agua potable

Se ejecutarán siguiendo las consideraciones establecidas por la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de de Entre Ríos (D.P.O.S.E.R.), disposiciones o reglamentaciones vigentes de los Municipios, Junta de Gobierno ó Cooperativa en donde se sitúe la obra, optando siempre en pos de mejorar la calidad de materiales o sistemas constructivos.

Se usaran tuberías y accesorios de PVC rígido para redes de agua potable, *para soportar como mínimo presiones de trabajo de 6 kg/cm^2 (clase 6)*, en todo de acuerdo a las normas IRAM Nº 13350/51/52/59. *que establecen sus dimensiones, ensayos en general y de toxicidad respectivamente.*

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, tuberías y piezas especiales de hierro fundido, acero, material vítreo, hormigón simple, armado o pretensado, asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno de alta densidad (PEAD), su fabricación y recepción se ajustará a las

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM, deberán poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o el certificado de aprobación por lote de IRAM.

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o aprobación por lote por parte de IRAM, para agua potable ***Norma IRAM 113.048 o 113.035,*** *debiendo tener en relieve la inscripción "agua".*
Las uniones se harán *del tipo junta elástica con aro de goma que podrá ser integrado (tipo Rieber) o no. No se aceptarán uniones soldadas o pegadas*.

Todas las piezas de conexión y piezas especiales serán de clase 10, es decir para una presión de trabajo de 10 kg/cm^2 y cumplirán la norma IRAM 13324 "Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y características"
En lo referente al manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje, excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y métodos de ensayo de resistencia a la presión hidráulica se aplicará lo establecido por la Norma IRAM 13485.
Todas las cañerías y piezas especiales a instalar en zanjas deberán estar asentadas sobre una cama de arena fina de río limpia y compactada, totalmente libre de piedras u otros elementos que puedan dañar a los materiales instalados sobre la misma, de 0,10mts de espesor. Una vez colocado el caño y/o pieza especial sobre la base, se continuará el relleno de la zanja, en los laterales de los mismos, con la misma arena perfectamente compactada hasta 0,10m por sobre el nivel de extradós. El precio de los mismos deberá ser incluido en el precio unitario de la cañería
La tapada mínima de las cañerías será la indicada en los planos. En todos aquellos sectores de tránsito vehicular, con tapadas de cañería inferiores a 1.20 m, el Contratista y de acuerdo a lo convenido con la inspección, deberá protegerla con una losa de hormigón H 20 de 0,12 m de espesor con malla sima Q 92 hasta 0,20 mts a cada lado de la zanja, esté o no la misma indicada en los planos. Antes de su ejecución el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, los cálculos estructurales y planos de detalle de la misma. El costo de dicha losa se considerará incluido en el ítem correspondiente a la provisión y colocación de la cañería. No admitiéndose reclamo por pago adicional por la provisión de los materiales y la construcción de la misma.-

Todas las cañerías de P.V.C. Clase 6 se instalarán con una tapada mínima de 1,20 metros, respetando siempre las especificaciones del presente pliego.-
Toda especificación que no esté indicada en el presente pliego y que sea necesario ejecutar en obra, deberá seguir los lineamientos de D.P.O.S.E.R., el respectivo Municipio o Junta de Gobierno, y cumpliendo, en todos los casos, con el que posea mayor nivel de exigencia.-
Válvulas y accesorios.-
Su fabricación y recepción en obra se ajustará a las Normas IRAM correspondientes a cada una de ellas.

Anclajes				

Como consecuencia de la presión del fluído en las tuberías, se deberán ejecutar anclajes en los cambios de dirección a fin de evitar el desenchufado de las uniones para lo cual se ejecutarán dados de hormigón, previéndose entre el hormigón y el accesorio de plástico, una protección de fieltro o película de polietileno.
Los anclajes de hormigón de ubicarán en los codos y curvas de 30º a 90º, tes de 90º y

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

tapas terminales siendo sus dimensiones mínimas serán 0,40 x 0,60 x 0,30.
Para los ramales ejecutados con cruces (te doble) o con dos piezas te, y las reducciones no se ejecutarán anclajes de hormigón debiéndose compactar más cuidadosamente el material de relleno.

Pruebas y verificación de las instalaciones.
Una vez instalada la cañería en su posición definitiva y, construidas las conexiones domiciliarias, colocadas las válvulas y piezas especiales, se deberá solicitar a la inspección, y en conjunto con la inspección de Obras Sanitarias del Municipio, Junta de Gobierno ó Cooperativa, se proceda a realizar la prueba hidráulica. La misma se deberá realizar a zanja abierta y luego tapada llenándola con agua eliminando todo el aire comprimido, se deberán tapar los dos extremos de la cañería, y la presión de prueba será 1,5 veces la presión nominal del caño. Una vez alcanzada la presión de prueba, mediante la utilización de equipos de bombeo apropiados, se cerrará la válvula por donde se le inyecta el agua y se suspenderá el bombeo, debiéndose mantener la presión constante en la cañería bajo estas condiciones durante media hora con el objeto de comprobar la estanqueidad de las juntas y descubrir las fallas de los caños, y una vez que arroje resultado satisfactorio se procederá a comenzar el tapado de la zanja manteniendo la presión. Se proseguirá la prueba manteniendo la cañería cargada durante un total de 12 Hrs. y se procederá a medir las pérdidas por absorción, promedio por hora, durante una hora. Para materiales de PVC, PEAD y PRFV, no se admitirán pérdidas de agua por absorción.
Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se mantendrá la cañería llena con la presión de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 50% de la misma, con un mínimo de 0,80m sobre el extradós de la cañería, se detendrán los trabajos por media hora y se verificará durante este período que la cañería se mantenga en las condiciones hidráulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificación resulta satisfactoria se dará por aprobada la prueba hidráulica del tramo
Para verificar el correcto funcionamiento de los manómetros la Inspección podrá ordenar que los mismos sean calibrados en un taller especializado por cuenta y cargo del Contratista.
La longitud máxima de los tramos a probar será de 300m.
Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanará las deficiencias y se repetirán las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los límites establecidos

1.2.2.4.3. Red de colectores

Se ejecutarán siguiendo las consideraciones establecidas por la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de de Entre Ríos (D.P.O.S.E.R.), disposiciones o reglamentaciones vigentes de los Municipios, Junta de Gobierno ó Cooperativa en donde se sitúe la obra, optando siempre en pos de mejorar la calidad de materiales o sistemas constructivos
Se utilizaran caños y piezas especiales de PVC (para Redes externas de cloaca), con juntas de aro de goma sintética, de marcas reconocidas y cumpliendo con las normas Iram N° 13.325/26/31, 13.350 y 113.047 "*Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para ventilación, desagües cloacales y pluviales" y "Aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno, para juntas de cañerías*).

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, tuberías y piezas especiales de hierro fundido, acero, material vítreo, hormigón simple, armado o pretensado, asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno de alta densidad (PEAD), su fabricación y recepción se ajustará a las especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM, deberán poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o el certificado de aprobación por lote de IRAM
En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o aprobación por lote por parte de IRAM, para conducir

líquidos cloacales de acuerdo a la ***Norma IRAM 113.047 0 113.035,*** *debiendo tener en relieve la inscripción "cloaca".*
Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350, serán provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios, como fueran requeridos en las documentación contractual.-
Los caños serán de rigidez nominal SN 8 de pared compacta como mínimo. Todas las juntas de los caños de PVC enterrados serán espiga y enchufe.
Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633.Las conexiones se harán a espiga y enchufe con unión deslizante mediante aro de goma, aptas para la conducción de líquidos cloacales, con SELLO DE CALIDAD IRAM
Para fijar las cañerías a las bocas de registro se utilizarán manguitos de empotramiento de PVC, los que serán amurados a las paredes de hormigón de las mismas, y tendrán un aro de goma de idénticas prestaciones que el de la tubería.
Las piezas especiales de PVC serán tipo R.C.P. Las curvas serán M-H, mientras que los ramales serán H-H-H con junta mediante unión deslizante (UD) en sus tres extremos. Deberán ser fabricados de acuerdo a la Norma IRAM N° 13.331 1ra. y 2da. parte y los aros de goma poseer SELLO DE CALIDAD IRAM conforme a la norma Nº 113.047 o 113.035. Las curvas serán del tipo largas no admitiéndose las cortas (codos)
Toda especificación que no esté indicada en el presente pliego y que sea necesario ejecutar en obra, deberá seguir los lineamientos de D.P.O.S.E.R., el respectivo Municipio o Junta de Gobierno, y cumpliendo, en todos los casos, con el que posea mayor nivel de exigencia.-

Válvulas y accesorios.-
Su fabricación y recepción en obra se ajustará a las Normas IRAM correspondientes a cada una de ellas.
Pruebas y verificación de las instalaciones.
Una vez instalada la cañería en su posición definitiva y, construidas las conexiones domiciliarias, colocadas las válvulas y piezas especiales, se deberá solicitar a la inspección, y en conjunto con la inspección de Obras Sanitarias del Municipio, Junta de Gobierno ó Cooperativa, se proceda a realizar la prueba hidráulica La misma se realizará a zanja abierta llenándola con agua, manteniéndose a la presión de 2m.c.a. durante media hora con el objeto de comprobar la estanqueidad de las juntas y descubrir las fallas de los caños.
Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas se procederá a su reparación, previa descarga de la cañería. Una vez terminada las reparaciones se repetirán las pruebas las veces que sean necesarias hasta obtener un resultado satisfactorio.-
Una vez comprobada la ausencia de fallas, se proseguirá la prueba manteniendo la cañería cargada durante un total de 12 Hrs. y se procederá a medir las pérdidas por absorción,

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

promedio por hora, durante una hora.
Para PVC, PEAD y PRFV, no se admitirán pérdidas de agua por absorción.
Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se mantendrá la cañería llena con la presión de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 50% de la misma, con un mínimo de 0,80m sobre el extradós de la cañería, se detendrán los trabajos por media hora y se verificará durante este período que la cañería se mantenga en las condiciones hidráulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificación resulta satisfactoria se dará por aprobada la prueba hidráulica del tramo.

Bocas de Registro

Las bocas de registro se construirían en hormigón simple con marcos y tapas de hierro fundido (según plano Tipo de OSN N° 29920-E), debiendo colocarse en los inicios de cada tramo la tapa reja para facilitar la ventilación y el resto irán las tapas llenas.

Para la construcción de las bocas de registro se utilizará hormigón H 25.
EL FONDO Y CUERPO DE LAS BOCAS DE REGISTRO SERÁN CONSTRUIDOS CON HORMIGÓN COLADO EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVA DE LAS MISMAS.
A las bocas de registro cuyo cuerpo supere los 6,00m de profundidad, se le colocará en el fuste una armadura de refuerzo en cuadrícula, según la directriz y generatriz de 8mm de diámetro y una separación de 0,20m.-
Para las bocas cuya excavación supere los 2,50m de profundidad obligatoriamente se debe utilizar molde exterior para la construcción del cuerpo, no permitiéndose para estos casos que se utilice el terreno como encofrado exterior. Para las bocas cuya excavación tenga una profundidad menor a 2,50m se deberá también utilizar encofrado exterior, excepto que la Inspección, por escrito, en virtud de las características del terreno, y si el plan de Higiene y Seguridad de la obra no indica lo contrario, autorice utilizar el terreno como encofrado.
En lo posible el fuste de la boca de registro será construido en una sola colada de hormigón y si resultara necesario ejecutarlo en dos ó más tramos, a los efectos de lograr una correcta continuidad entre estos tramos, se utilizarán ocho (8) hierros de construcción Ø 10mm que se distribuirán uniformemente en el diámetro del eje del cuerpo, de una longitud de 1,00m cada uno, debiendo quedar amurado en el hormigón de cada etapa 0,50m. Estos hierros no serán necesarios en los cuerpos de las bocas de más de 6,00m de profundidad.
Se construirán en los lugares que indiquen los planos de proyecto y de acuerdo a instrucciones que al respecto pudiera impartir la Inspección. LAS MODIFICACIONES CON RESPECTO A LOS PLANOS DE PROYECTO, NO DARÁN LUGAR A RECLAMOS DEL CONTRATISTA.
Las superficies del cuerpo, tanto interior como exterior, deberán quedar lisas, sin huecos ni protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaren deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta y cargo y a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un revoque de mortero 1:2 (cemento – arena) en el 100% de la superficie del cuerpo, que se considerará incluido en los Precios Unitarios. Cuando el sector con deficiencias supere el 30% de un tramo del cuerpo, el mismo deberá ser demolido y reconstruido, sin permitirse en este caso la reparación.
La losa de fondo incluirá la construcción del cojinete con hormigón H 25.
Si la losa superior de HºAº es construida premoldeada, al colocarse sobre el cuerpo debe quedar asentada en todo su perímetro sobre un mortero 1:3 (cemento – arena) y luego se revocará, interior y exteriormente, la unión losa de techo – cuerpo con el mismo mortero, de tal manera de garantizar que la unión en cuestión sea totalmente estanca y no se

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

producirá a través de la misma el ingreso de agua y/o barro.
La longitud del cuerpo de las bocas de registro será la que resulte de la diferencia entre el nivel inferior de la losa de techo de HºAº y el nivel superior de la losa de fondo (punto más bajo del cojinete).
Las cañerías de PVC serán amuradas en el hormigón del cuerpo mediante la utilización de manguitos de empotramiento de PVC con aros de goma.
Las bocas de registro en su totalidad estarán provistas de Marco y Tapa de Fundición aptas para calzadas o veredas, según corresponda de acuerdo a la ubicación de las mismas en el terreno.
La medición y certificación de las bocas de registro se realizará cuando las mismas estén terminadas en el 100% y aprobadas por la Inspección, incluyendo su precio unitario la totalidad de los materiales y mano de obra para que las mismas queden de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y aptas para el fin que son construidas.-
A efectos de proyectar el tendido de la red y su vínculo con el sistema existente deberá considerarse el trazado que se adjunta como Anexo.-

1.2.2.4.4. Red de energía eléctrica y alumbrado público.

La red de energía de Baja Tensión será Aérea, de conductores preensamblados fijados con morsetería aislada de manera de conservar doble aislación.
Los vanos no deberán superar los 30 metros.
Los soportes serán de 8 metros como mínimo, admitiéndose los postes de madera simplemente enterrados solo para suspensiones. Los terminales, retenciones y angulares serán de hormigón pretensado con fundación de hormigón simple. Se prohíben expresamente los soportes reforzados con puntales, contrapostes o riendas.
La iluminación tendrá en el centro de calzada 15 lux de promedio y se utilizaran
Artefactos para Alumbrado Público Marca Siemens Modelo 5NA 576 (Línea Económica) o similar, con lámpara de Vapor de Sodio de alta presión de 100 W., equipo auxiliar completo, montado en columna tubular de acero de 7.80 metros de altura total, puesta a tierra mediante jabalina de Cu con núcleo de acero de 9.00mm de diámetro y 1.50 mts. de largo.
El sistema de alimentación se hará: o directa e individualmente desde red y el sistema de encendido será por fotocélula individual para cada artefacto, o por línea de alumbrado con tablero general de comando y protección.

1.2.2.4.5. Red vehicular y peatonal

Tras la apertura y nivelación de las **calles**, en los anchos de calzadas proyectadas, estas serán abovedadas para escurrir el agua de lluvia hacia el cordón cuneta, o alternativamente a cuneta a cielo abierto cuya ejecución y continuidad quedara supeditada a las condiciones del entorno urbanizado, debiendo garantizar un adecuado empalme con lo existente (continuidad de las trazas y niveles) y el correcto escurrimiento de los desagües pluviales. Se compactará el terreno natural y se hara una subbase de brosa de 10 cm de espesor adecuadamente trabajada y compactada de la calle (suelo núcleo hasta una profundidad mínima de 20 cm) y sobre el mismo se distribuirá y compactará una capa de rodamiento de ripio arcilloso, suelo calcáreo, tosca, conchilla o el material similar que más abunde en la zona, de diez (10) cm de espesor final, una vez compactado y perfilado.
Para completar con los trabajos de la **Trama Vial mínima** y garantizar la transitabilidad permanente, se deberá prever la ejecución de Badenes de HºAº (ancho mínimo 1,20 m) en las bocacalles, y evitar el corte de tránsito en días de lluvia.
Dichos trabajos deberan contar con aprobacion del Municipio o Junta de Gobierno que se haran cargo del mantenimiento, como asi tambien con la certificacion de la Inspeccion.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Los senderos y/o veredas se realizarán en un ancho de 1,00 m. sobre un contrapiso de 0,10 m de espesor u hormigonados "in situ" con junta cada uno 1,20 m en hormigón de cemento y piedra y de 0,10 m. de espesor.
Para el diseño y niveles de las **veredas reglamentarias municipales** se tendrán en cuenta los niveles de calles, la diferencia de nivel entre vereda y eje de calzada no deberá ser superior a los 30 cm, por lo que acompañarán las pendientes de éstas sin que se produzcan quiebres o saltos distintos a los de la calzada y a su vez no quedar por encima de los niveles de los lotes o terrazas de las viviendas.

1.2.2.5. Áreas de equipamiento comunitario

Los Pliegos de Condiciones Particulares indicarán los tipos de equipamiento comunitario, sus niveles, superficie, programas y demás condiciones, cuando el terreno sea del Organismo Ejecutor en los demás casos se considerará lo siguiente:
En caso de ser necesario por insuficiencia del equipamiento disponible para atender las demandas de la población a instalar, los proyectos deberán prever áreas para la cobertura del equipamiento comunitario, dentro de los conjuntos habitacionales las que estarán contenidas dentro de lo especificado en el punto 1.2.2.3., como índice de superficie libre. En función de estos requisitos es conveniente evaluar previamente, las condiciones de equipamiento existentes en el entorno inmediato al conjunto, tratando de seleccionar terrenos que posean un mejor servicio disponible en equipamiento urbano y que no requieran por lo tanto de su construcción.
Será conveniente organizar estas áreas en la retícula espacial de la trama urbana propuesta y procurar una zonificación relevante y a la vez equidistante respecto al conjunto.
Los niveles de equipamiento responderán a los requerimientos establecidos por los organismos responsables a nivel provincial, de no existir estos serán definidos por el Organismo Ejecutor y la Municipalidad correspondiente, los que fijarán asimismo, el programa y la superficie a construir para los equipamientos respectivos. En todos los casos, los proyectos deberán ser acompañados de la certificación correspondiente de los organismos competentes de la jurisdicción.
Asimismo será conveniente prever dentro del tratamiento del conjunto, la construcción de obras menores como zonas verdes, áreas recreativas y lugares de reunión, que ofrezcan espacios comunes adecuadamente tratados y con un apropiado sentido del uso comunitario. Dichas obras complementarias se considerarán comprendidas dentro de los precios máximos de la licitación.

1.3. Normas de diseño de la vivienda

1.3.1. Recomendaciones generales

La unidad habitacional responderá a los requerimientos funcional-espacial, definidos para cada condición tipológica y su diseño comprenderá la conformación de la célula o módulo inicial a construir, más el estudio de su futuro crecimiento, cuando se trate de alternativa individual o colectiva, con uso exclusivo de una porción de terreno. La solución arquitectónica de la vivienda, deberá considerar su evolución en el tiempo, previendo la progresividad constructiva de la célula, de tal forma que su resolución constituya una vivienda terminada, con los espacios y actividades que se contemplen cuando se prevea ampliación, como con el mejoramiento y/o terminación que se produzca posteriormente en la misma.
La vivienda prevista de desarrollo en etapas, se define en su primera fase como evolutiva y adaptable a las diferentes condiciones poblacionales, e incluirá fundamentalmente los rubros de construcción como: estructura, muros de cerramiento, techo, piso, aberturas, núcleo húmedo,

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

instalaciones y un nivel mínimo de terminaciones. Estas últimas se plantean como económicamente graduales y previsibles de ser ejecutadas según las alternativas tipológicas que se generen por categorías y costos, posibles algunas de ellas de ser incluidas en la primera etapa y otras para ser realizadas en la segunda etapa a cargo del usuario, lo mismo que la prevista ampliación, cuando corresponda.
Para ello, la vivienda considerará ofrecer un desarrollo habitacional progresivo, contemplando la amplitud morfológica, con la riqueza y variedad que el tema merece como cobijo de la familia. Asimismo procurará responder a las condiciones ambientales, sociales, culturales y técnico-constructiva regionales y/o locales, adecuando convenientemente las alternativas tipológicas, determinadas en 1.3.2., a esas características.
A los efectos de alentar la participación del usuario en el completamiento de la vivienda y facilitar su ejecución, será recomendable que el proyecto haga comprensible las leyes constructivas y contemple con procedimientos sencillos y prácticos la manera de ampliar, transformar y/o terminar la vivienda.
En líneas generales las variables de diseño se encuentran acotadas por las necesidades que surgen de las funciones a albergar y de determinado estándar habitacional progresivo, (en condiciones aptas de habitabilidad, seguridad y durabilidad), comprendiendo el potencial de uso de los espacios habitables con criterios de flexibilidad y crecimiento.
En este sentido los espacios se definirán a partir de:

a) Las funciones o actividad que deben albergar.
b) El equipamiento necesario para desarrollar tales funciones y su ubicación en el espacio.
c) Los tamaños usuales de los objetos (o equipamiento) y las relaciones antropométricas que surjan de su uso.
d) Su posición con relación a los otros objetos y componentes de la vivienda.
e) La distribución de las áreas de uso de acuerdo a las relaciones funcionales que integran el módulo inicial y de igual forma respecto a la vivienda terminada.

1.3.2. Acondicionamiento espacial y tipos de vivienda

Los requisitos mínimos que se indican en los cuadros siguientes, serán de cumplimiento obligatorio. Las viviendas solo podrán ser en régimen de propiedad individual o colectivo (Régimen de subdivisión en Propiedad Horizontal), con alturas variables que abarquen, desde una sola planta (P.B.) hasta cuatro plantas (P.B. y tres pisos altos).

1.3.3. Disposiciones complementarias

1.3.3.1. Para todas las viviendas de régimen individual y colectivas con terrenos de uso exclusivo, deberá considerarse obligatoria la ampliación de la misma, como mínimo a un dormitorio más, bajo el concepto de vivienda evolutiva, que provea en su diseño y construcción la respectiva variable con procedimientos sencillos. En cuanto a las viviendas de régimen colectivos mencionadas, ésta condición deberá considerarse de modo que no genere inconvenientes de ningún tipo en el régimen de propiedad horizontal.
1.3.3.2. Los diversos espacios que integran el módulo inicial deberán estar organizados entre sí y agrupados de tal manera que el crecimiento de las etapas posteriores no impliquen demoliciones de muros, transformaciones de techos, modificaciones estructurales y no requiera el uso de maquinaria o equipo especializado.
1.3.3.3. Solamente se exigirá como obligatorio el cerramiento total de un dormitorio en las viviendas 2 dormitorios, de dos en las viviendas 3 dormitorios, y del baño en todos los casos, como espacios conformados, aceptándose integrar espacialmente el resto de los ambientes, dejando uno de los lados sin cerrar. Sin embargo para todos los espacios aún los

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

no conformados, deberán considerarse con los requerimientos especiales establecidos en los cuadros de acondicionamiento espacial respectivo y asegurando al subdividirse la ventilación e iluminación de los respectivos espacios. Deberá preverse en el diseño la colocación futura del tabique interior, preferentemente de tipo liviano y de montaje en seco.

1.3.3.4. La altura mínima libre para los locales será de *2,60mts* medida en forma perpendicular al piso, para el caso de techos inclinados.

1.3.3.5. Las viviendas deben considerar un espacio para guardado en relación uno por cada dormitorio, el que deberá preverse dentro de ellos o en pasillo adyacentes, sin que perturbe otras funciones.

1.3.3.6. Las áreas de circulación se procurarán que sean mínimas y que no interfieran con las áreas de uso, para obtener un óptimo aprovechamiento del espacio.

1.3.3.7. En caso de requerirse escaleras interiores, se descontará la superficie correspondiente al hueco o vacío por una sola vez.

Estas deberán tener una huella mínima de 0,25 m., medida en planta y en el eje y una contra huella máxima de 0,20 m., debiendo prever pasamanos en sus lados libres, en toda su longitud.

1.3.3.8. El diseño de la vivienda deberá proponer el acceso convenientemente localizado de acuerdo a su organización interna y teniendo en cuenta el crecimiento de su módulo inicial. En el módulo inicial de viviendas individuales y colectivas con uso exclusivo de terreno como mínimo se preverá una salida obligatoria al exterior que no sea la puerta principal.

1.3.3.9. En viviendas colectivas en que no se prevea el uso exclusivo de una porción del terreno común deberá incluirse el espacio lavadero-tendedero para cada vivienda, incrementándose 2 m2. la superficie útil total; asimismo las superficies comunes no superarán el 12% de la superficie cubierta total.

1.3.3.10. En viviendas, individuales y colectivas con uso exclusivo de terreno el espacio lavadero podrá estar ubicado en el exterior y sin techar.

1.3.3.11. Todos los locales deberán cumplir con los coeficientes de iluminación y ventilación que establezca cada jurisdicción de acuerdo a las características climáticas regionales y/o locales.

1.3.3.12. En caso de ubicar la cocina integrada al estar comedor, ésta deberá poseer una ventana independiente que prevea los requerimientos de iluminación y ventilación exigidos por reglamentación.

1.4. Normas de construcción

1.4.1. Recomendaciones generales

A los efectos de observar estrictamente las condiciones mínimas que la técnica aconseje en cuanto a seguridad, habitabilidad y durabilidad de las viviendas, se indican seguidamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que servirán a su objetivo.

En este sentido es recomendable contemplar como parte de las propuestas constructivas, la complementariedad y amplitud de los sistemas constructivos, con soluciones tecnológicas que posibiliten al usuario desarrollar un crecimiento planificado e integrado de la vivienda, con procedimientos accesibles y de fácil ejecución, sin alterar mayormente lo ya construido.

En términos generales, los proyectos tratarán de poner especial énfasis en la adecuación de materiales, técnicas, procedimientos y desarrollo de sistemas constructivos, que incidan en la reducción de tiempos y costos y en el aumento de la calidad y eficiencia productiva. Para ello, procurarán proponer que la solución constructiva contemple:

a) Correspondencia con los requisitos funcionales (organización interna de los espacios) y futuro

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

crecimiento, tomando en cuenta las dimensiones (en planta y elevación) y su resolución estructural.
b) Correspondencia con los requerimientos ambientales y expresivos de la vivienda.
c) Asegurar el crecimiento y terminación del módulo inicial, mediante técnicas de construcción o montaje que en lo posible no requieran mano de obra calificada o equipo sofisticado.
d) Utilización de materiales y componentes que en lo posible respondan a un criterio de modulación y estandarización, permitiendo integrarse en coordinación constructiva y de fácil ensamblaje.
e) Uso de materiales y componentes, siempre y cuando exista factibilidad de origen regional.

f) Flexibilidad y amplitud para permitir el uso de materiales y componentes disponibles en el mercado regional para el crecimiento, mejoramiento y/o mantenimiento de los elementos constructivos de la vivienda.
g) Correspondencia con el sistema de instalaciones de manera de lograr la máxima concentración, el fácil mantenimiento y reparación y el menor consumo energético.
h) Proporcionar condiciones adecuadas de calidad ambiental al interior de la vivienda, de acuerdo a variables regionales y/o locales.
i) Aplicación de metodologías de programación y procedimientos constructivos que acompañan procesos productivos, que permitan reducir tiempos de construcción.

1.4.2. Normativa técnica

Desde el punto de vista normativo, será de aplicación la *reglamentación legal vigente para la República Argentina, establecido en los Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 2005, aprobadas por Resolución Nº 247/2012 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, también adoptadas por la Provincia de Entre Ríos a través de la Resolución Nº 734/14 M.P.I.yS. para el proyecto y construcción de toda obra pública de carácter provincial cualquiera sea su forma de contratación y de ejecución* además reglamentos provinciales, municipales, y de los Organismos Jurisdiccionales, cuando correspondan, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, y las presentes normas técnicas que tendrán prelación sobre todas las anteriores.
En cuanto a los sistemas constructivos no tradicionales que se utilicen, deberán contar con el Certificado de Aptitud Técnica emitido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, vigente a la fecha de apertura de la propuesta.
En estos casos, los niveles de ejecución de obras, serán los estipulados en el Certificado de Aptitud Técnica correspondiente.

1.4.3. Especificaciones por rubro de obra

1.4.3.1. Preparación del terreno

El terreno se nivelará en forma tal que la construcción quede sobreelevada 0,15 m. del nivel vereda dado por el municipio o la cota inundable. De no existir éstas, la cota de piso terminado deberá encontrarse a 0,25 m. como mínimo sobre la del terreno natural o de la que se tenga alguna referencia objetiva por alguna inundación anterior, a menos que el terreno este comprendido dentro de las áreas protegidas, por los planes de defensa.

1.4.3.2. Fundaciones

El tipo de fundación a adoptar, en especial, tratándose de unidades de viviendas desarrolladas en más de una planta, dependerá de las características del terreno y será consecuencia del diseño y cálculo estructural respectivo.

1.4.3.3. Aislación hidrófuga horizontal

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

En todos los casos, la primera capa aisladora *en mamposterías* deberá quedar debajo del contrapiso y la segunda a nivel de piso terminado. Para los tipos de fundación descriptos en 1.4.3.2. para viviendas en planta baja, tendrá las siguientes características:
Para zapatas corridas y pilotines de hormigón. Se ejecutarán dos (2) capas aisladoras horizontales unidas verticalmente, de concreto 1:3 (cemento arena), con un kg. de hidrófugo cada 10 lts. de agua.

1.4.3.4. Estructura independiente

Para el cálculo, diseño y ejecución de la estructura independiente, (cuando ésta sea prevista) deberá tenerse en especial consideración los siguientes reglamentos:
Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 2005
a) En relación con las cargas:

CIRSOC 101-2005 Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras
CIRSOC 102-2005 Acción del Viento sobre las Construcciones
CIRSOC 104-2005 Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones CIRSOC 108-2007 Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción
b) En relación con el diseño, el cálculo y la ejecución.
b.1.) Hormigón.
CIRSOC 201-2005 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón
b.2.) Acero.
CIRSOC 301-2005 Estructuras de Acero para Edificios
CIRSOC 302-2005 Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios
CIRSOC 303-2009 Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío y sus Comentarios
CIRSOC 304-2007 Soldadura de Estructuras de Acero
CIRSOC 305-2007 Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia
CIRSOC 308-2007 Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular

b.3.) Madera
Reglamento CIRSOC 601 Reglamento Argentino de Estructuras de Madera (pdf) y suplementos de actualización
Reglamento de construcciones en madera de la S.V.O.A. y normas IRAM sobre maderas y tratamientos.
b.4.) Mampostería

CIRSOC 501-2007 Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería
CIRSOC 501-E-2007 Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural

3.4.3.4.1. Estructura de Hormigón Armado: Las estructuras deberán ser ejecutadas siguiendo los lineamientos generales descriptos en los planos respectivos respetando su dimensionamiento como secciones mínimas.
El contratista proveerá hormigón fresco que cumpla con las siguientes condiciones: Resistencia especificada mínima a la compresión (a los 28 días): f´c = 20 MPa.
Cabe destacar que todo ensayo realizado antes de los 28 días, es admisible solamente como preliminar, debiéndose ensayar probetas del mismo pastón a los 28 días.

La empresa deberá suministrar hormigón fresco en forma continua según las necesidades de la colada que se esté llevando a cabo. Éste hormigón deberá ser colocado en los moldes según normas vigentes.
El hormigón suministrado por la empresa debe cumplir, en cada etapa de su preparación y hasta la puesta en moldes, con las ***normativas vigentes en el Reglamento CIRSOC 201 / 2005 y normas IRAM correspondientes****. Esto es: elección y composición granulométrica de los agregados, tipo de cemento portland a utilizar, dosificaciones, amasado, transporte y bombeo. La mezcla de hormigón debe ser diseñada y producida para permitir un flujo y llenado fácil de los moldes.*
En cada etapa de hormigonado la Inspección podrá detallar y exigir las distintas características que hacen a la trabajabilidad del hormigón fresco, como ser: tamaño máximo de los agregados gruesos y asentamiento.

Si el hormigón fuera elaborado con hormigonera mecánica dosificando sus componentes, se dará a la mezcla la plasticidad conveniente según el tipo de estructura y cantidad de armaduras, para que envuelva completamente las armaduras metálicas, sin exceso de agua.
La elaboración del hormigón se hará con personal competente y el tiempo de mezclado no será en ningún caso inferior a los 3 minutos. Se vertirá en forma inmediata a la terminación del amasado y en ningún caso se dejará transcurrir más de 30 minutos en caso de utilizarse medios corrientes de transporte o 90 minutos cuando se utilicen camiones mezcladores.
En los casos de emplear hormigones elaborados fuera de la obra se deberán seguir prescripciones equivalentes a las anteriores y las indicaciones que al efecto imparta la Inspección.
En el momento de su colocación, la temperatura del hormigón no deberá superar los 30 ºC.
Para el caso de bajas temperaturas del ambiente, esa temperatura no podrá ser inferior a los 5 ºC.
El hormigón que acuse un principio de fraguado no podrá ser volcado en el encofrado y será rechazado para su utilización. En ningún caso será permitido el agregado de agua para ablandarlo o mejorar su plasticidad.
La consistencia del hormigón podrá ser controlada a través de la inspección mediante un Cono de Abrams a suministrar por el Contratista. El valor de asentamiento estará entre 5 y 10 cm según sea la estructura a hormigonar.
Con temperaturas de 0ºC o inferiores no será permitido el hormigonado.
Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5ºC y no llegue a 0ºC, se tomarán precauciones adecuadas a fin de asegurar que durante las primeras 24 horas posteriores al hormigonado se evite la posibilidad de congelamiento.
En casos en que la temperatura media diaria supere los 25 a 28ºC, se deberán tomar los recaudos correspondientes para evitar que el hormigón sea vertido a una temperatura superior a los 30ºC.
Para el caso de hormigonado a ser efectuado en época estival, se tomarán recaudos para evitar el resecamiento superficial por evaporación, mediante el uso de aspersores de riego o métodos equivalentes.

3.4.3.4.2 Estructuras Metálicas: Todas las estructuras metálicas responderán a los detalles y especificaciones contenidas en las cláusulas técnicas particulares y lo que indiquen los planos respectivos. Todo aquello que no se encuentre expresado en dicha documentación, deberá seguir los lineamientos indicados por los reglamentos respectivos y por las "reglas del buen arte". Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a lo estipulado en los reglamentos

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

enunciados anteriormente CIRSOC, que se encuentran en plena vigencia en la Provincia a través de la Resolución Nº 734/14 MPIyS.
Los trabajos aquí especificados incluirán, en general, todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de las estructuras metálicas de las obras, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje y vinculación y las soldaduras.
Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los planos, y en las instrucciones recibidas de la inspección. Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los elementos resistentes.
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección; y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.

Los materiales se almacenarán en la obra en lugares secos y protegidos. Se deberán proteger del óxido y otros daños. Los materiales dañados serán retirados y repuestos por otros al exclusivo cargo del Contratista y deberán cumplir con la calidad mínima establecida por normas CIRSOC e IRAM correspondientes.
Serán de marcas reconocidas, que tengan certificaciones nacionales de organismos distinguidos de acuerdo a Normas.
El acero para las estructuras metálicas, especialmente las livianas, ha de estar suficientemente protegido de la corrosión durante el almacenaje y la elaboración
Ha de ponerse especial cuidado en la protección de aquellos elementos que no sean accesibles durante la vida útil estructural.
Todo elemento terminado, inspeccionado y que fuera aceptado en obra, no exime al Contratista de su obligación de reemplazar o corregir cualquier material o trabajo defectuoso de dimensiones erróneas o mal hecho, aún cuando se advirtiera después de la inspección. En todos los casos la Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de los trabajos que fueran rechazados por no cumplir los requisitos anteriores.
Se debe evitar el contacto de elementos metálicos con materiales de yeso o que tengan cloruro de magnesio.
Como protección, sobre todas las estructuras metálicas se efectuará un cepillado prolijo, si correspondiera a criterio de la Inspección. Se efectuará un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester, mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas.
Si se utiliza el tipo Esmalte Sintético Convertidor Antióxido 3 en 1 *se darán como mínimo dos manos con color a definir por la inspección, siempre que sea a su satisfacción. En caso de emplear Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc también se darán como mínimo dos manos.*
La terminación de las estructuras que quedaran a la vista se hará mediante dos manos de Esmalte Sintético Brillante como mínimo, de color a definir por la Inspección. En todos los casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervalo mínimo de 8 (ocho) horas.

1.4.3.5. Cerramientos verticales y horizontales.
Cuando los muros sean de mampostería deberán observarse los reglamentos *mencionados anteriormente para este rubro y también los correspondientes a* "Mampostería Portante Cerámica" o de "Bloques de hormigón" de la S.V.O.A., según corresponda.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Los materiales a emplear serán de primera calidad y que se adecúen a las Normas IRAM correspondientes a cada uno.
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.
Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, éste se preparará previamente, practicándosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazón entre ambos.
Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.
Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su posición vertical.

Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibido el empleo de cascotes.
La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5 del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea revocado. Todos los trabajos de albañilería deberán ejecutarse dando cumplimiento a las normas establecidas por el Código de Edificación de la Ciudad en donde esté sita la Obra y las que surgen de las presentes cláusulas técnicas.
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya especificado expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.
Los tabiques llevarán a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblarán en forma de gancho tomando el ladrillo en sus extremos.
Salvo especificación en contrario en planos o cláusulas particulares, se colocará en el coronamiento de todos los tabiques un encadenamiento de Hº Aº de ancho igual al del tabique y 10 cm de altura por la que correrá una armadura de 2Ø8mm y estribos de 4,2mm cada 15cm.
De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura principal deberán reforzarse con un encadenado de Hº Aº de ancho igual al muro y 0,15m de altura, con 4Ø8mm y estribos 4,2mm cada 15 cm.

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACIÓN
Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros de acuerdo al tipo de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de carga o cimientos deberán usarse mezclas reforzadas. Las paredes de 30 cm. se podrán levantar con morteros de cal cuyo contenido de cemento se regulará en función de su altura y demás condiciones de conformación que presenten.
Los marcos o premarcos de las carpinterías, deberán quedar colocados asegurando perfectamente sus grampas con mortero de cemento y se efectuará el colado si así lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurándose que

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.
La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.
El trabado entre sí de los muros deberá realizarse de manera de impedir la formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los ladrillos.
Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro 2 Ø 6mm, dos hiladas antes, por debajo de los antepechos con mortero de cemento 1:3.

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTOS
En el ancho de cimiento, en su plano de asiento deberá ser de 0,30 m mayor que el muro de elevación y compatible con la resistencia del suelo de fundación. Se asiente la mampostería de cimientos, directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien y a fondo las superficies donde comenzará la mampostería, asimismo se deberá conservar la verticalidad de los paramentos. Si se trata de muros adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de las

aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir, deberá ser rehecha por el Contratista a su cargo.

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos los tabiques de los espesores determinados en los planos. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común.
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.
Siempre se considerará que estas mamposterías han de constituir tabiques interiores o muros de rellenos, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio, cuando no se utilicen ladrillos cerámicos portantes.
EMPALMES
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse con muros o estructuras de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 6 mm. colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigón de la estructura al fraguar.
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior deberá levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor faltante quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en dichos empalmes.
CANALETAS Y ORIFICIOS
El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Desde el punto de vista higrotérmico tanto los cerramientos horizontales como los verticales deberán cumplir con las siguientes normas IRAM:
11601: "*Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario*"
11603: Clasificación bioambiental de la R. Argentina.
11604: *"Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario"*
11605: *"Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios. Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos"*
11625: "*Aislamiento térmico de edifi cios. Verifi cación de sus condiciones higrotérmicas.* Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial, en muros y techos de edificios *en general*
11630: Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Verificación riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general

11658: Aislamiento térmico de edificios. Puentes térmicos. Cálculo de flujos de calor en edificios. Método para el desarrollo de modelos. Procedimiento para la validación de los métodos de cálculo de gran exactitud
Se admitirá un coeficiente de transmitancia térmica hasta un 20% mayor que el máximo permitido para la zona, cuando el muro deba ser completado por el usuario en una etapa posterior. En estos casos deberá verificarse que:
a) Tanto los cerramientos horizontales como los verticales que se incluyan, contengan todas las previsiones constructivas necesarias para su completamiento.
b) La solución prevista previa al completamiento sea en base a elementos de fácil provisión en plaza.
Esta norma será especificada en cada caso en el Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.

1.4.3.6. Revoques

Se consideran en este item, las distintas terminaciones de los paramentos a revocar, los cuales una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni rebabas ni otros defectos cualesquiera. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de depresiones o bombeos y las intersecciones entre paramentos y de estos con los cielorrasos y zócalos serán vivas y rectilíneas.
Antes de proceder a la ejecución de los revoques de los muros, se efectuarán los siguientes trabajos preliminares:

- *Se limpiarán los paramentos de los muros de manera de dejar los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre*
- *En caso de contener afloraciones de salitre abundantes, se procederá a la limpieza del muro con ácido muriático al 10% y posteriormente se enjuagará con abundante agua*
- *Se mojará de manera abundante el muro previo a la aplicación de los revoques*

En ningún caso se tolerará un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para el enlucido, ni tendrá un espesor menor a 15 mm en total.
Las terminaciones en todos los revoques deberán ser perfectas, totalmente homogéneas, sin manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. Las aristas serán vivas y rectilíneas. No deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otras imperfecciones. La terminación se realizará después que se hayan terminado todas las

instalaciones.
Sólo podrán revocarse las paredes que estén perfectamente asentadas, previamente se deberán limpiar las mismas para remover el material sobrante en las juntas, retocando las mismas si fuese necesario, se mojará el muro con agua, y luego se levantarán las fajas o guías.

Los niveles mínimos exigidos para construcción tradicional con mampuestos, son los que se indican más abajo.
a) Exteriores
AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL
En muros exteriores se ejecutará, antes de la aplicación del revoque grueso, un azotado impermeable vertical de concreto 1:3 (cemento-arena) *e hidrófugo inorgánico al 10% REVOQUE GRUESO*
Se ejecutará revoque grueso fratasado

Los revoques se realizarán con cal hidratada en bolsa. Dosificación 1/4:1:3 (cemento:cal:arena). El Contratista proveerá mano de obra especializada y de excelente calidad para la correcta ejecución de este ítem
Los marcos y elementos amurados se colocarán con anterioridad. La superficie revocada resultará plana, uniforme y se alisará con fratáz perfectamente en toda su extensión, sin rebarbas o cualquier otro defecto
REVESTIMIENTO EXTERIOR
Para la aplicación de material de frente ó símil piedra se efectuará sobre una base de revoque grueso perfectamente aplomado, sin oquedades y que hayan sido ejecutados respetando los lineamientos y exigencias del caso.
El Contratista hará todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado en planos, ó cláusulas particulares para aprobación de la Inspección. Deberá ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.
Se emplearán para ello productos de primera calidad, y en todos los casos se deberá seguir las instrucciones del fabricante y de las directivas que al respecto imparta la Inspección de la Obra. Deberá llegar a la obra en sus envases originales cerrados.
Se exigirá mano de obra especializada para esta tarea.
Su terminación podrá ser peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado o pulido, de acuerdo a lo que indiquen las cláusulas técnicas particulares, planos ó directivas que imparta la Inspección de Obra.

b) Interiores
Comprende la ejecución de jaharros y/o enlucidos. Previa preparación del paramento a revocar, se procederá a la preparación de fajas o guías para la ejecución del mismo. Dichas fajas se realizarán bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrá el espesor que en definitiva se dará al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente 18 a 20mm. El mortero a emplearse será 1/4:1:3 (cemento:cal:arena)

En el baño se ejecutará un mortero con hidrófugo (ver 1.1.3.6.a) fratasado hasta 1,60 m. de altura en todo su perímetro, con una faja de 0,30 m. de ancho y hasta 2,10 m. de alto, en

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

coincidencia con la ducha.
En la cocina se aplicará el mismo tipo de mortero en paredes en contacto con la mesada y sobre el artefacto de cocina, con una altura de 0,60 m. sobre el plano de la mesada.

1.4.3.7. Cielorrasos

Los niveles mínimos serán los siguientes, tanto en locales secos como húmedos.
a) Aplicado: hormigón visto sin oquedades o bolseados sobre forjados en general.
b) Suspendido: placas o tableros con bastidor nivelado.
c) Se deberá colocar barrera de vapor y aislación térmica.

1.4.3.8. Contrapisos

Sobre terreno natural normal: de hormigón pobre. Espesor 0,10 m.
Sobre platea de fundación o losa de hormigón: no es necesaria su ejecución.

1.4.3.9. Pisos y zocálos.

En todos los locales se ejecutará sobre el contrapiso carpeta de mortero de cemento nivelado y fratasado con hidrófugo incorporado en los casos de planta baja, los que podrán ejecutar simultáneamente.

Los pisos deberán ser de cerámico esmaltado o mosaico calcáreo o granítico, cuyas medidas mínimas deberán ser de 0,20 x 0,20 m.
En escaleras se utilizara cemento rodillado. En patios, galerías, vereda de acceso y solía perimetral: mortero de cemento fratasado sobre contrapiso de hormigón pobre de 0,10 m. de espesor. Anchos mínimos, veredas de accesos: 0,60 m y perimetral de 0,40 m como mínimo.
Los zócalos deberán ser del mismo material que el piso de una altura mínima de 0.10 m.

1.4.3.10. Revestimientos

Se colocaran revestimientos de cerámico esmaltado o azulejo de primera con junta empastinada: en baño hasta 1,60 m. de altura en todo su perímetro, con una faja de 0,30 m. de ancho y hasta 2,10 m. de alto, en coincidencia con la ducha; en cocina en contacto con la mesada y sobre el artefacto de cocina, con una altura de 0,60 m. sobre el plano de la mesada; y lavadero del ancho de la pileta y hasta una altura de 0,60 m.

1.4.3.11. Carpinterías

Los marcos y hojas serán de tipo standard, pudiendo ser de chapa de hierro doblada con espesor mínimo BWG Nº 20, madera, aluminio o similar, quedando la elección del material y/o tipos de carpintería a criterio del oferente, siempre y cuando cumpla con las normas IRAM respectivas.
En todos los casos deberán incluirse los herrajes necesarios para su funcionamiento, según el siguiente detalle: que se entenderá como mínimo:
- Puertas exteriores: cerradura tipo doble paleta standard, manijas de aluminio extruído, pomelas de hierro.
- Puertas interiores: cerradura con pestillo sin llave, manija doble balancín de aluminio extruido, pomelas de hierro.
- Ventanas: fallebas y pomelas de hierro, brazo de empuje y aldaba de hierro, para carpintería de chapa doblada o madera.
En caso de aluminio los herrajes podrán ser del mismo material.

a) Carpintería exterior

Se colocarán sistemas de seguridad y oscurecimiento del mismo material de los marcos y hojas o cortinas de enrollar, en dormitorios y estar comedor.

b) Carpintería interior

Se preverá la colocación de marcos y puertas en todos los vanos. Estas serán tipo placa de

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

0,033 m. de espesor mínimo, con relleno nido de abeja o similar, tapacantos unificados, aptas para pintar.

1.4.3.12. Pintura

Sólo se aplicará sobre la carpintería. Cuando sean de hierro las hojas y marcos llevarán 2 manos de anticorrosivos y 2 de esmalte sintético. Cuando sean de madera sobre las hojas y marcos se aplicará 1 mano de sellador y 2 de esmalte sintético.

1.4.3.13. Instalación sanitaria

Se deberán respetar las reglamentaciones locales de los entes prestatarios de servicios en cuanto a la calidad de los materiales, la dotación por unidad de vivienda y el dimensionamiento en general, considerándose los siguientes mínimos:

a) Tanque de reserva, en caso de requerirse, capacidad mínima 850 lts., salvo reglamentaciones locales en contrario.

b) Cañerías de distribución y alimentación de agua fría y caliente.

Las cañerías podrán ser de PVC polipropileno, roscado o termofusion, todos aprobados por autoridad competente, quedando en elección del material a criterio del oferente.

c) Cañerías de desagüe primarios, secundarios, ventilación y pluviales: se ejecutarán con materiales y exigencias reglamentarias vigentes.

d) Artefactos

Se proveerá inodoro sifónico a pedestal, depósito automático de embutir (mín. 12 lts.) o mochila. Tapa de plástico. Lavatorio de colgar, mediano. Receptáculo para ducha ejecutado in situ, con desagüe independiente y murete de contención.

Pileta de cocina standard (mínimo de 35 x 55) de acero inoxidable.

Pileta de lavar de 50 x 40 x 28 cm. de cemento, gres cerámico o similar.

e) Broncería

Lavatorio: juego mezclador, sopapa con tapón de plástico.

Ducha: juego mezclador con flor fija, desagüe independiente con rejilla mignón.

Pileta de cocina: juego mezclador con pico movil, sopapa y tapón de plástico.

Pileta de lavar: 2 canillas (una C/rosca p/ manguera) sopapa y tapon plástico.-

En viviendas de una planta o dúplex c/ uso exclusivo de terreno: 1 canilla de servicio c/ rosca p/ manguera en acceso o jardín.

f) Medidor de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la localidad.

g) Accesorios

Baño: 1 jabonera, 1 toallero, 1 percha, 1 portarrollo, 1 portacepillo y 1 jabonera con agarradera para ducha.

Cocina y lavadero: 1 jabonera.

h) En el caso de viviendas afectadas al régimen de propiedad horizontal, éstas podrán compartir la entrada de agua, el tanque de reserva, la conexión cloacal o el pozo absorbente.

1.4.3.14. Instalación de gas

Se deberán respetar las especificaciones de las distribuidoras de Gas locales.

En el interior de la vivienda se instalarán picos para cocina, calefón y calefactor. Ventilaciones para calefón y calefactor (tiro natural ó balanceado) conforme reglamentaciones.

En el exterior gabinete para medidor y conexión a red o bien gabinete para garrafas ó tubos, conforme reglamentaciones de Gas del Estado,

En las localidades donde no exista provisión de gas de ningún tipo, deberá preverse un sistema alternativo de calentamiento de agua. Asimismo, uno de calefacción, si el clima lo hace

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

imprescindible. El Pliego de Condiciones Particulares deberá especificar este requisito.

1.4.3.15. Instalación eléctrica

Se ejecutará según la reglamentación Municipal vigente o bien la de los organismos prestatarios de servicios que corresponden. De no existir éstas se respetarán los siguientes mínimos:
Los caños a utilizar para la instalación interna serán de acero semi-pesado, de espesor de pared superior al milímetro, o caños de material sintético aptos para el uso eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en la norma AEA90364.
Cajas: metálicas o termoplásticas, tipo liviano, esmaltadas en ambas caras.
Cables: de cobre, multifilar con aislación de plástico. Sección mínima en circuitos 2,5 mm2. Sección mínima en comandos 1 mm2.
En el interior de la vivienda se instalarán:
1 boca y un toma por ambiente. 1
toma adicional en cocina.
1 toma adicional en lavadero

Tablero seccional de 2 circuitos-
En el caso de vivienda individual 1 timbre de entrada y campanilla con cableado y pulsador, y en viviendas colectivas cañerías y cajas para timbre con cableado, portero eléctrico con cableado y teléfono sin cableado.
En el exterior un pilar de acometida con cajas para toma y medidor. En viviendas colectivas caja de tomas, gabinetes para medidores y tableros, cuando correspondan, según reglamentación local.

1.4.3.16. Instalaciones contra incendio

Para viviendas colectivas, se deberá cumplir con las reglamentaciones locales vigentes en la materia.

1.4.3.17. Varios

Mesada de cocina: de material reconstituído o acero inoxidable.
Longitud mínima 1,20 m.
Vidrios planos, transparentes, espesor 3 mm. a 4,2 mm. según dimensiones de las aberturas.
Cerco divisorio: 3 hilos de alambre galvanizado, postes cada 3 m y de altura mínima 1,20 mts..

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

0·1 7oaet Ejecutivo Entre Ríos

DECRETO Nº 4381 1·!GJOYS?.

PARANA, 30. AGO 1983

VISTO

La necesidad de unificar criterios en el trámite de es- tudio previo a las adjudicaciones para la ejecución de obras pfibli- cas; y

CONSIDERANDO :

Que previo a toda adjudicación es conveniente contar con el informe de una comisión que a partir del estudio y evaluación de- la documentación complementaria y propuesta aconseje con fundlentos la oferta más conveniente para los intereses del Estado y de la --- Comunidad ;

Que la normativa vigente determina que *el* concepto de - oferta más conveniente comprende los aspectos económicos y t cnicos que hacen al cumplimiento del Proyecto y también conceptos tales -- como dePensa de la fuente de trabajo local, de la preservación de la industria y el comercio local, de las condiciones morales del adjud catario, su relaci?n empresario- trabajador - empresario- estado, el pago de salarios, leyes sociales y gremiales, tasas e impuestos en - el territorio provincial;

Que es premisa del Gobierno del pueblo de Entre Rios la - participación de todos los sectores de la administración en los te-- mas que interrelacionados hacen al desarrollo de las acciones pro--- puestas para cumplir con el mandato popular ;

Que en el tema planteado tiene ingerencia además de los - respectivos Organismos Técnicos Constructivos la subsecretaria de -- Trabajo que, a partí de la inspección y vigilancia del trabajo , fi calización del cumplimiento de las normas , convenciones colectivas y reglamentaciones ante toda persona fisica y/o juridica que tiene peE sonal en relación de dependencia , conciliación y arbitraje en los -- conflictos laborales, tiene los antecedentes de las empresas contra- tistas que registra y hacen a los conceptos enunciados;

Que para lograr efectividad en el objetivo propues to de- ben asegurarse los medios para la evaluación cl esos conceptos y -- fundamenten la resolución a adoptar;

Que de tal manera es procedente disponer que toda contra- ac ión de obra púbiica que realicen los organi?mos centralizados ; -- escentralizados;_autirquicos empresas del estado, entidades ínter--

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Poder Ejecutivo Entre Ríos

DECRETO No 438 HGJOYS? –

medias, municipios y juntas de gobierno que actuén por Administra- ción Be- J:-egada:-;-pox• L±cilación PdbTi•ea o privada;-concurso o cotejo -de precios, cue ten con fl inf.orme fundado--de una comisión basado en una calificación por puntu e-de cada uno d ias conceptos deter minados en el Arttculo 7° d Decreto amentario N° 958/79 --- del- Decreto ·Ley de Obras-?úbli ;

Por elilio;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACO RDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARICULO 1°.- Dispónese e toda contratación de Obra Pública que - realicen los Organismos Centralizados¡ descentralizados; autárqui-- cos; empresas del estado¡ entidades intermedias, municipios y jun-- tas de gobierno que actuen por Administración Delegada; por Licita- c-ión Pública o privada, conc!Arso o cotejo-de precios debe contar - con un inf.prme fundado de una comisión que estará integrada también por.un representante ·de la S'J.bseéretaria de T-rabajo.

sistema de punta.je, que reglamentará eLMinisterio de Gobierno, -- T:r'Cúr:o '2°.' La, Comisi6n trabajará sobre una planilla tipo por el Justicia, Obras y servicios blicos y fundará, por simple mayoría su...cJ:>nsejo.

Al<'T'I'c::!u'td 3'\..!,J,a cmni sión .no_genera:rá- t_Qs ad c; .onales correspor\- ------aié"'ndo a los funcioJ1_ad:s y ag.entes que la- integren el cumplimien- --to dentro de sus Fun-ciones especificas-y en su relaCión de depen--- ·-===e!eflei-e.-e§t ab1eeida.

-lill.TI'Ctirld '4°:lJ El organismo o funcionario que propicie no aceptar el Consejo de la Comisión deber fundar expresamente y por escrito '"'''1.cia y .!Ea nueva pr0puesta.

DECRETO Nº 4381 HGJOYSP.

ARTICULd 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores-MINISTROS EN ACUERDO GENERAL.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comunquese, publ+que e y archivese.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

li.ese.organlsmo•.:
· Art,s• -ElpresenteDecreto será• refrendado polos sellqres Ministros secretarios *dltE*stado de Goblerpo. Justicia, Obras y. Servicios PlJblicos *y* de Economla *y* .Hacienda..
Art.7• — Roglstrese. comunlqlle!:e, pvbllqu se v.arcntvese.••;•,
.·. • – .jORGE P,<BUSTI •·
·· tr Hem6n D. Qrduna ·
,¡,.¡ ,.,.••:.···r,'llrfo Ma1hleu ,
MGJOSP •… damentales a tener
,•• •.t1\ .....:DESESTIMANDO•RECURSO::··
.:•:.,;r,,.• ·:·.· .Paraná. 3 de novtetnbre'de 1988
VIST.O ;..••;. (<-'\-- ·· • – · .,, ¡ ¡.,, ·••·.;•·· ElRecurso de Apelach .n Jerárqilté·toterpuesto Maria Crlstina..Duret! contraprovl- resolutlva.de la DlrecclóJTProv.Inclal de Vla- 1.988,;qu& no hizo lugar al riM)Catorla.rnaterlallzado contra Re luc!OnOJ'.V•.def 3 de marzo de 1988, que l'\0 se accedló a la solicitud de estabilidad.enJa catego- rla XIII delEscalafón Vlal, en virtud de la Jefatura de Departa(llento que. desempel\ara *y* CONSIDEJ;lAI)IDO:
, , que ,la apeiiiJl!e es designada, e1.11 de agosto <!ela/.l019BS, por Resolución N•410185 D.P.V..en la Jelatura del Departam nto Planeamiento, en for- ina Interltla: recofl'?Cié ::lose lee el pag9 por, subro- gancla en ro la clase dtJ revlstatltulary, la, olase correspondiente a ese cargo 111 erlno:
,.oue por Decreto N°.5522187 del23 de. etlem- ·,bre de 1987 *y* por Resolución N".1212D:P.V.del 18 de noviembre de 19B7. es reublqada, n cla!le X. cont¡nua!ldP $Xlnla pa cepclón de la subrogan- cla alá clase XIII. la Ql.e por Rosolución' N 6/88 D:P.V...fue dejadas in ufecto;
·· ou,f!II)Ciisu derect.o e'n el Arllc' .:IO 21 .de la C<!OSJit lón Provincial, en cuanto ntOtJre alas oon-
.• dlcron s·para separar del cargo que·_qesitmpel\a
O ;a-fs.110 *y* 1'2obran c:llctámer de la As so(l egal del MInlstorl<>.de 'GOblerooJustlc!a,, Obras · Y S«llvlclos Públicos *Y* del sel\or Flsca1"de Estado" respactlvamer.te;
•oué en lO'lo/mal, olrecors"O has·ldo·mal'dirlol· do;.yaQue no se ajusla en lo dstableciCio·por el Ar- tlculo-·eo•, segundo párrafo, • Decreto ·ley· N• 7060183: pero no obstante ello debe tenerse como .;Interpúesto por·ante el Poder EJecullvo Provincial, . !en·.resguardo de las garantlas constitucionales; , e Que la 'designación de la recurrente establee!- dJl poF Aesolución N• 410185 D.P.V.;fue 'con ca : J rácter de Interina, por lo que resulta intrasoenden- te la mención que haoodeiArllculo 21• de la Cons: :Ut lón.t'rovlnclal. por resultar lnapl.oable al caso.. ,daqq que todo Interlnato es.reyocuble, precario,, 1r psil9rlo y ladura.cllln del ml o,no pu!!(le, slgnl-.' licar consolkfaclón de ningún derecho a quien se: pel\a el) es as, COndiciones;,.. :•.-.,? >!!,>•,·· bue se lmppne la desestimación de lo solicita- eo el rcurS? en cuestión; ,P,or, o: , ·¡ .' •,_.-'·' .1,.,.,,... El Gobernador de a,P.rovlncla
.Nt.1 .•-Oesestionlise lo colleltado al')el Re.,., ronle Icurso de Apelación Jarárquloa, Htei'P,U!lSt.o *por* la :set\orlla Maria Cristina Ouret, contra: la provldcn- cla·resolutiva de la Dirección Provincial de Vlall- dad del 2 de mayo de 1988, QUO no hizo lugar al :Reéurso de Revocatoria materlallzaqo cóntra Re- lsolución•O.P.V. del3 de marzo de 1988, que no ac • cedió a la "SOlicitud de estabilidad en la categorla lll.del Escalafón Vial, en virtud-del ,f'roo ue de- sempellara de Jefe de, Departamento, en razón de ¡bs argumentos expresados en los:consideranoos·' :delpresente texto legal *y* ratlllcailse los mismos : en ot.odO$ .sus términos. :•. ·····'\· . 1".¡.·:·-·· ····\ ¡"·Art. ·2•...-El presente Decreto serif refrendado por.e s&llor Ministro de Blenestarsoctal; CUltura Y Educación.
.A-(1•.3 ·,-:Reglslt ose. comuniquese, publique- lsey. rchlvese y pasen las presentes actuaciones . ffrovjnclal.de-Vialldad, para notifica- :clón de la recurrenle. cumplido archivase• .-

RESOLUCION"N! 222B MG;IOSP·
REGLAME N•
.Ce•octubre de1988
r Si t R"..'ltJ 1f't"()
111 fs> l)t'\4 1/1¿11 Ml_;JOSP qÚe tllspone la creac deComlsloner d·utuci"IO de Propypstas rm!mo:2·•ti61ece que ei·Mirilsterlode . .Gobl!lroo;·Justlcllí; Obras·y Servicios Póbllcos·re glamente el slstema; ¡y . CONSIDERANDO;
:··aue.esne<:-esariO'llfár-.fás paútas"ytóoiC:ostíri! DECR"E'I;O'N• .5B79 puntaje para cada;uno;·
Que ,snecesario que"Bt"Reglstró Provlnclal"de ConstrucloresdeObrasPúblicasproporcfone laca: l.'." lllicaclón de lós propol')entes respecto a las condi· porJa set\orlla clones económicos llnan <ler03, técnicos *y* moral:, dencla Que en lo, relerentlf•ii,,osf teinasrsobrecumpll- tldad.del2 de máyo.de mlentó de normas.laborales..y..soclales, hlgiene.<y recurso de seguridad al,ll!,ilu'=\tuaciAA esprlvi\lJYa dq a
Subsecretaria'deTra't>aJo:"QulertacfemáS *y* sr1e es- tima convenllinte oplnaiá ·de'•Jes:c:itros Jóplcos:
Pqr ello;
..El Ministro de .GObierno, Justicia. Obj es y Servlclos. Póblicos
,R.:E S.U.E.J;-.V...E.
Art..1• -Establecer, en el marco del Decreto N•4381188 MGJOSP, siguiente reglamentación, para el acclonar: de las Comisiones d Estudi de· Propuestas, para la ejecución de Obra Públicás.•
Art. 2• — los or!lahlsrnos deslgnarán·a·os agentes que Integrarán'cada comisión.de.estudlo con Indlvlduallzaclónd O la obra Y·requerirá enea- sode ser necesario la :o o Wract6n de..otras re- partlciones.
., <,Art•3" -.-El estudio d laaolertas se haré bajo las,aig JICI)les;paUtas••y puntaJes:·
a) Monto de,lapr.opuesta.puntaje.dera.a '10.: b).Equlpo prop , sto •.Puntaje:de·1ta•5,eo. obras de ArQ!JIlectura y 1a 10 en Obras'tse tngenter!a:
o) Plan de Trab)Ó: yicurvadl! tnllerslones- propuesta 'PUntaja.de:1·a 5.
d) Análisis de precios en¡elaci6n a la lórmula' de Vllriaclones.de Costo$ -punt e.de.t.a 5. s es P!>r,Indl<¡¡ !obaP a·10sles:por fór- mula·pol(flÓlXi).ClU
e) Personal *Otmttó;* adrplflllstratlvo *y* prolpsk>.-! .nallocal en plantel estable *de* la Empr -t sa - puntaje .de 1a S;
1) Relación laboral social;antecedentes::pun- taje de 1a 1aprlvatlvo de·la Subs'écretarla: de Trabajo.
O) Informe sobr ántecedentes empresarios:.:; puntaje de..l.af.1 Privatlvo-dei!Roglstro : de.Constryctf?r;es,de $)brasPúblicas,=:al QUe.' debe sqnchárselo.la Col}'lislón er¡ylá(ldole; solamente, el J tado de Jos.olerentes *y,et* nombre.-,presupu st!)loliciaJ Y.plazo de 'a' ..obra. licitada; por .unanlmldad{c«r. h) Otro que, la Comisión slderé.nfiCQS8rlo4undamentando<s? Impor tanela como asimismo la puntuacrón.ulllI- zada··1a 5 ó 1·a10.
Art. 4•-A la suma del puntaje que cada 'ble-: l-a, resultante, de a.aplicación·del-lu- se le·adlcIOM(á,lll slgulente•porcenla]e · a) 20%,sl,la.llrma es·local. b) 15% .si la firma es'Provlnclal• e) 10% si la.!lima fiO siehdo Provincial, eslé rádlcada,tr,abaiando en Obras Púb.licas.en; lorma)/llf1lerrurnplda, .dural)le, los,:¡:¡J lmos7 diez(1O) aJios en. el;lmbiiO: Provincial; d) 5% si la flrmaaiO sienda:Provt!'olat::es'té·ra:.: dlcada.trablijando en Obras PúbUcas:en::tor4? maInInter(!Jmplda dutante.los óltlmo$'.cin-r co (5) anos 'en el ámblto Provlnélat;
:e)Sinporcen!aje si no.es Provlnc¡al 1.1)i;so..dan: los .supuestos precesSel')tes,
.l.O.S ele ntos para co!'Sid!!rar a,ufll\lrma co, ¡ mo !ocal,o:Pr lf!cr.,r•son:.
a) Si es,unlpers9 !en qué-Oelegec;_lór:tde la ,Direcc rGe!'Oral !mposlllya(hneallzado a la Olrecclófl su Inscripción(
.h\ '''' ttata """!':""o-'e"ftft ft' -ft- 9-9 -

'Art:. s•:;..·r.:a calllllcac16n u vnada debe(4;itn "Cll1;081a.er.lundada por unanimkdad y/o IJ\IYGIIa,ɐ}(p¡ oaosdOs·cuos de-dlsldencla y sus mo\JVcs.. Docadá reurión sa ¡abrart acta c:oo zsuslconc:kiJiones :·. Q.;.. ..;· ·.,. ' ·' ·:...,.·••;·;· ·.' ·• • l·1Art.. ,.....La.nrllla!QUG oblenga, luogode lipu; j:Bdj))O aetermJnadoott)•el tr.ICUJo 4•,'mayor purf. ta ;er6: ada másCOIMll'olente y. porlo(11\)10la3<:qn$ejada•por la Comisión. - · •• *Alt* :·I• -Losrganlsmos 1tlmés1ralmentde-le-l!af n.a:ll!. tal!:rla MlnlJstert,al de Qb(sy Servl-éJOS.Nlllcos:.Jnlormuobrelll apllcaclórlde la.J)fe! sonleotoda vetqúo lo esllmen tey los elementos que a su criterio permitirán corregir y/o pe·rrecclonar el.presente 'Sistema de punlaje. 'ArL s..-Registrar, *c:qmnlcar*, publicar y ar-chiYat, A. llernAn; D Ordana • ·

Ml.N ' 'o: o;k i'ci· AR.SOCIA· L, • CULTURA YiEDUCACIÓN

Df,'CRE)'9 N ·5084 MBSCE .. · · ·:l.1j' • ·-',-- • , ;: ACORDAHDO PENSIONES ·.…,. ·· :Pa(d.'27-Cle 6etlertlb(o de 1988 2.631.903,(0&00);EulallaToresnaRios,327-fll-a8, VIST0\1 1"•lo';r. " ...;,..\;.,.i-oo·, •;<:; •>¡ :· · · "'t.as J)fese les actuaclonea' lnl<:ladisahtlel MJ. 3J.4.8R.88;'2.308.680, (0&00).' • ·:• • • t'iodo ll*lesW-6ocial; rutura:y EducaciOn, rela. <On pe<ldos de pensiones cotrespoo. Ja,Ley•4035;,.y ; -'' ·•· CONSIDERIINOO: l'" :., • :Í.• ·:!.,.;; '\..» -; ·.\ ·lau.cloepellclclr¡antahan lOS.r&-qulslto3'flfublecldoS eriel1exto de lexordio,Justl- Oepal1aí1M!!to la p.z ·Arl.3• -Reglsln fieando:au estado de necesidad; ·.. ' .. .·,.' . "aue Ja•Dlrecclóiv Segur lal;'depen-diente de la. ecretarla de Silourldad Y Bienes-ta(SocJal :eVaiU61as-emluendo'-tnrorme favorable al: respecto ollo:.l•.• ·.b·:;.;1;1;1 ·;·.-.,.,.,.,.• ··· 1 : 'e : *'El'Gobemadoi* de la Provincia. -li'.ll.;;;y.;¡:'d) Ait: 1•.....Acuórdanse, a pai'Ur delmes slgulen-pr8$81li&Docreto, pensJonos a la Aneiiu lnvalldez!y·Wadre'coñ hiJós'a'Cargo, .rlá.Nana Benedet U,337-BE-88. 2.301.776, (00,1® CONSIDEAANOO: ·. rogldospor ley'4035;-deiiÍ:yerdo al sistema de ha- *i* Blás -399-ME-88, 5.892.593. !0&-1O); P.rlmi- ; • aue lo'P!liicionac DerllS que fíJa el AAipuiO 2·· Decreto'N".456187 Uva .·2MAL-M, 2.atMSO,(06-00);Agusun ·tar'ga.s\os'orlglnaao MAS,;ra'la$persoria$ oua·a:·contlrulclón sedota· Machado, 0<»..4A-88. 1.1l86.564,(06<19); Rosa Ma· gica a la que debet an:--G ·.,_,;·.·,:"-Vh, , ,….:.•,… :rla legu1lam6o. 203-LE-88, 5.493.033, (0&03); C1e- •• Que lagestión so De!lai1amento'Col6n·:, ,.•.·.._,.. ;…•. . .mente eenotu.328-SE-88. 1898.764,(08-36);car- • dades dlspuestas ¡x .:,Anclenldecl: MarlaAurocaVoofIray, 4-V<HIS, men Baireto, 33Q.BA.88,5902.592; (08-03); Luisa· , 888188 MAS por lo 3.375..459,.';(01 7): ·Slomara Anaslacla ·Orcellot, Oulntana, ·2fKlU.a8, 5.356.505, (08-00); Matla Te- : lo solicitado. a cuyc 0.890741,(01 11) ·,..¡- • •· resa Dotl, 137 ,5.343.790, (.06-10): Mblmo· ·11\oQCoolabloJ\.wlsd **Concordia.** ,,;·,_ - - .. · ,Chaparro, -as.2.054.171, (06-10); Francis- :enlo'que lo canpc ·.;- nc:tanldld: Marf;uCena•Albornoz, 293-AL.$, ca-Retamar, 325-1-lE-as,'5.356387, (08-10); Ango- Por ello; s:o29;'376!>!(o2.00); C\'renéSamcayo;'306-SA-as, ·la Rainona ·vel4zquez, 217-VE-88, ·1:m.m. • · El Mil1lstrt f; - s;'"(02:00) •AntonJol '?.edío Scarlot. t (08-10);'Bemardina Godoy, 357-00-88. 0.396.277'. eu1u 3().4-SC$i;' f.898.372:(02 1);VJC1órlana Seg<Ma, (08-10);Salvador Cóceres, 328-C0-88, 2.063.348;' R f 303-$E.00;1Z:428;180, ¡02:1si,Antonia Rodrlguez, ·(08-03). ·· ·· ·:u· . 'ArCl• -Otor¡ 33f.f!O.a8 :058.71i6.J.OO);,'!=fnesto lgado, lnal z: Juan ·Raiílón • Alvelra:· 282:xt:=ss; • !australes mil qull'lk 1 ;?:'771:381; (02-00); ·IloSarlo Carda, :7717.081,"(08-10); ·Rosa Isabel Gonzalez, clscoMorlni,M1 N ;;; .026.542(•(02 1l: ·VIct011a ¡ara, ·364-00-88, 25.261.090;'(06-10); Paula)'olanda ; Qe San Luis N• 18 3 A.:s8;• >207.2!16, "(02.00); 'Ervln "Klchner, Sánchez.298-SA-88. 10.589.087,(03-10); Marcolo • con destlno a soh 35-Kl-a8;·5.766.2B8;(02); Rila Ramona Ftu1os , • Gonztlez. 370-«>88,'2\).735.570. (08-1()); Berna-· 1c Inlrgoca a 165-FR-88,<5.065.596;(02-1!1l: Josela González, ¡bé Almada. 283-Al.-88,"5.929.981, (06-19); Oiga !rrente; con *cargo* 373-00-88(1.485.0.'19.'l02 Qislina González;> Adela Nqcera.*44-j-10-88:* 11.014.324,(10);Ma-, ;na ,375-G0-88, S:020!31 ;··¡02 1);Ramona GómeZ. ·rla Isabe! VIII .221·VI-86, 31.383,45,, (1); dilo: Cerécter o, 37oi-00-88;9.573706 ¡02.00); a<la Bru)tocnesa, ;Marra ,VIvlana Urun<le, _to-tJR-88, ,:13.485.665 ganllaclón J,'F'llll :wHIA.-88,,5.047.'469; (02.()());' Má "Benflez, ,(06-00): Mela Natividad Gtazzlanl. 371 . 'see,r03,Partklt 34HlE-M; 5.028!'.4,(02.()()):Rogella'Clulnteros, :2.810.]72, (0&-38);Ana Maria Lecuadra., 211HA88, : 'sUbconc:epto 01 ; 27-QÚ lll8[1 1.4S4,596";'-(02..00)! Sarl.elva, 22.529.1 1. (0 1); Vlclor Manuel !!bO <!a,. 'cldo para, 1988 P 21o:te.IJ8:2 ?73.'2.44/C02-ó'n:' arla CeUe Barre- t77-TA-84. 5.937.300, (1). de IOS. londos *dii* lo,32&-BA-88, 1-'1485:900;(02-(1(_)), 'JniUena Be ez. M8dt h '!• o: !MAS:· 33N3E-88P.i0474451(02.()0);'Marla ElSl Osorlo, N'colase Olmos gJ.OSa8!Eit'(02 ,B Carn)en'Uedlna,'396-ME-88, 87-<>L-88,3.935.4 06-10); er Beatttzledes- ; Att.'3•-Re¡ ,'J.<la '-1:!.!"'02"'!.·-EMra >-Galarza;; ·'·,88, ina, 296-LE-88, 1139.793.(08-10). Mercedes Al chivar ;claBénltez. .18.239.563,(08-10); Jo.. s.064.liT9;>r(02l07): ...Basllla 'lr¡Q:encla ·Paz,, na ccl!a'!Apez. 20&-1.0-88, 13.270.707,(08-00).- 2214>·? G4;('(02.()()); Eleutelio 'lamay, Arl.2•-Elpresento Decrelo sere refreroado 76-T·.1883.!- ;Héctr!.º Rulz 'por el señor Ministro de BJenos tar Social, CUltura Olaz,'328-RIJ.88, 5.-7'79.638, (02-00), AUr.IJ!a Galar· !y Educa·'"- ESO l_! 1 362.qM!S, f487.2 (02-00);ROsa'SavlnaGaf.• ' . • VISTO· ;u;:o 732:209;·(&.l-ÓJ>:<Wsa'Fleltas, M'3•Reglstrese, nlquese, &-. 180-FC..elf. 0889366:' (02 7)"rusta·AJzugaray se y pasen las presentes actuaciones al Mlruste- Las presente: 279-Al-88:'1.21Ul17.'(02.00): nma Delfina·Agu 119 de Bienestar Social, CUltura *Y* Educación. a sus Ministerio. modl

RESOLUCION Nº 647 I.P.V.E.R.

I'AI:.\NA.

Gobierno de Entre Ríos

24 MAR 1992

y15":01

1.11 llcwoluct6n N", 2229/lltl 1" ' la que "e re¡¡lnmmolll "" p,., • <'l"

N" lo'liii/IJII IG..IC•SI'; y.

C:ON:HnERANIJO:

Que (ltH· los ArL:f:ulos .Jg y t, u ele *la* r..iltula uonun se ,.,,.t,J,•r, u fdcl fliiiHLu:-: *y* pr•rct'UI :n)es n ·lt:r· •. en r..uentn ¡ulr 111 c.:•unl5;f""'·'J lll! t::,lllldl• l'l d.· fll up t·· t n:J ,,) uhun,•ut!t, tlo cull1.&.COl' lu.s ufct'Lifll::J (\tt::Jcnl•ulo:J;

()1.1:1 sl:i lJlen las f)oules meeu;lnutu•ul:i luu1 .strvfdu pun: uui 111 "" –

.,,J '·' 11 1 fu 1l(: 1;-s\tr!\stint.os r·eperLJcJonr.s para ln i.Hl.ft br.:,,(ión 1ft: J,.·; n'H•IH pl,ldtt 1:J o'lvie te ·fn ·····:·· ·····:·· ·····:··

Provincia de Entre Ríos

647

RESOLUCION Nº ... M.E.O.S.P.



luf-.u mt ; t.,ht"e **antecetlent:es enqu CSilr ioR: puul** jt• **lit! 1 t lfl. l 1** """"
lo,; >: uiJ<:J(:Írselo le .Coml.s1.6n envl/uulo!lc ;;o l"""""'' e ni llsruolu
lu:i ul'ce· ,,.res *y* el ,\omlu·e, pre5upucstn **oflo:iul** *y* **do: 111**
') nr 1" que! 11n Com:lsi6n por unan """" cniiHidere ucc:csur i11, fuudu
lut:lltuJidú su tu1portaJicJ.a co111o asimismo JHrnt:uuc .j „ uti 1 izttda - 1 d
"• !l'l '!'!.!._!•",·: A '" .:uma <leJ. r•nicoje que cada ofuo·cnl:c (lhLell¡;ll, ·e;:ultanto! ,,.
1u llJ•l i, ,.•.i/,u tlt 1 J\rtjt. ulu 3°, sé le tHll.c.:.f onul·lt o1 s l*U***u1ente punl ltjt**
,,) :;j l.o l'innu "U po·nv'Jnt:Jal ; 5!1.sohre eJ. [H111tO u),
lo) :;;; l;, 1 lnn11 "" sien'dn **provjnclal** estA ra<llctuln t:rllb<lJnlldo en ohra9 l•t•loiJ..-
ɛ;, :; 11 l HlllH iniul.t'l" "ump1Lios j durante los t l1timos S uñnu fJU eJ. ówhi tu 111..
v • n• ··•.ol: 11. :-wlll"t! e.1 punto a)!
" l.u::l :Jut:rr tu!l pua ,J C()Jl sic.Jer :lr a l no fme como "loCt.ll o pt·ovtru:lal t;On:
••.1 ;, . : uni lu:o·:l<lllto.l., :en llll<l, Del gacl6n tle lA flirP.t:cJ.lln (;encral Tmpnsit·ivn -
ltu ,,l:., 1 i.t.c..lo H inScLi.(JC:lÓn /
lo) St "" """·"de Sot:J[1] **llnde1-1, el¡lu¡;ar tlontle !11scrlh.ill el** Cl111Ll'ato Snt:l11l
llo:lt:;;uo: i.'.u 1lt! 111 1JI;rcc:c i.t.n **Ge1 eral Imposl. tl va,** oluo ule se i.nsct·il•íó."

A l r l4C.:lJ1.11"·:- 1 gl.1.::t.t" E.1, *y* arr.lllvo•.-







IAPV IAPV IAPV

LEY No 9.353

(B.O. 31/8/01)

CONTR.A.TACION DE BIE 'ES Y SERVICIOS. PROCEDI:VIIENTO

Artículo rO - La Administración Pública Provincial. sus organismos autárquicos o descentralizaqos, las sociedades y empresas del Estado Provincial, en codo procedimienco de contratación de bienes o servicios deberán dar preferencia a las aferras de empresas que reúnan los siguientes requisicos:

a) Acreditación de su radicación o asiento principal en la Provincia de Entre Ríos, no menor a eres *(3)* años.

b) Similar *calidad* del bien o servicio ofrecido.

e) Constancia de pago de codos Jos impuescos provinciales, de las tasas y/o contribuciones municipales y certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia de Entre Ríos y/o el organismo de recaudación municipal pertinente.

d) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas Provincial de los automotOres , propiedad de la empresa.

e) El precio ofrecido no deberá super:1r el cinco por ciento (5%) con respecro a la mejor oferta en el caso de las licitaciones o el cinco por ciento (5%) del precio de plaza en el caso de las concrataciones directas.

Artículo Z0 - En relación al artículo 1 o se tendrá en cuenta primero las ofertas de las empresas provinciales , considerando en ambos casos los siguientes aspectos:

a) En primer término se adquirirán *los* productos primarios de origen provincial, los productos industrializados que utilicen insumas del mismo origen o que tengan el mayor va lor agregado incorporado en la Provincia.

b) Si *los* prod uccos primarios o industrializados no se produjeran en la Provincia o su producción fuere insuficiente en CJn- tidad y/o calidad. la adquisición será prefe- rentemen te efectuada a las empresas co- merciales radicadas demro del ámbico pro- vincial que puedan abastecer cales bienes, sobre la base de precios competitivos.

e) Las prioridades sucesivas la tendrán *los* bienes o servicios de origen nacional y por último los de origen extranjero.

Artículo 3" - En las licitaciones de obras a encarar por el Estado Provincia!. se de- berá prever en cuanto t"uera técnicamente posible y conveniente la utilización de bie- nes (productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o el abora- dos en el terriwrio provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento *(50%).* Siendo responsabi lidad exclusiva del concrarisra probar cualquier caso de inexis- tencia de determinados bienes. Asimismo deberá preverse que el origen del cien por cienw (*1* 00%) de la mano de obra no espe- cializada y el cincuenta por cienco (50%) de la mano de obra especializada sea de naturales de la Provincia o fuera de ella con dos (2) años de residencia en la misma. En codos *los* casos el cumplimiento del presente artículo no podrá representar un aumentO del presupuesw de obra superior al cinco por ciento (5%).

Artículo 4° - Cuando se trace de contra- tos ejecutables en el inceriorde la Provincia se dará prioridad en l a evaluación de las ofertas a empresas radicadas en las localida- des destinatarias del proyecto final. c:n las condiciones del artículo 1°, incisos *b). e).*

d) y e). Si por razones de capacidad Lecni- ca o económica no ?uedan competir las empresas radicadas en dichas localidades. se pnoriz ará en lél evaluación a las empre-

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523 86

sas provinciales que contemplen la incor- or: c:ón de /.1.'s :7: rs.lt s cc:1l/es par:1 ia ejecuc:ón C<! la obr:1.

Artículo 5° - Cuando en los proyectos de obras o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se elegirán aquéllas que permitan la mayor utilización de materiales o produccos que puedan ser abastecidos por la industria local o desarrollados en r.iem¡:io. costo y calidad razonables por ella, teniendo en cuenca los siguientes aspectos:

a) Las especificaciones indicarán siempre bienes que puedan producirse en la Provincia, salvo cuando la industria provincial no ofrezca ni sea capaz de producir ningu na alternativa total o parcialmente viable, aqué11a que cumpla la función, requerida a un nivel tecnológico similar y en condiciones satisfactorias en calidad y costos.

b) Si un bien puede ser provisto por la industria local, pero solamente hasta decerminado peso, volumen, tamaño, potencia, velocidad o cualquier otro límite de especificación se trata::-á que los proyectos se encuadren dentro de lo que resulte razonable desde el punto de vista técnico, con el fín de facilitar fa máxima participaci ón de la industria provincial en su provisión.

Artículo 6° - La contratación de servicio de ccnsultor:J. se .:onc:-e:::.: .::i. prer.e:-e:1- er:1e:1re, .:on profesionales o ::éc::.iccs macricufados en !os respectivos colegios de cada especialidad cor¡ asienro en la Provin - cia y que acredicen una residencia real y efectiva en la misma no menor a eres. (3) años anteriores al rriomenro de su oncrata- ción.

Cuando la complejidad técnica del servicio de consultoría a contratar u otras circunstancias debidamente jus tificadas así lo exijan, se podrán contratar los servicios de consultoras del resro del país o del extran- jero, dando prioridad a aquéllas que en mayor proporción incorporen profesiona- les o técnicos locales.

Articulo 7° ·Las comi siones que según el caso deban decidir fa preadjudicación de u na contrataci ón, deberán cumplimentar lo dispuestO en la presence Ley bajo pena de nulidad.

Artículo go- Invitar a fas Municipalidades y Juntas de Gobierno a adherirse al régimen estatuido en la presente Ley.

Artículo 9o - Derógasc toda disposición que se oponga a la presente.

Artículo lOo - De forma.

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Gobierno de Entre Ríos

RESOLUCIÓN N" 242 MGJEOYSP

pAR.Al"!Á, L14 MAY 2009

VISTO

La Resolución N" 131 del Ministerio de Gobierno Justicia Educación; Obras y Servicios Públicos, de fecha 28 de abril de 2009, y publicacf. en el Boletín Oficial del día 14-05-09 y;

CONSIDERANDO:

Que la citada Resolución 131/09 MGJEOYP, modifica la 647/92 MEOYSP;

Que se ha detectado un involuntario error de redacción en el artículo 1° de la Resolución 131/09 MGJEOYSP, que para una correcta interpretación es necesario corregir, atento a que la Resolución 647/92 MEOYSP., en su artículo 4to. Inciso a) se refiere a porcentaje y no a puntos;

Por ello;

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE GOBIER<'\"0,
.JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUE VE:

ARTICULO 1°. Rectific artículo 1" de la Resolución N" 131!09 MGJEOYSP., en la parte éio de se expresa... "a) Si la firma es provincial : 20 . puntos sobre el punto a ..." ebe leerse... "Veinte por Ciento (20o/o) sobn'! el punto a)...", result aplicación .a partir de la fecha de la presente Resolución.-

ARTICULO ZO: R egistrar, om uni car, p bli car, archivar y pasar a_la Dirección ste . Mim de Despacho de erio p a su comunicación a la Secretaría de aestructur ·para re li Planeami ento In fra zar las comunicaciones de práctica.-

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. MARIA ROSA FREIJES
Directora Despacho
M.G.J.E.O. y S.P.
Gobierno de Entre Ríos

Hs/

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos



RESOLUCION N" **131** MGJEQy.SI? • –

28 ABR 2009

VISTO:

La Resolución N° 647i92 MEOSP, modificato i e la Resolución N° 2229/88, esta últ{ma reglamentaria del Decreto N° 438V88 MGJOSP;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 4° de la Resolución N° 647/92 MEOSP, establece ciertos puntajes y p utas a tener en cuenta por las comisiones de estudio de propuestas, al momento de calificar las ofertas presentadas;

Que si bien dichas pautas han servido para unificar el criterio de las distintas reparticiones para la adjudicación de las obras públicas a contratar, se estima oportuno adecuar las mismas a nuevos pr-incipios de nuest"ro derecho público, particularmente el artíc lo 67° inciso b de la Constitución l?rovincial;

Que en consecuencia resulta conveniente modificar el el inciso a) y asimismo. derogar inciso b; ambos- del citado 647/92 artícu o 4° de la Resolución N° MEOS? sin que ello altere Decreto N° el espíritu qe la norma ni del 4381/88 MGJOSI? al cual reglamenta;

Que es menester precisar que la presente modificación entrará en vigencia a partir de su publicación;

Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO
DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS-PUBLICOS

RESUELVE

ARTICULO 1° .- Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 647/92 MEOSP, el que quedará redactado de la siguiente forma:

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 4° :A la suma del puntaje que cada o:Cerente obtenga, resultante de la· aplicación del Articulo 3°, se le adicionará el siguiente puntaje;
a) Si la firma es provinc al 20 puntos sobre el punto a), · :·
Los· elementos para considerar a una firma como local o provindial son:

a) Si es unipersonal, en qué Delegación de la Dirección eneral Impos tiva ha realizado su inscripción; ..

b} Si se trata de Socinda , el lugar donde inscribió el Contrato Social y Delegació e lá Dirección General Impositiva· -donde se inscribió."

\ .:RT:tCOLO 2°.- Regj_sr:.re¡, COrun1.ques pw:> j_qucsc y arch1.vese.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA AREA DESPACHO SEDE 14 MAYO 2009 Recibido: Hora:

Dra. MARIA ROSA FREIJEIRO Directora Despacho M.G.J.E.O. y S.P. Gobierno de Entre Ríos

ANEXO CORRESPONDENCIA DE ARTICULOS SEGUN CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Y DECRETO PROVINCIAL 2715/16. Segun las modificaciones introducidas por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion, aprobado mediante ley N°26994 vigente desde 1/8/15, se detallan las correspondencia de los Articulos que se mencionan en el Pliego General de Condiciones.

Articulo 6: donde dice union transitoria de empresas corresponde diga "Union Transitoria" U.T.

Articulo 12: donde dice Articulo 2013 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1583 al 1587 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Articulo 66: dende dice Articulo 1646 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1273-1275 y 1277 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Articulo 68: La Redeterminacion de Precios se efectuara conforme al Decreto Provincial **2715/16**

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Provincia de Entre Ríos

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda

LICITACION PUBLICA Nº 14 /16

URDINARRAIN 15 viviendas

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ÍNDICE

ARTICULO 1º-OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 2º- PRESUPUESTO OFICIAL
ARTICULO 3º-LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 4º-PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
ARTICULO 5º-PLAZO DE EJECUCIÓN
ARTICULO 6º-PLAZO DE GARANTÍA
ARTICULO 7º- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
ARTICULO 8º-CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO
ARTICULO 9º-RECOMENDACIONES
ARTICULO 10º-PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035 ARTICULO 11º-
MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN
ARTICULO 12º-PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO
ARTICULO 13º-NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES
ARTICULO 14º-CONTRATACIÓN DE SEGUROS
ARTICULO 15º-ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 16º-RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS
ARTICULO 17-DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES
ARTICULO 18º-TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO
ARTICULO 19º-TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA
ARTÍCULO 20º-RÉGIMEN DE MULTAS
ARTICULO 21º-PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA
ARTICULO 22º-COLOCACIÓN DE LETRERO EN OBRA
ARTÍCULO 23º-ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO
ARTICULO 24º-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS
ARTICULO 25º-MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA
ARTÍCULO 26º-REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS ARTICULO 27º-ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA
ARTÍCULO 28º-GASTOS DE INSPECCIÓN
ARTÍCULO 29º-REDETERMINACION DE PRECIOS
ARTICULO 30º-SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
ARTICULO 31º-VARIANTES
ARTICULO 32º-ANTICIPO
ARTÍCULO 33º-ACOPIO
ARTICULO 34º-PROPUESTA TECNICA
ARTÍCULO 35º-CONDICIONES DE DISEÑO
ARTÍCULO 36º-EVALUACION DE PROPUESTAS Y PROPONENTES:
ARTÍCULO 37º-ADJUDICACION Y CONTRATO
ARTICULO 38º-DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
ARTICULO 39º-MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
ARTICULO 40º-DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES DE LA LICITACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

La presente Licitación Pública se encuadra dentro del Programa "Federal de Construcción de Viviendas TECHO DIGNO".

La Adjudicación, la Contratación de la obra y el Inicio de la construcción del Conjunto Habitacional quedarán supeditados a la disponibilidad de los fondos específicos que la Nación remita para este Programa.-

ARTICULO 1º - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes al Conjunto Habitacional, que a continuación se describen. El Comitente de las obras es el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, de la Provincia de Entre Ríos.

Descripción de las obras:

Las obras de viviendas que se licitan son las siguientes: la cantidad de 15 viviendas en URDINARRAIN Departamento GUALEGUAYCHU, de las cuales 1 (UNA) corresponde a prototipo de Situaciones Especiales, del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno con financiación mediante el Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. De las cuales se deberá ejecutar el número de viviendas para discapacitados que se indica en este Pliego, con sus respectivas obras de infraestructura y obras complementarias, en la ciudad respectiva, cuya tipología es de unidades individuales en planta baja, encuadradas en dicho Programa. En cuanto a las obras de Mejoramiento del Hábitat urbano Infraestructura y complementarias serán financiada por el Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno.

DE LA LICITACIÓN

a) Modalidad de la licitación:

La modalidad adoptada para la presente licitación es: **Proyecto Urbano y Precio propuesto por el Oferente y en cuanto al Proyecto del Prototipo es provisto por el Comitente**. El Proponente deberá aportar el respectivo Legajo de Proyecto de la Urbanización, adoptando obligatoriamente el prototipo del "Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno", del cual se adjunta legajo técnico completo y cómputo de un prototipo.

b) Llamado a licitación:

La licitación se realizará en el lugar, fecha y hora indicados en los correspondientes avisos del llamado, pudiendo participar de la misma aquellas firmas que satisfagan los requisitos establecidos en las Bases Generales y este Pliego. Por causa justificada el Comitente podrá prorrogar la licitación, en cuyo caso deberá hacerlo público mediante avisos similares a los del llamado a publicar en los mismos medios que aquel, como así también informarlo a los adquirentes de pliegos en forma similar a la adoptada para transmitir las aclaraciones que se formulen acerca de la licitación.

c) Precio, forma de pago y lugar de venta de los pliegos de licitación: Los pliegos de licitación estarán disponibles para su venta en los lugares y al precio que se indique en los avisos del llamado correspondiente. Los mismos podrán ser abonados en efectivo o mediante cheques librados a la orden del Comitente.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

d) Sellados: De acuerdo a lo dispuesto por Ley 7291 no corresponde sellado de actuación administrativa o sellado de foja por las presentaciones a efectuar en la licitación.

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL TOPE:

Se fijara que el monto máximo de adjudicación sera:
A.-Presupuesto oficial de las obras de viviendas, honorarios de proyecto urbano y mensura:DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE con 23/100 ($10.447.119,23) PRECIO TOPE al mes de SEPTIEMBRE de 2016.
B.- Presupuesto oficial de las obras de infraestructura y complementarias de las viviendas:Pesos TRES MILLONES CIENTO VEINTIUNO MIL SESENTA Y SIETE con 88/100($3.121.067,88) PRECIO TOPE al mes de SEPTIEMBRE de 2016

Todas las ofertas que superen el mismo no seran sometidas a consideracion de la Comision de Estudios de propuestas por lo que la misma sera rechazada.-

Presupuesto oficial total por unidad

El Presupuesto Oficial de las obras por cada unidad de vivienda es de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SE ENTA Y DOS con 20/100 ($691.862,20) y de las viviendas para discapacitados es de PESOS SETECIENTOS SE ENTA Y UN MIL CUARENTA OCHO con 42/100 ($761.048,42), que incluye costo de viviendas, honorarios de proyecto urbano y mensuras.

El Oferente en su cotización para "**VIVIENDAS**" deberá desglosar y cotizar los Ítems que componen los prototipos stándard y de discapacitados del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno, y para la cotización de **"OBRAS INFRAESTRUCTURA"**(Red de agua, Desagues Cloacales, Red de energía eléctrica y alumbrado y trama vial), y para **"OBRAS COMPLEMENTARIAS"**(Movimiento de tierra, Cercos divisorios, Veredas, Muros de contención) y el resto de las Obras que comprenda su Proyecto Urbano, agrupados de acuerdo a lo indicado en el ART 35º-4 del presente pliego que describe su composición.

NOTA: LA PROPUESTA DEBERA SER INFERIOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL TOPE

Retenciones:
Los oferentes deberán tener en cuenta al formular sus propuestas que el I. A. P. V., efectuará las retenciones que se detalla a continuación.
Retención para gastos de Administración e Inspección del I. A. P. V. El comitente retendrá para Gastos de Administración e Inspección del I. A. P. V. relacionados con las obras, el 2 % de cada certificado que se abone al Contratista, por lo cual los Proponentes deberán tener en cuenta dicha deducción en la formulación de sus propuestas, considerando que los montos correspondientes se hallan incluidos en el rubro "Gastos generales".

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 3º - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en sede del I.A.P.V., Laprida 351 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el día y fecha fijado en los avisos de licitación, o el primer día hábil siguiente a dicha fecha, a la misma hora, si aquella resultara inhábil.

ARTICULO 4º - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: : La Oferta deberá presentarse hasta el día y hora del Acto de Apertura en la sede del I.A.P.V., Laprida 351 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos

Fecha de cotización: Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitación.

NORMAS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1. De los requisitos

Los requisitos mínimos a cumplir por los oferentes en cuanto a la capacidad empresaria y técnica, solicitados en las presentes normas, serán claramente especificados, de tal manera que si la oferta más conveniente, tal cual se define en el artículo 19 del Pliego General de Condiciones, da cumplimiento a esos requisitos mínimos y al resto de las condiciones que se especifican y requieren en la documentación que integra el llamado a licitación, será en definitiva la adjudicataria del contrato.

Las empresas que se presenten asociadas deberán satisfacer además los requisitos establecidos en el artículo 6º de las Pliego General de Condiciones.

El representante técnico del proponente que debe suscribir con éste la documentación de la licitación, deberá hallarse matriculado en el Colegio profesional correspondiente de la Provincia de Entre Ríos y por lo tanto habilitado para tales funciones.

2. De las propuestas

Las propuestas serán confeccionadas por el proponente y se presentarán en la forma indicada en el Pliego General de Condiciones y de acuerdo a lo especificado en las presentes normas de presentación.

Las ofertas se presentaran según los modelos agregados como anexos a este pliego Se discriminaran asimismo las obras complementarias de viviendas, y de infraestructura. Las incidencias porcentuales de los mismos serán aquellas con que se certificaran las obras.

3. Documentación que deberá presentarse

"SOBRE DE PRESENTACIÓN" -. En ningún caso este Sobre tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. En su interior se incluirá el **SOBRE Nº1** conteniendo la documentación que se indica a continuación.-

1.4.1. De los documentos que deberá contener el Sobre Nº1:

-Deberá ser presentado debidamente cerrado, y llevará un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura y nombre de la Empresa o Firma proponente

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

-Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original, duplicado y triplicado, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo.
-En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original.
-Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional.
-Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la "Oferta Económica (Sobre Nº2) o en sus "Variantes" si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de rechazo de la propuesta presentada.
-**La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 de- certificado de capacidad de contratación anual (copia certificada) - garantía de oferta – Sobre Nº 2 - serán causales de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 - Propuesta Económica - por la autoridad que presida el acto.-**
La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, **será rechazada la Propuesta**.-

-Preferentemente se deberá respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.-

3.1. El comprobante de compra de los Pliegos que sirve de base a la licitación.
3.2. El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1 M.E.H.O. y S.P.
En caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente unidas a la licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte proporcional con que concurre cada una de ellas, agregando los certificados extendidos por el Registro de todos los componentes.
3.3. Comprobante del depósito de la garantía de oferta que no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) del monto de presupuesto oficial de la obra. El procedimiento de la formalización de la garantía se especificará en los Pliegos de Condiciones Particulares. La garantía podrá constituirse por algunos de los siguientes medios:
En efectivo, con depósito en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. o Nación.
En títulos de la Nación, aforados a 90% del valor de cotización, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la fecha de la garantía.
Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y exclusión, en los términos del Art. 1583-1584-1585-1586-1587 del Código Civil y Comercial de la Nación. No deberá contener fecha de vencimiento, hallándose expresamente a la ley y al contrato motivo de la misma, aún cuando no fueron pagados por el tomador los valores que demanden su costo. Deberá expresar así mismo,

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante con aclaración de esta última.
Con seguro de caución, otorgados por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la provincia de Entre Ríos.
3.4. Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta fotocopias del Certificado de Regularización de Deuda por Impuestos Provinciales.
En caso de no haber trabajado presentará una declaración jurada de no haberlo hecho.
3.5. Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unión Transitoria – U.T. - los de cada una de ellas; así como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situación. Constancias de inscripción ante los Organismos Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Números de inscripción del Proponente en: Dirección General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción en el Impuesto al Valor Agregado, Administradora Tributaria de Entre Rios (ATER) - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la administración.
3.6. De la capacidad económica - financiera, para ejecutar obras del tipo de las que se licitan.
Las empresas deberán presentar los Estados que se detallan a continuación confeccionados de acuerdo a las normas contables vigentes:
a) a) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Estos Estados deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si correspondiera.-
En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres (3) meses a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revisión Limitada aplicable para periodos intermedios.-
En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañarán declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios certificadas por Contador Público, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

Cuando el inicio de actividades sea inferior a los 3 años, deberá presentar los balances correspondientes a los ejercicios efectivamente cerrados.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

b) Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el oferente y la antigüedad de las respectivas cuentas.

3.7. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
3.8. Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años tanto en el ámbito provincial como fuera de él.
3.9. Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos en otras obras ejecutados y/o en ejecución dentro de los últimos cinco (5) años tanto en el ámbito provincial como fuera de él.
3.10. Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico.
3.11. Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto Nº 5908/98 y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales respectivo.
3.12. Calificaciones y experiencia del personal de la Empresa propuesto para la administración y ejecución de la obra.
3.13. Plan de Trabajo y Curva de Avance, sin consignar precio alguno, expresado en porcentaje de avance de obra.
3.14. Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido. Indicando marca, modelo, año, rendimiento y precio detallado al mes base de la presente licitación
3.15. Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del Pliego General de Condiciones
3.16. Líneas de créditos bancarios si las tuviera.
3.17. Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance.
3.18. Referencias bancarias del oferente.
3.19. Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, además de presentar todo lo indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO".
3.20. En caso de Uniones Transitorias - U.T. -, además de presentar todo lo indicado en forma individual, deberán presentar Contrato por instancia publica o privada de Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA" de conformidad a lo dispuesto en la Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Arts. Nº 1463 a 1469. - con certificación de firmas ante Escribano Público.
Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra.

4) La designación de un representante de la U.T.-

5) La previsión específica de la responsabilidad solidaria de las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

3.21. Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la Industria de la Construcción. (I.E.R.I.C)

3.22. Deberán presentar según su constitución, la documentación que acredite el estado societario:

1 - **Sociedades Comerciales**, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o autoridad de contralor:

- constancia de inscripción como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

2 - **Empresas Unipersonales**:

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del Código de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de Juicios Universales.

3.23. En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

3.24. Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación.

3.25. Sobre Nº 2. "PROPUESTA ECONOMICA"

Contenido Sobre Nº 2: El Sobre Nº2 - **Propuesta Económica** - debe contener el **original, dos copia y la misma en soporte magnetico**, de la documentación que se detalla a continuación:

a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia entre el original y los duplicados, se tendrá por válido el original.

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta los que también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

c) Plan de Inversiones y Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem.

d) Para dar cumplimiento al Decreto 2715/16 MPlyS se debera presentar:

1- PRESUPUESTO.-

2-ANALISIS DE PRECIOS.-

3- LISTADO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.-

4-TABLA DE PONDERATORIA INDICES INDEC VINCULADA.-

En virtud de que dicha documentación se tomara como base para aplicar la METODOLOGÍA para el cálculo de los COEFICIENTES de actualización al mes que correspondiere, la misma deberá coincidir en

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

todos los términos con lo presentado en forma impresa en el acto Licitatorio (Cómputo - Presupuesto - Análisis de Precios).Todos los ítems de la Obra deberán contar con los Análisis de Precios de los cuales surgen los precios unitarios que originaron el monto de cotización.

La falta de presentación de los incisos b) y d) en la forma establecida precedentemente implicará la descalificación inmediata de la oferta correspondiente.-

3.26. Sobre "VARIANTE"

Contenido Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de **"Variantes"**, los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

3.27. Sobre "PROPUESTA TÉCNICA"

Contenido Sobre Propuesta Técnica: Cuando correspondiere presentar por parte del oferente el Proyecto Total o Parcial de la Obra, se encuadraría como una Licitación del Tipo de Proyecto y Precio, en la que corresponde la presentación del proyecto proporcionado por el oferente, en tal caso se anexará al Sobre N° 1 una carpeta caratulada "PROPUESTA TÉCNICA" que incluirá la documentación técnica pertinente, del proyecto que se requiere.

Todos los documentos contenidos en el sobre "propuesta técnica" lo serán por triplicado (original y 2 copia) doblados tamaño oficio, abrochados y con el original firmado. Deberá estar identificado un ejemplar con la palabra "original", el cual será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será designado con la palabra "copia", como asi tambien una copia en soporte magnetico.

4 - Impugnaciones u observaciones: Las Impugnaciones u observaciones que los interesados podrán efectuar respecto del acto licitatorio y las propuestas presentadas en el mismo se regirán por lo establecido en el artículo 16º de las Bases Generales Reglamentarias.
Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles de efectuado.
Las impugnaciones que eventualmente puedan producirse por los proponentes contra el acto de adjudicación deberán ser impuestas por las vías y dentro de los plazos legales que correspondan.
Vencido el plazo para formular impugnaciones, el expediente adquirirá el carácter de "reservado" hasta el acto administrativo que resuelva la adjudicación.
La copia del acta con toda la documentación y prueba de la publicidad de la licitación será agregada al expediente respectivo.
La interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la ejecutoriedad del Acto Licitatorio.

ARTICULO 5º - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo fijado para la ejecución de los trabajos correspondientes a las OBRAS DE VIVIENDAS es de: 9(NUEVE) meses, contados a partir de la firma del Acta de iniciación de los trabajos.

El plazo fijado para la ejecución de los trabajos correspondientes a las OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA es de: 8(OCHO)meses, contados a partir de la firma del Acta de iniciación de los trabajos.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

.Las lluvias extraordinarias serán consideradas como causa de fuerza mayor para la ampliación de los plazos de ejecución de las obras en los términos previstos en este Pliego.

ARTICULO 6º - PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía de SEIS **(6) meses** a partir de la Recepción Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO 7º - CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: La capacidad de contratación anual, otorgada por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, necesaria para la presente Obra no deberá ser inferior a la suma que resulte de multiplicar por doce (12) el monto de su propuesta dividido por el plazo de obra expresado en meses.

ARTICULO 8º - CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO: A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente el contratista deberá hallarse permanentemente representado en obra por un profesional universitario o un técnico habilitados para ello en función de la naturaleza e importancia de la obra, formalmente designado al efecto por el contratista y aceptado por el comitente; estará además autorizado para recibir órdenes de la inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento.

La firma del representante técnico en obra obligará al contratista ante el comitente. El contratista deberá asimismo disponer de un número adecuado, a juicio del comitente, de técnicos afectados al control de la obra.

El representante y personal técnico mencionados deberán acreditar suficiente idoneidad y experiencia y hallarse matriculados en el Colegio profesionales correspondiente de la provincia de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día.

En su presentación la Empresa oferente deberá incluir asimismo la designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra licitada, debiendo contemplar en su oferta el pago de sus honorarios, aportes previsionales y gastos correspondientes.

Además del Representante Técnico los Oferentes deberán designar un Delegado responsable de la Empresa con domicilio en Paraná para todos los trámites Administrativos – Contables y toda otra tarea en el Organismo.

ARTICULO 9º - RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el artículo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original como en la copia.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta con

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.
También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.
Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto puede servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro adjudicatario.

ARTICULO 10º - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los ultimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de la Licitacion.

ARTICULO 11º - **MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN:** Las obras de viviendas se contrataran por el sistema de"ajuste alzado". Las obras de infraestructura y complementarias de las viviendas se contratarán también por el sistema de ajuste alzado. En virtud de ello se considerarán comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con arreglo a sus fines, según surja de los requerimientos establecidos en los pliegos de licitación. La eventual omisión, en el presupuesto oficial o en el que la contratista hubiere acompañado con su propuesta si así correspondiere, de trabajos, provisiones o prestaciones expresamente requeridos en la documentación que sirve de base a la licitación, o que resultaren de cualquier de sus prescripciones, o la constatación de errores en la extensión y/o valor de los trabajos incluidos en dichos presupuestos, no eximirá a aquella de la obligación de ejecutarlos ni dará derecho a la misma para solicitar su reconocimiento como adicional del monto contractual, aún cuando tal omisión o error hubiere sido observada al evaluarse las propuestas y adjudicarse las obras. Advertidos tales errores u omisiones, en cualquier momento antes de la terminación de la obra, el Comitente podrá, al único y exclusivo fin de la certificación de los trabajos, provisiones o prestaciones, disponer la modificación del presupuesto de la obra, sin que ello signifique en modo alguno la posibilidad de modificar el monto contractual.

ARTICULO 12º - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO:

El oferente deberá presentar con su propuesta, un Plan de Trabajo y Curva de Avance - Plan de inversiones y Curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar y en los sobres tal como se indica en las "Normas de Presentación de las

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Propuestas".

Los planes de trabajo a presentar con las mismas deberán confeccionarse según modelo adjunto, agrupándose aquellos ítem relativamente homogéneos o contemporáneos (tales como, por ejemplo: trabajos preliminares, excavaciones y fundaciones, estructuras, cerramientos, cubiertas de techos y aislaciones, revoques, cielorrasos y revestimientos, contrapisos, pisos y zócalos, carpinterías, instalaciones, etc.).

La presentación será por separado "Obras de viviendas" por un lado y las "Obras complementarias de viviendas, infraestructura y sus complementarias", por otro.

ARTICULO 13º - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: COLUMNA 1 -
Nº DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra.
COLUMNA 2 - DESIGNACIÓN:
Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios, etc.
COLUMNA 3 - MARCA:
Se refiere al nombre de la fábrica o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. COLUMNA 5 -
POTENCIA O CAPACIDAD:
Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).
COLUMNA 6 - Nº DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:
Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de las inspecciones que realice a los equipos.
COLUMNA 8 - UBICACIÓN ACTUAL:
El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc. Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.
COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.
COLUMNA 10 -Precio detallado al mes base de la presente licitación

ARTICULO 14º - CONTRATACIÓN DE SEGUROS:

I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan

por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.-

II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo – reinserción; seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Repartición.

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida en este Pliego.

Garantía: Las garantías que los proponentes y adjudicatario deben constituir según lo indicado en el artículo 12º de P.G.C. deberán ser a favor del Comitente. Deberán además hacer constar expresamente que el garante se constituye en liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que las mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador.

ARTICULO 15º - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:

En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en el Sobre Nº 2.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION para

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

disponer el rechazo de la propuesta.

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, Mejoras Sociales, etc.
II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.

- MATERIALES COMERCIALES
Tipo de Material.....
*Costo sobre camión o vagón en: (Origen) = _____$/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar).....= _____$/u
*Transporte con camión:
…….....Km x …….....$/Km. = _____$/u
*Incidencia por cruce en balsa,
túnel, etc. = _____$/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = _____$/u

_____$/u

*Pérdidas .....% _____$/u

----------$/u
==========

ADOPTADO.....$/u
==========

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1) – Materiales

El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).

Cemento.....t/m3x…….$/t = _____$/m3
Agregado fino.....m3/m3x…….$/m3 = _____$/m3
Agregado grueso.....m3/m3x....$/m3 = _____$/m3
Agua.....m3/m3x.....$/m3= _____$/m3
Madera.....m3/m3x…….$/m3= _____$/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.....$/Kg= _____$/m3
Otros..... x…….....$/ = _____$/m3
-- -----$/m3

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

2) - Mano de Obra
Elaboración, Hormigonado, etc.
Oficial.....h/m3x.....$/h = _____$/m3
Peón.....h/m3x.....$/h = _____$/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial.....h/m3x.....$/h = --------$/m3
Peón.....h/m3x.....$/h = --------$/m3
--------$/m3
Vigilancia.....% = --------$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = --------$/m3
--------$/m3 1) + 2) =
.....$/m3+.....$/m3= --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ---------/m3
---P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.....……..... -------$/m3
__Q__$/m3
I.V.A.....% S/Q..…… _____$/m3

COSTO DEL ITEM: _____$/m3

ADOPTADO .....$/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo - ....HP .....$..... .....HP .....$
---------- ----------
_____Z_____HP ____Y____$
Rendimiento

Amortización e Intereses
--Y--$x8h/d + ------- $x0,.../ax8h/d = ---------- $/d
10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos
.....% de Amortización.....$/d =_____$/d
Combustibles
gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x.…$/l = ------$/d
Nafta : 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d

Lubricantes
.....% de Combustibles: 0,.....x.....$/d =_____$/d
- Mano de Obra -
Oficiales:…….....x .....$/d = -------$/d
Peones:……....x .....$/d = -------$/d

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

--------$/d
Vigilancia:....% ----------
-------$/d

COSTO DIARIO -------$/d
Costo por m3=..... $/d =
.....m3/d = --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos……..% $ S/X= -----$/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P..... -------$/m3
--Q--$/m3

I.V.A.....% S/Q..…….. ------$/m3

COSTO DEL ITEM -------$/m3

ADOPTADO..... $/m3
Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES

1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA	Costo/mes
a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra Jefe de Obra Capat	
b) Servicios	
c) Gastos operativos Medicamentos	
d) Movilidad y Estadía Peaje	
e) Costo de Móviles asignado a las Obras Camioneta Au	
f) P	
g) Alquiler Mensual de equipos	
h) Otros	

Sub Total (1)
Numero de Meses (2)
Total (1) x (2) (3)

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

	P. Unitario (4)	Cant (5)	% Amor (6)	Sub total (4)x(5)x(6)/100
a) Infraestructura Letrero de Obra Galpones Casilla para oficina Etc.				
b) Equipos Laboratorio Topografía Etc.				
c) Herramientas Carretilla Palas Etc				
d) Otros				

Total (7)

2) NO AMORTIZABLES

	P.Unitario (8)	Cantidad (9)	Subtotal (10)
a) Infraestructura no reutilizables Estanterías Vajilla / mobiliario de Cocina Etc.			
b) Movilidad y Estadía Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador Desmontaje de Obrador Etc.			
c)Fletes Fletes equipo de Montaje Flete Equipo Pesado Etc.			
d) Estudios y Ensayos Topografía y Agrimensura Ensayo de Suelo Ensayo de Hormigones Etc.			
e) Asesoramiento Legal y Escribanía Impositivo Económico Técnico Seguridad Industrial e Higiene Etc.			
f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías Sellado Contrato de Obra Seguro Accidentes de Trabajo Derechos Municipales Póliza caución para garantía de Ejecución Etc			
g) Otros			

Total (11)

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

	P. Unitario (12)	Cantidad (13)	Subtotal (14)=(12)x(13)
a) Equipamiento de Oficina Escritorio Computadora Etc.			
b) Movilidad Camioneta Automóvil Etc.			
c) Otros			
Total			(15)

Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)

ARTICULO 16º - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS -

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente Artículo.

2º) Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$I = k1 * k2 * G * (M - M1)$$

Donde:

I = Indemnización básica.

k1 = Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de perturbación y a la fecha de la Licitación.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes escalas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes	0,50
Entre I mes y 3 meses	1,00
Entre 3 y 6 meses	0,87
Entre 6 y 9 meses	0,74
Entre 9 y 12 meses	**0.68**
Mayor de 12 meses	0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes	0,81
Entre 1 mes y 3 meses	**I,00**
Entre 3 y 6 meses	0,90
Entre 6 y 9 meses	**0,87**
Entre 9 y 12 meses	0,85
Mayor de 12 meses	0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del gremio de la construcción vigente a la fecha de la licitación.

G (%)

Tipo de Obra	**Monto del contrato en jornales**		
	Hasta 30.000	**más de 30.000 hasta 500.000**	**más de 500.000**
***Que requiere equipo de escasa importancia o ninguna.**	6,5	6	5
***Que requiere equipos importantes:** -Obras básicas viales o hidráulicas	13,5	13	12
-Bases para pavimentos y pavimentos	9,0	8,5	7,5

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación.

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o bien si este último no existe.

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal:

$$\frac{ML}{P}$$

Siendo:

M = Monto del contrato.

L = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa)

P = Plazo original de obra.

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la prórroga acordada.

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida.

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se la considerará para tal fin como de un año.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

obras para el mismo lapso. No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denuncia- do por el Contratista en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas.

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras aprobado, durante el período de perturbación.

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis de precios agregados a la propuesta ó consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación.

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17º - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, éste podrá reclamar ante la Repartición. En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en divergencias con la Inspección.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18º - TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohíbe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repartición, a pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración en cada caso, la que ha de contener:

* Consideración de las razones que la justifican.
* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorización.
* Cargo que se efectuará al Contratista.
* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Se considerarán horas extras:

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus ordenes.

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose como tales las que excedan el horario de la Administración Publica, considerándose para ello la carga horaria semanal del agente según su categoría y se calcularán en base al cociente que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%
-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables: con el 50%.-

Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Repartición: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección.

ARTICULO 19º - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20º - RÉGIMEN DE MULTAS:

Mora en la ejecución de los trabajos:

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y todo otro incumplimiento contractual dará lugar, sin perjuicio de lo previsto en el Pliego General de Condiciones, a la aplicación de las sanciones que más adelante se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del comitente acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Art. 886-887-888 del Código Civil y Comercial de la Nación y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, que aquel quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna.

Régimen de multas:

El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos, y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, sin necesidad de intimación previa alguna.

a) La mora en el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el plan de trabajos, determinará la aplicación de las siguientes multas, las que en todos los casos se aplicarán sobre los montos contractuales vigentes al momento de su aplicación.

a.1) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato, por cada día de demora en la iniciación de los trabajos.

a.2) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato de la obra que corresponda a cada entrega parcial por cada día de demora en dichas entregas parciales.

a.3) Para las obras que no contemplen entregas parciales, corresponderá el cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato de la obra que corresponda, por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales de ejecución de obras tomados al 40% y al 70% del plan de trabajos vigente al momento de su aplicación. Estos valores serán tomados al vencimiento del período de medición que los contenga, y permitirán una tolerancia que no superen el diez por ciento (10%) del porcentaje establecido en el plan de trabajos vigente al momento de su aplicación. a.4) El cero coma treinta y tres por mil (0,33‰) del monto del contrato por cada día de demora en la terminación total de las obras.

Las multas aquí establecidas son acumulables, no obstante lo cual y dado el carácter preventivo de las dispuestas en los puntos “a-1”, y “a-3”, el Comitente podrá a pedido del interesado, condonar éstas si el contratista diera finalmente cumplimiento al plazo de terminación total de las obras, devolviendo los importes retenidos sin actualización ni interés alguno.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

b) Los demás incumplimientos contractuales serán pasibles de las multas que a continuación se detallan:

b.1) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que por esta causa pudieran corresponder.

b.2) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato por cada día de demora en el cumplimiento de las ordenes de servicio.

La aplicación de estas multas deberán disponerse por Resolución del Directorio del Organismo, y los recursos administrativos que se presenten contra ésas no tendrán efecto suspensivo.

ARTICULO 21º - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:

El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras.

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de acuerdo a las exigencias de los organismos intervinientes. La presentación títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de iguales características al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rótulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser acompañados de tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantía, requisitos sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva.

Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administración los comprobantes del trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administración los comprobantes del trámite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de los planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Contratista, quien deberá incluirlos en el item correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra.

MENSURAS y MENSURAS DE SUBDIVISION: para todos los conjuntos habitacionales se deberá presentar los planos de mensura registrados por la Dirección Provincial de Catastro de los lotes individuales, Unidades Funcionales, calles, reservas municipales y remanentes de títulos.

a. Toda documentación antes de ser tramitada en las respectivas reparticiones para su visación o registro deberá ser visada por la Gerencia Técnica, de este I.A.P.V., donde se firmaran los formularios exigidos, tales como notas de exención de sellados, resolución 13, declaraciones juradas. Para ello deberá enviar al mismo, dos copias de los planos firmadas por el profesional y refrendada por el inspector de obra, acta de amojonamiento, notas y declaraciones juradas.
b. Las mensuras deberá hacerse en el momento que se pueda incorporar la construcción a la misma. De esta manera quedaran reflejadas en el plano las medidas de la vivienda, su relacionamiento, y sus respectiva superficie cubierta y o semicubiertas, no admitiendo la incorporación de estas, por declaración jurada posterior; solo podrá incorporarse dicha superficie por plano o relevamiento de mejoras.
   En los lotes no ocupados por las viviendas, o remanentes se consignara el destino del mismo (Ej. Lote pasillo a escriturar en condominio a los adjudicatarios de los internos, lote a transferir a la municipalidad, con destino a ..., reserva I.A.P.V. etc.).
c. Se deberá colocar mojones en todos los lotes del grupo habitacional, lo que quedara reflejado en un acta de amojonamiento, que estará firmada por el profesional, el inspector de la obra y el representante técnico de la empresa, quienes constataran, que se hayan colocados los mismos, esto se deberá hacer por triplicado, siendo uno para el profesional otro para la inspección y el ultimo debe ser remitido a la Gerencia Técnica, con la restante documentación.
d. Toda la documentación de mensura registrada (planos y fichas) de todos los lotes deberá ser remitida al I.A.P.V. Dpto. Agrimensura.

ARTICULO 22º - COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y características que se especifican en el Modelo propuesto.-

ARTICULO 23º - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: El comitente efectuará por escrito, mediante circulares que remitirá por correo certificado o entregará personalmente a los adquirentes de pliegos de la licitación en el domicilio constituido por los mismos a tal efecto, las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesados hasta el octavo (8º) día hábil

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

anterior a la fecha de recepción de las propuestas, inclusive. Los interesados podrán además notificarse personalmente de la emisión de dichas circulares concurriendo a la sede del I.A.P.V. o a las Gerencia Regionales, en el horario de 8 a 13 horas, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a dicha fecha, razón por la cual el comitente no considerará eventuales reclamos de los participantes de la licitación por la no recepción en término de dichas circulares.

ARTICULO 24º - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará del ORGANISMO correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los promedios mensual considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomarán lapsos mensual calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en el mes considerado, que han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el mes considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se considerará normal será:

P.MM.L. = p mm/día P.D.L.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

La fracción que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregará al primer mes de la obra por lo que el primer lapso resultará de un meses y fracción.

CALCULO DE LOS DÍAS DE AMPLIACIÓN

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número de días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC > PMML Nº de días de lluvias en el mes de obra NºD > PDL Entonces se hará:

MM.C. - P.MM.L = "a" días de prórroga p

NºD - P.D.L. = "b" días de prórroga Total

de días de prórroga: a + b

CASO B
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC > PMML Nº de días de lluvias en el mes de obra NºD <= PDL Entonces se hará:

MM.C. - P.MM.L = "a" días de prórroga p

Total de días de prórroga: a

CASO C
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC <= PMML Nº de días de lluvias en el mes de obra NºD > PDL Entonces se hará:

NºD - P.D.L. = "b" días de prórroga Total

de días de prórroga: b

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

CASO D

Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC <= PMML Nº de días de lluvias en el mes de obra NºD <= PDL

No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

AÑO	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
70	136	327	140	55	61	64	54	14	82	126	98	86
	4	12	3	3	6	7	5	2	9	4	4	5
71	56	316	23	40	33	6	63	34	82	71	60	81
	3	5	1	2	3	2	2	4	4	5	6	4
72	44	192	4	62	136	187	37	30	140	154	108	41
	4	8	1	5	4	7	4	3	6	3	2	8
73	37	114	15	46	208	25	9	81	25	29	94	58
	2	5	2	3	6	1	2	3	2	3	3	4
74	52	145	115	120	50	47	32	15	42	32	125	102
	1	5	4	3	2	5	2	1	2	8	7	4
75	107	184	156	180	122	34	117	109	111	146	412	268
	5	11	4	10	2	2	7	7	5	9	12	7

Considerando el mes Julio tomamos del Registro de Lluvias los valores de milímetros caídos.

Julio: 54 + 63 + 37 + 9 + 32 + 117 = 312 mm.

El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será:

$$P.MM.L. = \frac{312}{6} = 52 \text{ mm.}$$

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos:

Julio: 5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7 = 22 días

22 días

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso.

$$P.D.L. = \frac{22}{6} = 3.67 \text{ días}$$

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será:

$$P = \frac{P.MM.L}{P.D.L} = \frac{52 \text{ mm}}{3.67 \text{ días}} = 14.17 \text{ mm/día}$$

Suponemos que en la obra en el mes Julio ha llovido

Julio 80 mm en 7 días

Por lo tanto siendo:

80 mm 52 mm
7 días 3.67 días

Corresponde al caso A entonces se calcula:

$$a = \frac{80 \text{ mm} - 52 \text{ mm}}{14.17 \text{ mm/día}} = 1.98 \text{ días}$$

b = 7días - 3.67 días = 3.33 días

Total a + b = 1.98 días + 3.33 días = 5.31 días = 6días

Ampliación del Plazo Contractual por el mes Julio seis (6) días.

ARTICULO 25º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26º - REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:

Entrega del terreno e iniciación de las obras: La Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir: a) ampliación del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de anticipación.

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras debe- rán iniciarse dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:
Condiciones de trabajo para la Inspeccion y Control de obra:
Previo a la firma del Acta de Inicio de Obras, el Contratista proveerá sin cargo una oficina destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra. La misma tendrá una superficie mínima de 10 m², más un baño en condiciones de habitabilidad y estará dotada de todos los servicios necesarios y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas propias de la Inspección.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Una vez firmado el contrato de obra respectivo, deberá en el plazo de 30 días dar cumplimiento efectivo a la entrega del mobiliario y equipamiento informático, que sera incluido en el Item Trabajos Preliminares y que deberá contar con: Descripción del equipamiento a requerir según el presente art. Pliego complementario de condiciones.

El mobiliario y equipamiento informático deberá contar con:

A) Elementos para la Inspección y Control de obra:

CANT MATERIALES

1 Equipo FORTINET modelo FortiGate 100D con 24 meses de UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services)
5 Puntos de acceso inalámbrico marca FORTINET modelo FortiAP 221C con 8x5 FortiCare Contract por 24 meses e inyector POE GPI-115
20 Horas de consultoria para capacitación, instalación y asesoramiento brindado por personal técnico certificado en las oficinas del cliente.
1 PC SEGÚN CONFIGURACION
1 Monitor LED 22

Impresora tipo Hp Laserjet P1102
5 Recargas adicionales para impresora
1 Puesto de trabajo con Escritorio y Cajonera de 1,50X150 de lado
2 Sillas de Escritorio con respaldo y apoyabrazos de calidad New Reagal Inyectado
1 Camara Fotografica digital con pilas, cargador y memoria 16gb
1 Distanciometro Optico Laser tipo BOSCH 100m

Tamaño de Impresión A3
Tecnologia de Impresión MicroPiezo de 4 colores (CYMK)
Resolucion hasta 5760x1440 DPI
Sistema Continuo con 2 Botellas de Tinta Negra +3 Botellas por color + 2 Recargas de iguales características
Capacidad de papel de hasta 100 hojas

CONFIGURACION DE PC I
MB ASROCK S1155 H61M-VG3 M-ATX BOX VGA
Memorias DDR3 4G 1333MHZ CL9 (CHIPS 512)
INTEL Core I3-3330 IVY BRIDGE S1155
Fuente ATX 12 V 600W 2V 12" sata
DISCO SOLIDO 480 GB
HD 1TB WD SATAIII 7200rpm 16 MB CAVIAR BLUE
LECTOR DE MEMORIA 5 EN 1
Teclado, mouse optico luz blanca, pad mouse
WIN 10 PROF. CD
Estabilizador de tensión 1000 VA 4x220
CONFIGURACION DE PC II
Mother Intel H77 express Chipset Intel BD82H77 PCH
Memoria 8 GB DDR3 1600
Placa aceleradora grafica Gforce 1GB DDR3
MICRO INTEL CORE I7-3770 8MB cache up to 3,9 Ghz
Fuente ATX 12V 600W 2 V 12" sata
Disco Solido 480 GB
Disco rígido 1 TB SATA 3.0
Monitor tipo LG 22" FLATRON W2242S-PF
Win 10 PROF CD PROF CD
Estabilizador de tensión 1000 VA 4x220

La entrega de la mercadería, por parte de la Contratista, deberá realizarla en oficinas del departamento contrataciones, junto a un listado por duplicado que contenga las especificaciones de lo presentado. Dicho equipamiento quedara sujeto a control administrativo, informático y/o técnico según corresponda. Posteriormente se efectuara un acta de conformidad, la que deberá ser exigida por el inspector al contratista al momento de firmar el acta de inicio de obra.
El departamento contrataciones deberá remitir a su vez, copia del acta de conformidad a la División Patrimonio, para su inventario.
Los mismos quedaran en poder del Comitente finalizada la obra.

B)Movilidad: NO SE REQUIERE

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 28º - **GASTOS DE INSPECCIÓN:** La inspección de la obra estará a cargo de de personal designado por el I.A.P.V, mediante Resolución de Directorio del Organismo, al que la Empresa deberá abonar durante el plazo de ejecución de la obra hasta la recepción provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jornada horaria de trabajo.-

ARTICULO 29º - **REDETERMINACION DE PRECIO DEL CONTRATO**

Para la redeterminación de precios del Contrato será de aplicación el Decreto Provincial Nº 2715/2016 MPIyS, Resolucion Directorio N°2059/2016 y su modificatoria Resolucion Directorio N°2285/2016.-

La obligación de los Oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación:

I.El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

II.Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

III.Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º del Decreto 2715/16 MPIyS

IV.El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.

Documentacion antes mensionada vinculada a la Tabla de Variacion de Costos publicados por INDEC.

ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista deberá presentar con 48 horas de anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la Repartición:

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá constituir un **seguro de idénticas características** para todo el personal designado por el Comitente para la Inspección.- Contratado con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos,

El incumplimiento por el contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultará al comitente a contratar dichos seguros a cargo de aquella y a descontar su costo de las certificaciones correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al CINCO (5%) POR CIENTO del valor del presupuesto oficial.-

ARTICULO 31.º - VARIANTES –

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

No se aceptarán variantes de ningún tipo en el Prototipo de Vivienda provisto por el Comitente, solo se exceptúa el tipo de fundación a adoptarse que podrá variarse de acuerdo a las indicaciones que surjan del estudio de suelo para este terreno. cuando se presente una variante técnica, el oferente deberá cotizar la oferta original y la variante.

ARTICULO 32º - ANTICIPO -

Se dispondr un Anticipo Financiero del 15% del monto de la oferta, a pagarse dentro de los 30 dias corridos posteriores a la firma del Contrato. El otorgamiento del anticipo para las obras de vivienda, infraestructura y complementarias, sera pagado una vez presentada la garantia por el monto del anticipo a favor del Instituto, mediante seguro de caucion o por alguno de los medios establecidos en el Articulo 4°Punto 3.3. del presente pliego. dicho Anticipo se amortizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al anticipo.

ARTICULO 33º - ACOPIO –

No se AUTORIZA Acopios

ARTICULO 34º - PROPUESTA TECNICA

Como la modalidad adoptada para la presente licitación es: **Proyecto Urbano y Precio propuesto por el Oferente y en cuanto al Proyecto del Prototipo es provisto por el Comitente**. El Proponente deberá aportar el respectivo Legajo de Proyecto de la Urbanización.

a)PROYECTO URBANO: Deberá contener como mínimo la siguiente documentación:

a-1 Técnica

Plano de Localización en escala 1/5000 o 1/10000 Plano de Mensura

Plano de Proyecto de Loteo (escala 1/500)

Plano de Relevamiento Planialtimetrico (escala 1/500) – Se trata de un plano con las cotas de niveles existentes del terreno, calles, bocas de registros,etc- todo referido a un PUNTO FIJO individualizado en el plano y en el lugar- Preferentemente el plano deberá contener valores de COTAS POSITIVAS (mayores a cero)

Estudio de Suelo - Deberán ser realizados por laboratorios y especialistas reconocidos en la materia. Los informes deberán estar firmados, sellados y en hojas con logotipo. Deberán contener la información solicitada en la Cláusulas Téc. Complementarias.-

Cálculo de la Fundación de los Prototipos de Viviendas - Deberá responder a lo solicitado en las Cláusulas Téc. Complementarias.-

URBANIZACIÓN (escala 1: 500)

Plano de Planimetría General de Urbanización – Corresponde a un plano donde se ubican las viviendas según su tipología y número dentro de los lotes respetando sus retiros de L.M. y numerando las mismas

Plano de Replanteo: Estará referido a los Ejes necesarios ya sea Principales y Secundarios a los efectos de ubicación de viviendas dentro del lote, calles, veredas, etc, como así mismo el replanteo propio de la unidad de vivienda ya sea su tipo de fundación adoptada (bases , plateas, etc)

Plano de Niveles o Nivelación Definitiva de terrenos - viviendas -veredas calles – Todos los niveles que figuren en este plano debe estar referido al mismo PUNTO FIJO del Plano de Relevamiento Planialtimétrico Plano de Detalles de urbanización (Ubicación de Muros de Contención, Cercos, Veredas, etc – Se indicará en este plano todas las referencias de detalles de urbanización.

INFRAESTRUCTURA (escala 1: 500)

Plano de Red de Agua – Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y responder a la factibilidad otorgada

Plano Desagüe Cloacal - Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y responder a la factibilidad otorgada – Las cotas que figuren en este plano deben estar relacionadas al mismo PUNTO FIJO del resto de la documentación, como así mismo la Cota de Intrados de la Boca de Registro donde conecta la red proyectada a los efectos de asegurar su correcto desagüe.

Plano de Escurrimiento Pluvial - Debe contener toda la información para su comprensión y agregado de detalles de ser necesarios.

Plano de Red de Energía Eléctrica - Debe responder a la factibilidad otorgada conteniendo toda la

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

información necesaria a los fines de presupuestarse los que no podrán ser distintos al proyecto definitivo a aprobarse por la Entidad Prestataria del Servio previo a su ejecución.
Plano de Alumbrado Público - Debe responder a la factibilidad otorgada y a los requerimientos municipales
Plano de Trama Vial (Perfiles y Tratamiento de la Calzada), Peatonales, Senderos, Estacionamiento - Plano de Red de Gas – Si existe red a ampliar - Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y responder a la factibilidad otorgada
Plano de forestación (con especificaciones de especies) - Debe responder a los requerimientos municipales
Plano de Detalles Constructivos necesarios: Elementos Urbanos (Muros de Contención y su cálculo correspondiente, cercos, vereda, etc), paquete estructural de calzada, badenes, cordones cunetas, desagües, etc. Todos a una escala adecuada para su comprensión

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

Se trata de las Especificaciones Técnicas de Infraestructura, obras complementarias según el proyecto aportado

Estructura de Ponderación: La presente obra tendrá como estructura de ponderación de los insumos principales segun lo dispuesto mediante resolucion de directorio N°:2059/16 y su modificatoria N°:2285/16.-

a- 2 Factibilidades de servicio:

Deberá ir acompañado de las siguientes factibilidades de Servicio:

1. Convalidación de localización y uso del suelo y visación municipal del proyecto: Certificado otorgado por el municipio aprobando el emplazamiento del conjunto habitacional y las pautas de uso del suelo establecidas. Dicha certificación deberá ser acompañada de un plano de "PLANTA URBANA" correspondiente ubicando el ó los terrenos ofrecidos. Asimismo deberá certificarse que el municipio ha visado los planos del proyecto correspondiente.

2. Certificación de factibilidad de provisión de agua potable: Croquis de ubicación y distancia a la red distribuidora, diámetro y material de la cañería existente, distancia al punto de conexión. Certificación otorgada por Obras Sanitarias Municipales o el Ente Prestatario del Servicio.-.

3. Factibilidad de eliminación de líquidos cloacales y conexión a la red cloacal existente: Croquis de ubicación y distancia al punto de enlace, materiales y diámetro de la cañería existente. Certificación estudiada y otorgada por Obras Sanitarias Municipales, o el Ente Prestatario del Servicio.-

4. Certificación de factibilidad de provisión de energía eléctrica: Otorgado por ENERSA o la Cooperativa que preste el servicio.

5. Certificación de factibilidad de alumbrado público: Otorgado por el Municipio.

6. Certificado de No Inundabilidad: Por el cual deberá demostrarse que no existen riesgos de eventuales Inundaciones del terreno por encontrarse por sobre la "cota de máxima creciente" ni por precipitaciones y desagües, etc. Otorgado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia.

7. Certificado de Libre de Ocupantes: que el terreno donde se proyecta construir el grupo habitacional, se encuentra libre de ocupantes. Otorgado por el Municipio.

8. Certificado de Accesibilidad Permanente: Certificada de accesibilidad permanente al terreno, para poder conectar el conjunto habitacional a la trama urbana existente (pavimento o mejorado). Otorgado por el Municipio.

9. Certificado de factibilidad y mantenimiento de los servicios urbanos: Otorgado por la Municipalidad, la que asumirá a su cargo los servicios de recolección de residuos,

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

conservación, barrido y limpieza de calles.

10. Certificado de Estabilidad de Barrancas: Otorgado por la Municipalidad
11. Certificado de libre Escurrimiento Pluvial: que asegure una rápida absorción de las aguas de lluvia, certificación a otorgar por el municipio.-

ARTICULO 35º - CONDICIONES DE DISEÑO

1 – PROTOTIPO DE VIVIENDA A UTILIZAR - RED DE AGUA Y DESAGÜES CLOACALES FRENTISTAS

1.1 Los oferentes deberán adoptar para estas obras el prototipo de viviendas que establece el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Techo Digno, del cual se adjunta legajo técnico, como Anexo II.
Para la cotización de las obras de viviendas se podrá tomar como base el Computo oficial de una unidad, que se adjunta, Se aclara él mismo corresponde a una unidad de viviendas apareada. El muro medianero se ejecutará en mampostería de ladrillos comunes de 0,30 metros de espesor, teniendo en cuenta que bajo ningún punto de vista se aceptará el sometimiento al régimen de propiedad horizontal a las unidades de viviendas
Fundaciones: En el caso que el estudio de suelos recomiende la ejecución de platea, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente conforme al pliego complementario de especificaciones técnicas y la misma formara parte de la propuesta.
No se aceptarán otras variantes constructivas.
Como la adopción del prototipo del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Techo Digno es obligatoria, NO se deberá presentar documentación técnica sobre el mismo, (únicamente el de fundación si ésta se modificara**)**

1.2 Red de distribución de agua: Se deberán proyectar y ejecutar las Ampliaciones de la Red de Distribución existente, correspondiente al servicio de la Localidad. Las mismas deberán permitir dotar de SERVICIO en forma “individual” a cada Lote o Unidad de Vivienda, mediante la correspondiente Conexión de Agua de ∅ 13 mm (se debe incluir Medidor de consumo).
El proyecto deberá ajustarse a las Reglamentaciones y Normas vigentes en el Ente Prestatario del servicio, organismo ante el cual se deberá realizar oportunamente la correspondiente Aprobación del mismo .

Red de desagües cloacales: Se deberán proyectar y ejecutar las Ampliaciones de la Red Colectora Cloacal existente, correspondiente al servicio de la Localidad. Las mismas deberán permitir dotar de SERVICIO en forma “individual” a cada Lote o Unidad de Vivienda, mediante la correspondiente Conexión de cloaca de ∅ 110 mm.
El proyecto deberá ajustarse a las Reglamentaciones y Normas vigentes en el Ente Prestatario del servicio, organismo ante el cual se deberá realizar oportunamente la correspondiente Aprobación del mismo.
Si por alguna razón no se contara con este servicio de desagüe cloacal se reemplazará por

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Pozos Absorbentes y Cámaras Sépticas.

2 - Lotes: Individual de superficie mínima de 200,00 mts2, con un frente mínimo de 9,00 mts. Se evitará el sometimiento al Régimen de Propiedad Horizontal

3 - Circulaciones y estacionamientos, accesibilidad:

En todos los casos los conjuntos deberán prever empalme directo al sistema vial existente y asegurar la continuidad y ancho de las mismas. La distancia máxima a recorrer desde el punto más alejado correspondiente a la circulación vehicular o estacionamiento, hasta la vivienda será de 50 metros. Ancho mínimo de peatonales de acceso a las viviendas 12 metros.

Estacionamiento:

– La superficie total del estacionamiento será de 1 módulo cada cuatro viviendas. La superficie por automóvil destinada a estacionamiento se calculará:

18 m2 cuando es por ensanche de calzada. 25 m2 cuando es por dársenas.

– En caso de localidades que posean ”Normas Municipales sobre estacionamientos”, se deberán respetar las mismas.

Peatonales: Las peatonales internas deberán prever el ingreso de servicios de emergencia (ambulancia, bomberos, etc.)

Espacios libres: Se deberá prever la reserva fiscal de espacios verdes, en el caso de que las reglamentaciones municipales lo previeran.

4 - Obras Complementarias de viviendas – Obras de Infraestructura Se entenderán por obras Complementarias de Vivienda, Obras de infraestructura, a las siguientes:

4.1 “Obras Complementarias de Viviendas”:

Movimiento de tierra de lotes: El movimiento de tierra que resulte necesario para adecuar los niveles del terreno natural a las cotas del proyecto definitivo de: terrazas de viviendas, calles, veredas, espacios verdes, y formación de taludes; comprende todos los trabajos de excavaciones generales, desmontes, terraplenamientos, rellenos, compactaciones y acarreos. En el Proyecto de nivelación se deberá contemplar el entorno para no producir situaciones conflictivas.

Cercos divisorios de lotes: Se deberán ejecutar en las divisiones entre lotes y entre los laterales de estos y la vía pública. Se ejecutaran en lugares indicados en el plano de Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en e la planilla de detalles correspondiente, en lo referido a las dimensiones y tipo de materiales, asegurando el perfecto tensado de los alambres, y fijación de los postes

Veredas reglamentarias o municipales: serán de acuerdo a los anchos establecidos por cada Municipio, o en su defecto de 1,00 m de ancho.

Para el diseño y niveles de veredas reglamentarias municipales se tendrán en cuenta los niveles de calles, por lo que seguirán las pendientes de éstas sin que se produzcan quiebres o saltos distintos a los de la calzada y a su vez no quedar por encima de los niveles de los terrenos de las viviendas.

Muros de contención: Se ejecutarán a partir de los 0,60 m de diferencia de nivel entre lotes o entre lotes y veredas municipales. Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo referido a las dimensiones y tipo de materiales.

4.2 "Obras de Infraestructura":
El tendido de las redes deberá efectuarse por vía pública, evitando en todos los casos generar servidumbre de paso.

Red de distribución de energía eléctrica: Las obras comprendidas en este tipo de proyectos serán destinadas para dotar de suministro de Energía Eléctrica a los conjuntos habitacionales, mediante redes de baja tensión a construir por parte de oferente. Podrán ser líneas aéreas por cables preensamblados o por conductores subterráneos.
Ambos sistemas se proyectarán y ejecutarán en un todo de acuerdo al reglamento para Proyectos de Distribución Secundaria de ENERSA, o del Ente prestador del Servicio que corresponda a la localidad.

Red de alumbrado público: El proyecto de Alumbrado Público se ejecutará de acuerdo a las reglamentaciones municipales vigentes.
La iluminación al centro de calzada será de 20 Lux de promedio y se utilizarán artefactos tipo calle, línea económica (marca Siemens 5 NA 567 o similar), con lámparas del tipo a descarga de gases (Mercurio, de alta presión, Sodio de alta y baja presión) de 150 o 250
W. en columnas de acero. El sistema de Alimentación se hará directa e individualmente desde la red y el sistema de Encendido será por fotocélula individual para cada artefacto.

Trama Vial: El Proyecto vial se elaborará de acuerdo a las Normas Viales vigentes, Municipales o Provinciales.
Una vez materializada la apertura de las calles, de acuerdo al proyecto de urbanización aprobado o visado por el municipio, se deberá realizar el perfilado y nivelación de las calzadas de circulación vehicular, que componen la trama vial, acorde con el proyecto de nivelación del barrio, garantizando un correcto escurrimiento de los desagües pluviales, los cuales serán conducidos a través de cunetas a cielo abierto o cordones cuneta de H° A° y badenes de H° A° en las bocacalles, según la existencia en el entorno. Otra condición que se debe cumplir es la transitabilidad permanente a través de las mismas y en todo tiempo, para lo cual se deberá realizar una compactación especial del suelo núcleo, se hara una subbase de brosa de 10 cm de espesor adecuadamente trabajada y compactada y sobre el mismo se ejecutará un mejorado de ripio, suelo calcáreo (broza) o material similar que más abunde en la zona, de 10 (diez) centímetros de espesor.
Otros: Comprende además Eliminación de aguas pluviales (en caso de necesidades) – Provisión de Gas (cuando exista servicio por red externa) – Forestación (cuando el municipio así lo exija).

ARTICULO 36º - REGIMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y PROPONENTES:

1 - Objeto y características de la evaluación:
Fijase en este pliego los indicadores y pautas en base a las cuales se efectuará la evaluación de proponentes y propuestas, con el objeto de establecer, por una parte, si aquellos proponentes que hubieren efectuado las ofertas más bajas de la licitación están calificados para resultar adjudicatarios de las obras que proponen y, por otra, si tanto los proyectos y demás elementos integrantes de su propuesta como, en su caso, los terrenos

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

involucrados en las mismas satisfacen los requerimientos normativos que rigen al respecto.
La evaluación comprenderá también la verificación del cumplimiento, por parte de todos los oferentes, de la totalidad de los requisitos de la presentación exigidos en los pliegos de la licitación, teniendo para ello en cuenta lo prescrito en el artículo 6º del P.G.C. Dicha evaluación se realizará en función de lo prescripto en el artículo 19º del Pliego General de Condiciones.

2 - Comisión técnica de evaluación: La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica de Evaluación que el comitente designará en cada ocasión y que se integrará con miembros que designará la presidencia. La designación y notificación de la Comisión deberá producirse dentro de los diez (10) días de efectuada la recepción de las propuestas, debiendo la misma expedirse en un plazo máximo de veinte (20) días de notificada su designación.

3 - Metodología de evaluación y requisitos mínimos

En el transcurso de la evaluación, la comisión podrá, en los casos que correspondiere, citar al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de mérito para requerirle la adecuación de aquellos aspectos no esenciales de su propuesta técnica que, sin constituir transgresiones formales a las normas que rigieren al respecto, no resultaren totalmente satisfactorios para la misma, debiendo las observaciones estar subsanadas a juicio de la Comisión, previo a emitir el informe final de evaluación que aconseje la adjudicación.
Si al solo juicio del Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta haya sido calculada como la más conveniente, presentare una porcentualización incorrecta o desequilibrada, se citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la porcentualización establecida por el Organismo Ejecutor. Si aquel se negare el Organismo Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga en orden de mérito.

4 - Evaluación de las Propuestas Técnica: La evaluación de las propuestas se realizará, en general, para verificar su ajuste a las normas que rigen para las mismas, y en particular para constatar que, en los casos de proyectos aportados por el proponente, se cumplan las siguientes condiciones:

a) Proyecto Urbano: Se evaluará la documentación presentada de acuerdo a lo indicado en los pliegos.

b) Cumplimiento de normas de diseño: Se verificará si los proyectos urbanos satisfacen las normas de diseño que establezcan las normas incluidas en los pliegos.

c) Cumplimiento de normas sobre superficies: Se verificará si los proyectos urbanos satisfacen las normas sobre superficies mínimas requeridas con referencia a los lotes y superficies libres incluidas en los pliegos, rechazándose los proyectos que no cumplieren las mismas.

c)Conformación del presupuesto: En su evaluación se tendrá en cuenta que si al solo juicio del Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta haya sido calculada como la más conveniente, presentare una porcentualización incorrecta o desequilibrada, se citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la porcentualización establecida por el Organismo Ejecutor. Si aquel se negare el Organismo Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga en orden de mérito.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

5 - Calificación de las empresas: La calificación de las empresas para ejecutar las obras a adjudicar se efectuará evaluando sus capacidades empresaria, técnica y económica-financiera.
6 - Informe de Evaluación: Como conclusión de su dictamen de evaluación la Comisión Técnica mencionada en 2 aconsejará al Directorio la adjudicación de la obra de vivienda y, de las obras infraestructura y complementarias de las viviendas.
La adjudicación será por la obra completa, no admitiéndose la adjudicación sólo de Obras de Viviendas o solo de las Obras de Infraestructura, Complementarias.
El informe de evaluación de la Comisión Técnica es un acto preparatorio y no generará obligación alguna para el comitente frente al proponente de que se trate.

Dentro de dicho Informe deberá contar con:

A) ANALISIS NOTARIAL:
B) ANALISIS LEGAL:
C) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO:
D) ANALISIS TÉCNICO
E) PLANILLA RESUMEN DE PUNTAJE – Cuyo modelo se encuentra a continuación y es de aplicación del Artículo 19º del Pliego General de Condiciones –Decreto 4381/88 y Normas Complementarias.

	CONSIDERACIONES	LISTADO DE PUNTAJE
a	Monto de la propuesta	1 a 40
b	Equipo Propuesto	1 a 10
c	Plan de Trabajo - Curva de Inversiones	1 a 15
d	Análisis de Precios	1 a 10
e	Personal Obrero, Administrativo y Profesionales propuestos	1 a 5
f	Relación Laboral Social-Antecedentes (D.P.T.)	1 a 5
g	Antecedentes Empresarios (Reg.de Contratistas.O.P.)	1 a 10
h	Otro que la Comisión Considere	1 a 5
		subtotal (1)
i	Si la firma es provincial	20% de a
		subtotal(2)
	TOTAL	(1) + (2)

Dicha planilla es el resumen del análisis siguiente:

a) EVALUACION DE LOS MONTOS DE LAS OFERTAS
Puntajes según el monto de la Oferta respecto al Presupuesto actualizado a esa misma fecha.

% de la Oferta por encima del Presupuesto Oficial	Puntaje s/Art. 3º inc a) Decreto 4381/88		% de la Oferta por encima del Presupuesto Oficial	Puntaje s/Art. 3º inc a) Decreto 4381/88
0	40,00		16	19,20
1	38,70		17	17,90
2	37,40		18	16,60
3	36,10		19	15,30
4	34,80		20	14,00
5	33,50		21	12,70
6	32,20		22	11,40
7	30,90		23	10,10
8	29,60		24	8,80
9	28,30		25	7,50
10	27,00		26	6,20
11	25,70		27	4,90
12	24,40		28	3,60
13	23,10		29	2,30
14	21,80		30	1,00
15	20,50		>30	1,00

b) EQUIPO PROPUESTO
El valor actualizado del equipo que el oferente propone deberá cumplir la siguiente condición:
VALOR EQUIPO $\geq$ $\frac{\text{Presupuesto oficial}}{20}$

c)PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES (Puntaje de 1 a 15)
El puntaje será establecido según la presentación del Plan de Trabajo y Curva de Avance como así mismo del Plan y Curva de Inversiones.

d)ANALISIS DE PRECIOS (Puntaje de 1 a 10)
El puntaje será establecido según su presentación tanto en faltantes como en su conformación.

e)PERSONAL OBRERO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES PROPUESTOS EN EL PLANTEL ESTABLE DE LA EMPRESA (Puntaje de 1 a 5)
El puntaje será establecido según su presentación

f- g) INFORMACION SOLICITADA RESPETO DEL OFERENTE
1) Solicitud de puntaje a la Dirección Provincial del Trabajo.
2) Solicitud de puntaje a la Dirección General de Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos.

h) OTROS INFORMES (Puntaje de 1 a 5)
De acuerdo a información obtenida dentro de la repartición u otros entes respecto al comportamiento, antecedentes y concepto de Obras ejecutadas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ARTICULO 37º - ADJUDICACION Y CONTRATO

1 - Adjudicación del contrato: El comitente formalizará mediante la correspondiente resolución de Directorio, la adjudicación de la obra.

La notificación de la adjudicación se diligenciará dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga, sin exceder de los cinco (5) días, corridos de resuelta la licitación. La notificación se hará en forma fehaciente en el domicilio constituido, agregándose al expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia.

2 - Documentación y trámites a cargo del adjudicatario:

a) En los casos en que el terreno y/o el proyecto de la obra fueren proporcionados por el proponente - adjudicatario éste deberá proceder, dentro de los veinte (20) días corridos de notificada la pertinente **resolución de adjudicación**, a formalizar por ante la Escribanía Mayor de Gobierno la correspondiente escritura traslativa de dominio del terreno a favor del comitente teniendo en cuenta que el pago del mismo se efectuará según lo previsto en el "pago del terreno" del presente pliego.

En el mismo instrumento por el que se transferirá el dominio del terreno el adjudicatario hará cesión en donación de la documentación técnica del proyecto, pudiendo insertar en dicho documento el cargo de que ambas cesiones se efectúan condicionadas a que la obra correspondiente se inicie dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días de suscripta dicha escritura. En dicho documento deberá constar asimismo la asunción, por parte del adjudicatario, de la responsabilidad emergente de la encomienda profesional respectiva.

b) Asimismo, la Documentación Técnica del proyecto que fuere proporcionado por el contratista, éste deberá suministrar al comitente, la documentación Técnica en soporte magnético, dentro de los diez (15) días de notificada la Resolución de adjudicación, mas 5 (cinco) juegos completos de los planos y planillas que conformen la documentación técnica del proyecto

3- Plan de trabajo y curva de inversiones: El plan de trabajo y programa de inversiones definitivos que regirán el desarrollo de la obra, será presentado dentro de los veinte (20) días corridos a partir de la notificación de la adjudicación.

El contratista presentará al Organismo Ejecutor respectivo para la aprobación, el plan de trabajo y el programa de Inversiones definitivos, a los que deberá ajustarse la ejecución de acuerdo al inicio de obra y que aprobará en el término de veinte (20) días corridos de su presentación. El Organismo Ejecutor solo podrá modificar esos planes cuando técnicamente pudieren perjudicar a la obra, interrumpir cualquier servicio público o alterar el desarrollo de los trabajos.

4 - Firma del contrato: La contrata se suscribirá dentro de los treinta (30) días corridos de efectuada dicha notificación, según modelo adjunto a este Pliego.

5 - Garantía del contrato: Previamente a la suscripción de la contrata el adjudicatario deberá presentar ante el comitente, dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación de la obra, la garantía de contrato prescripta en el articulo 32º del P.G.C.

6 - Documentos del contrato - Orden de prelación: En caso de discrepancia en la documentación contractual, primará el orden establecido en el Articulo 23º del Decreto Reglamentario Nº958/79 de la Ley de Obras Públicas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

7 - Rescisión del contrato: Se regirá por lo preceptuado en el Capitulo VII del P.G.C.

ARTICULO 38º DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Conocimiento del terreno: El adjudicatario de la obra no podrá solicitar adicional alguno aduciendo desconocimiento del terreno en el caso en que sea aportado por el municipio o sea propuesto por él. La presentación en la licitación implica, por parte de la oferente del conocimiento del terreno, niveles, características del mismo, etc.

Normas de ejecución: La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de licitación y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del contrato. Bajo ningún pretexto podrá el contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos, salvo expresa autorización de la inspección impartida por escrito. Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados, sin derecho a reclamación alguna por el mismo.

Colocación de letrero de obra: Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y características que se especifican en el Modelo propuesto, en los Anexos.-

Gastos a cargo del Contratista: Estarán a cargo del contratista los siguientes casos:

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad, como empresa constructora que tengan relación con las mismas. El contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

b) Los originados por la provisión del agua de construcción, energía y alumbrado de la obra.

c) Los de los insumos que demande el funcionamiento y mantenimiento de la oficina de la inspección en sus distintos rubros (energía, teléfono, papelería, etc.)

Vigilancia, alumbrado y cerramiento de la obra: El contratista deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra, hasta su recepción definitiva, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas del comitente o de terceros. La entrada al obrador será custodiada durante el día y cerrada durante la noche. El contratista colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación que permita hacer efectiva la vigilancia y tomará medidas precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situación hicieran temer accidentes durante el transcurso de la construcción. El cerramiento de la obra se extenderá a todo su perímetro y deberá proveer adecuada seguridad. Adicionalmente, el Contratista deberá establecer en la obra, desde la colocación de los techos de las viviendas y hasta la recepción provisoria da las obras, vigilancia policial permanente a razón de un policía por cada 50 viviendas, como mínimo. **Locales de acopio de materiales:** No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir su consistencia o duración o sufrir en aspecto. En ese aspecto el CONTRATISTA deberá construir locales bien al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. Los locales para cables, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán piso de tablones, aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instalaciones sanitarias para el personal obrero: Si en la localidad en la que se van a realizar las obras, no hubiera una red pública de cloaca, o en el recinto de las mismas no existiera ya una instalación adecuada, el CONTRATISTA deberá construir provisoriamente un inodoro a la turca con desagüe a pozos negros excavados ex profeso, dos (2) mingitorios y un (1) lavabo por cada veinte (20) hombres del equipo. Deberá mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.

Agua para la construcción: La provisión de agua para la construcción será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, cualquiera sea su forma de obtención.

Calidades de los Materiales: Los materiales, en general, serán de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructuras y calidades, deberá recabarse la conformidad de la Inspección.-

La presentación de muestra de materiales y/o elementos que se incorporarán a las obras, se someterá a la aprobación de la Inspección, a cuyos efectos se habilitará, en la casilla respectiva, en lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia de responsabilidad de “El Contratista”. -

Marcas y envases de los Materiales: Todos los materiales envasados, lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la aprobación en el rótulo respectivo.-

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo “El Contratista” retirarlo de inmediato de la obra.-

Limpieza de obra: Será responsabilidad del contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para facilitar el desarrollo de los traba]os y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos. La obligación comprenderá a todos los ámbitos de la obra, incluido el local u oficina de la Inspección.

Libro de órdenes de servicio: Las órdenes de servicio que la inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas en un libro por triplicado, sellado y rubricado por el comitente, que la inspección guardará en la obra y cuyas enmiendas y raspaduras deberán salvarse.

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el comitente o su representante técnico dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de librada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de incumplimiento de las órdenes de servicio, considerándoselo además como notificado. La inspección deberá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aún cuando el contratista considerare que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato deberá notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la inspección y en el término do cinco (5) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamaciones que presentare por tal motivo. La observación del contratista opuesta a cualquier orden de servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del contratista, además de hacerlo pasible de la multa antes mencionada, facultará al comitente para mandar a ejecutar, en cualquier momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y, en caso necesario, del fondo de reparos.
El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación hará incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades correspondientes.
Libro de notas de pedido: Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable de su conservación. Las notificaciones correspondientes deberán formalizarse en el mismo plazo que las de órdenes de servicio.
Libros de actas y partes diarios: La inspección llevará también un libro foliado por duplicado donde asentará diariamente los movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a la misma, el número de operarios ocupados o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos. En dicho libro se labrarán también las actas que tanto la misma inspección como el contratista consideraren necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la obra.
Documentación a mantener en obra: El contratista mantendrá en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos, y será responsable de su conservación en buen estado hasta la finalización de la obra. Deberá asimismo mantener en la obra, a disposición de la inspección, las constancias del pago de los aportes previsionales del personal afectado a la misma.
Actualización del plan de trabajo: El comitente exigirá la reprogramación del plan de trabajo aprobado para la obra toda vez que los trabajos presenten el desfasaje imputable al contratista que a su exclusivo juicio haga aconsejable tal medida. En ese caso se exigirá al contratista la presentación de un plan de trabajo para el período faltante, que permita recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su plazo contractual, como así también la de un plan de inversiones reales para el período considerado aunque a todos los efectos contractuales seguirá vigente el plan de trabajo aprobado originalmente.
Las reprogramaciones del plan de trabajos e inversiones que exija el comitente serán presentadas dentro de los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los cuarenta (40) días corridos de solicitadas, reservándose el comitente para su revisión y aprobación un plazo de (7) días corridos.
Si al cabo de los cuarenta (40) días las reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya sea por no haber sido presentadas o porque su presentación mereciera reparos que no fueron solucionados, el comitente podrá confeccionarlas de oficio, resultando obligatoria al contratista su aplicación sin derecho a reclamo alguno.
Ajuste del plan de inversiones: Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de las inversiones reales a precios básicos superpuesto al que rige contractualmente, corregido por prórrogas del plazo de ejecución si las hubiera..
El comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista y podrá rescindir el contrato por culpa del

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

contratista si la inversión resultara, en un momento dado y sin causa justificada, inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de la prevista en el plan vigente.
Si el contratista se adelantara al plan de trabajo y la Inversión excediera la prevista en más del diez por ciento (10%) el comitente podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inversiones aprobado.
Ensayos: El comitente podrá exigir la realización de todos aquellos ensayos que estime necesarios para comprobar si los materiales, estructuras o partes componentes de cualquier clase cumplen los requerimientos establecidos en los pliegos, reglamentos pertinentes y Certificados de Aptitud Técnica (C.A.T.). El personal y los elementos necesarios a tal fin serán facilitados y costeados por el contratista, quien deberá además abonar cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios que indique el comitente para verificar la naturaleza y condiciones de cualquier material o estructura.
Vicios en los materiales, trabajos y obras: Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles la inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.
El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido revisados por la Inspección y avisará con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de no hacerlo, la inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista, exclusivamente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fijare, a contar desde la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplirse lo ordenado, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente y por terceros a costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de reparos. La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del comitente de exigir resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco liberará al contratista de las responsabilidades que determine el Código Civil y Comercial de la Nación.

Fotografías: El contratista deberá proveer a su cargo, bimensualmente y en cantidad suficiente a juicio del comitente, fotografías de 18 x 24 cm, tomadas desde los mismos focos, secuencialmente, que destaquen en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos efectuados en ese lapso. El primer juego de fotografías corresponderá al terreno en ocasión de su entrega y con el se entregará un plano de conjunto donde se consignarán los puntos desde los que se tomaron las fotografías y los ángulos abarcados por las mismas.
Cumplimento de obligaciones laborales: El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Estará además obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copias de los mismos que permitan acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el comitente u otra autoridad competente, tanto en relación a su propio personal como al del subcontratistas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Toda infracción al cumplimento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y facultará al comitente para suspender la tramitación y pago de los certificados de obra.

Cumplimiento de obligaciones previsionales: El comitente verificará, además del cumplimiento de los aportes previsionales que el contratista debió acreditar en su presentación en la licitación, el cumplimiento del pago de dichos aportes durante la ejecución de las obras respecto de todo el personal afectado a las mismas, no pudiéndose abonar certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificación.

Subcontratos: El contratista no podrá subcontratar la obra sin previa y expresa autorización del comitente en tal sentido. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 43 del Decreto 958/79 SOySP y la inscripción en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de aquellos subcontratistas, en quienes el contratista deseare delegar la ejecución de partes completas de la obra, tales como, por ejemplo, grupos de viviendas u obras completas de infraestructura o equipamiento. **Cambio de Razón Social:** Para el caso que la Contratista u Oferente cambie de Razón Social deberá ser comunicado inmediatamente al I.A.P.V. acompañado de la documentación respectiva para su evaluación y posterior aprobación por Resolución de Directorio.

Caso contrario se suspenderá emisión y pago de Certificados, hasta tanto se evalúe dicho cambio.

Modificaciones de obra: Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el comitente, se regirán por lo dispuesto en el P.G.C.

ARTICULO 39º MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

Normas de medición: Tratándose de obras a contratar por el sistema de ”ajuste alzado” la medición a efectuar en cada período de ejecución tendrá por objeto establecer el porcentaje realizado en cada ítem respecto del total calculado en el cómputo del presupuesto, en base al cual se certificarán las obras. De tal modo el total de obra acumulada así establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el período inmediato anterior, determinará el porcentaje de obra ejecutado para cada ítem en el período de que se trate, porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho ítem en el presupuesto según el cual se certificarán las obras, determinará por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

Medición, certificación y pago de las obras

A los fines de su certificación la inspección efectuará la medición de los trabajos realizados en los períodos respectivos el último día hábil del mes, y en base a la misma, confeccionará o visará el correspondiente certificado de obra. El comitente abonará dichos certificados dentro de los sesenta (60) días corridos posteriores al día de medición. A pedido de la Contratista, la Comitente podrá abonar los certificados de obra con anterioridad a la fecha tope indicada precedentemente, practicando un descuento que se calculará aplicando la tasa vigente a esa fecha para el cálculo del interés por mora en el pago de certificados de obra pública, en el orden provincial. Si, en cambio, el comitente incurriere en mora en el pago de los mismos será de aplicación lo establecido en el artículo 63º del P.G.C. A los efectos de la certificación deberá tenerse presente lo establecido en el artículo 61º del P.G.C., además de lo prescrito en el Capítulo VI de las mismas. En caso de disconformidad del contratista con la medición o correspondiente

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

certificación realizada por la inspección y sin perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el comitente extenderá igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiere, el ajuste pertinente o postergando para la liquidación final el ajuste de las diferencias que existieren. El certificado de liquidación final deberá librarse dentro de los treinta (30) días corridos de terminada la obra o de suscrita el acta de recepción provisoria de la misma. La disconformidad del contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, que deberá ser formulada por el mismo dentro de los cinco (5) días corridos de notificado de aquella, no trabará el trámite de pago de la citada certificación, según ésta hubiere sido confeccionada por el comitente, sin perjuicio de la resolución que recayere sobre dicho reclamo.

El Pago de los certificados: Se realizará en la Cuenta corriente habilitada a nombre de la empresa.

Ante la falta de presentación de Impuestos y de las Pólizas de seguro correspondientes notificados por este Organismo, la omisión precitada imposibilitará la emisión de los Certificados, sin necesidad de notificación.

Fondo de reparos: El fondo de reparos a constituir según lo prescrito en el artículo 62º del P.G.C. se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5%) de cada certificado, excepto los de intereses. El importe retenido en concepto de fondo de reparo podrá ser sustituido por los mismos medios previstos en el P.G.C.

ARTICULO 40º DEMORAS EN EL PAGO POR INCUMPLIMIENTO

El Contratista no tendra derecho a efectuar ningun tipo de reclamo por cualquier demora que se produzca en los desembolsos por parte de la Administracion Nacional y por Consiguiente en el pago de los certificados por parte de la Administracion Provincial.

ARTICULO 41º DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Las recepciones de las obras según correspondan (provisoria o definitiva), se efectuarán en las formas y circunstancias establecidas en el Pliego General de Condiciones - Capítulo VII - De la Recepción y Conservación, Artículos 64, 65 y 66. Cuando previa consideración y acuerdo se lleven a cabo recepciones provisorias "parciales", consecuente a ello, en tiempo y forma correlativas, tendrán lugar y se efectuarán las recepciones definitivas "parciales" de las partes de las obras involucradas en tal concepto.

Entrega de vivienda prototipo: Con una antelación mínima de treinta (30) días respecto de la fecha estimada para la recepción provisoria de la obra, parcial o total según correspondiera, el contratista deberá hacer entrega a la Inspección, para su utilización como modelo o muestra de terminación de las restantes unidades, de una vivienda prototipo totalmente ejecutada según los requerimientos de los pliegos, quedando la misma a partir de entonces bajo el control de la Inspección.

Recepciones parciales: Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en este pliego, el comitente podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar, asumiendo en tal caso la responsabilidad prevista en el articulo 65º del P.G.C.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Recepción provisoria: La recepción provisoria de las obras se realizará según lo previsto en el P.G.C. A partir de la fecha del acta de recepción provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, que se extenderá por seis (6) meses lapso en el cual el contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones que se quieren en dicha acta, como así también por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
Recepción definitiva: La recepción definitiva de las obras se efectuará en la forma y circunstancias indicadas en el P.G.C. Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.
Trabajos pendientes: Al realizarse la recepción provisoria de las obras, podrán evaluarse y considerar que quedaren pendientes, además de aquellos trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de completamiento de detalles que bajo ningún aspecto imposibiliten la "normal habilitación y funcionamiento a sus fines de la obra", los planos conforme y finales de obras respectivos que los Organismos competentes o la Inspección requiriesen, ello tanto por obras de arquitectura (vivienda y conjunto), como de las instalaciones internas y externas, como de obras de infraestructura y como también de las Mensuras aprobadas que correspondan (propiedad individual o en propiedad horizontal), según criterios que el Contratista deberá requerir al Comitente en tiempo y forma oportuna, a través de la Inspección designada por el Comitente.- Para la consideración de planos conformes, finales de obra y Mensuras, que podrán quedar pendientes, será condición indispensable que la Contratista acredite haber efectuado ante los Organismos competentes, todas las tramitaciones, presentaciones y obtenido las aprobaciones reglamentarias que correspondan a la ejecución y desarrollo de las distintas partes de obras contratadas, como así mismo se aporte la certificación de Ingreso de Mensuras a su aprobación, extendida por la Dirección de Catastro de la Provincia.-
Tanto los trabajos de reparaciones o de documentaciones conformes y de finales de obra que se puedan considerar pendientes al momento de la Recepción Provisoria, deberán ser cumplimentados en un plazo (estipulado en el Acta de recepción) que no podrá exceder los noventa (90) días desde la fecha de dicha recepción.-
Para su plena vigencia y efectos, las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva que se establezcan entre la Representación Técnica de la Contratista y la Inspección de obra designada por el Comitente, corresponderán ser ratificadas por la Resolución Administrativa pertinente del Organismo Comitente - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Presidencia de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Manual de uso/ Carteles de obras

Presidencia de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ESTÉTICA:
Respetar el mismo diseño y esquema en todos los carteles refuerza la consistencia del mensaje y mejora la comunicación.

TITULAR:
Siempre será el mismo: **“Juntos estamos avanzando”.**

IMAGEN:
Las imágenes que se acompañan han sido utilizadas solamente como referencia. Siempre que sea posible, mostraremos imágenes de personas reales trabajando en equipo en una obra real, para dar a nuestras piezas una mayor credibilidad. En ausencia de foto, también se podrá utilizar un render 3D de la obra.

MATERIALES:
Las aplicaciones sobre lona serán siempre el material de preferencia, y solamente se recurrirá a chapa pintada ante condiciones climatológicas adversas.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

1/Carteles de obra

Todos los carteles de obra, están sujetos a validación, para ello deberán ser enviados a las siguientes casillas: **carteleshabitat@gmail.com** ó **cartelesvivienda@gmail.com** donde el área de comunicación de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, aprobará su diseño para su posterior impresión. Cualquier consulta podrá ser enviada a dichos mails.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Carteles de obra

Elementos compositivos

Características

carteles para OBRAS NUEVAS

MEDIDA SUGERIDA : 4,80 mt. x 2,60 mt

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Foto
72 dpi como mínimo pero a tamaño real

Claim
"Juntos estamos avanzando"
Tipografía Gotham Bold
C 85 M 30 Y 0 K 0

OBRA / DESCRIPCIÓN
TIPOGRAFÍA GOTHAM BOLD
TIPOGRAFÍA GOTHAM BOOK
El zócalo blanco de la descripción debe ser del largo de frase.



Marca Presidencia

Título
Obra, Localización
Tipografía Gotham Bold

Datos Legales
Título
Tipografía Gotham Bold
Contenido
Tipografía Gotham Book

Logos a una tinta C 85 M 30 Y 0 K 0
Respetando la ubicación de derecha hacia izquierda en orden de importancia

Zócalo logos (si hubiere, sino desaparece).
C 0 M 0 Y 0 K 0

Firma del Ministerio
TIPOGRAFÍA
GOTHAM MEDIUM

Zócalo lado derecho
C 85 M 30 Y 0 K 0

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Carteles de obra: Subsecretaría de Hábitat

Convivencia con otras marcas

Características



Organismo de Financiamiento (SI HUBIERE)

Unidad Ejecutora Municipal

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Carteles de obra: Subsecretaría de Hábitat

Convivencia con Gobiernos Provinciales

Características



Organismo de Financiamiento (SI HUBIERE)

Unidad Ejecutora Municipal

Unidad Ejecutora Provincial

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Carteles de obra **Subsecretaría de Vivienda**

Convivencia con otras marcas

Características



Unidad Ejecutora
Municipal

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Carteles de obra: **Subsecretaría de Vivienda**

Convivencia con Gobiernos Provinciales

Usos de logos

Las Provincias que pertenezcan al Plan deberán colocar el logo

Logo
Plan Belgrano

Si es necesario se aplica un gradient de negro a blanco en "Multiply" sobre la foto para que el logo tenga contraste.



Unidad Ejecutora
IPV

Unidad Ejecutora
Provincial

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Lonas de obra





IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Lonas de obra

Aplicación




IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos


Referencia de color

CMYK



85-30-0-0 | 0-0-0-85 | 0-0-0-100 | 45-0-100-0

PANTONE



2925 C | Cool Gray 11 C | Black C | 382 U

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

2/**Licitaciones**

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Licitaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación.

2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales y otros elementos requeridos para efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora la idea y toda la propuesta para ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.

3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.

4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios. Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos.
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente.
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior.
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones.

5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006.


6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.

7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta el 27 de julio de 2016 a las 14 hs.

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

Presidencia de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

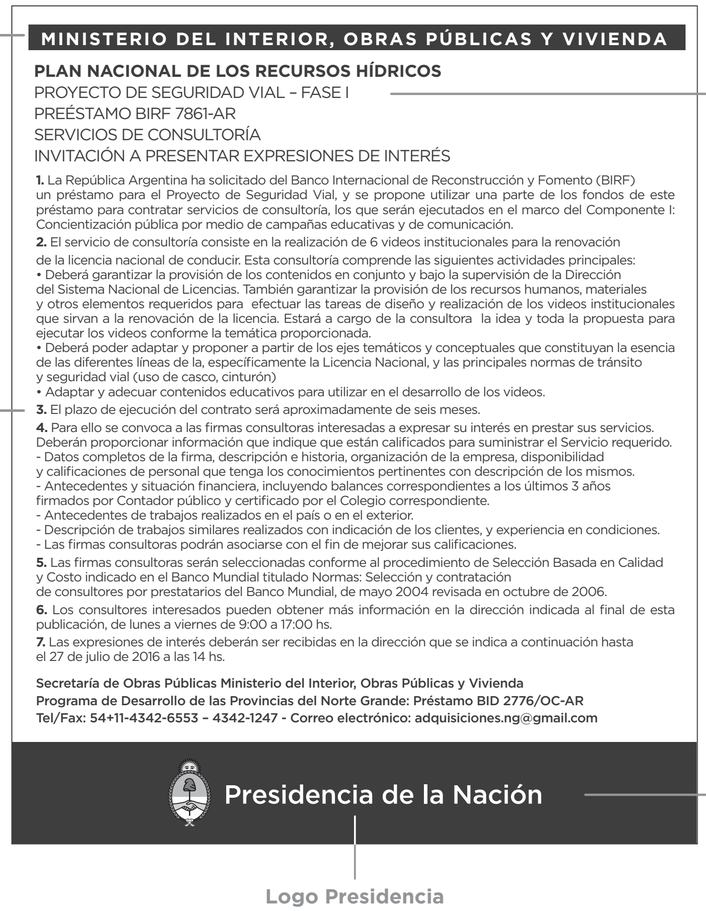


IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Licitaciones

Inclusión de segunda marca o logo

Características

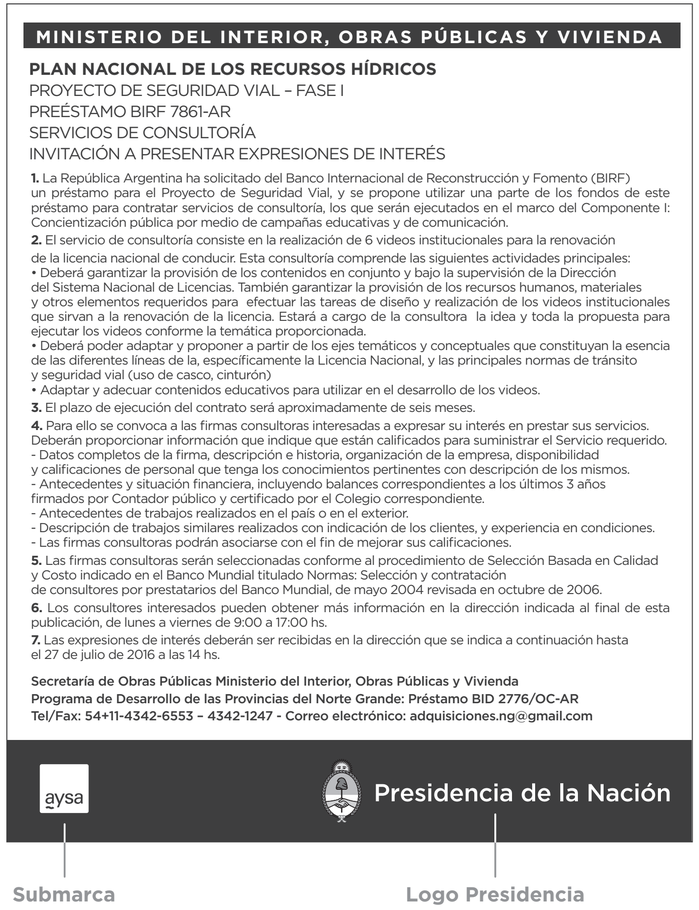

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación.

2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales y otros elementos requeridos para efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora la idea y toda la propuesta para ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.

3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.

4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios. Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos.
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente.
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior.
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones.

5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006.

6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.

7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta el 27 de julio de 2016 a las 14 hs.

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

aysa

Presidencia de la Nación

Submarca

Logo Presidencia

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Licitaciones

Inclusión de tercera marca o logo

Características

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación.

2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales y otros elementos requeridos para efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora la idea y toda la propuesta para ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.

3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.

4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios. Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos.
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente.
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior.
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones.

5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006.

6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.

7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta el 27 de julio de 2016 a las 14 hs.

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

aysa — Plan Belgrano — Presidencia de la Nación

Submarca — Submarca — Logo Presidencia

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

2b/**Licitación con foto**

Aviso

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Licitación con foto

Características

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold
C 85 M 25 Y 0 K 0


Datos técnicos I
Tipografía Gotham Medium / Book
C 80 M 30 Y 0 K 0

Foto o Render

Claim "Juntos estamos avanzando"
Tipografía Gotham Bold
C 85 M 25 Y 0 K 0

Datos técnicos II
Tipografía Gotham Medium / Book
C 0 M 0 Y 0 K 90

Logo del ente autárquico o submarca

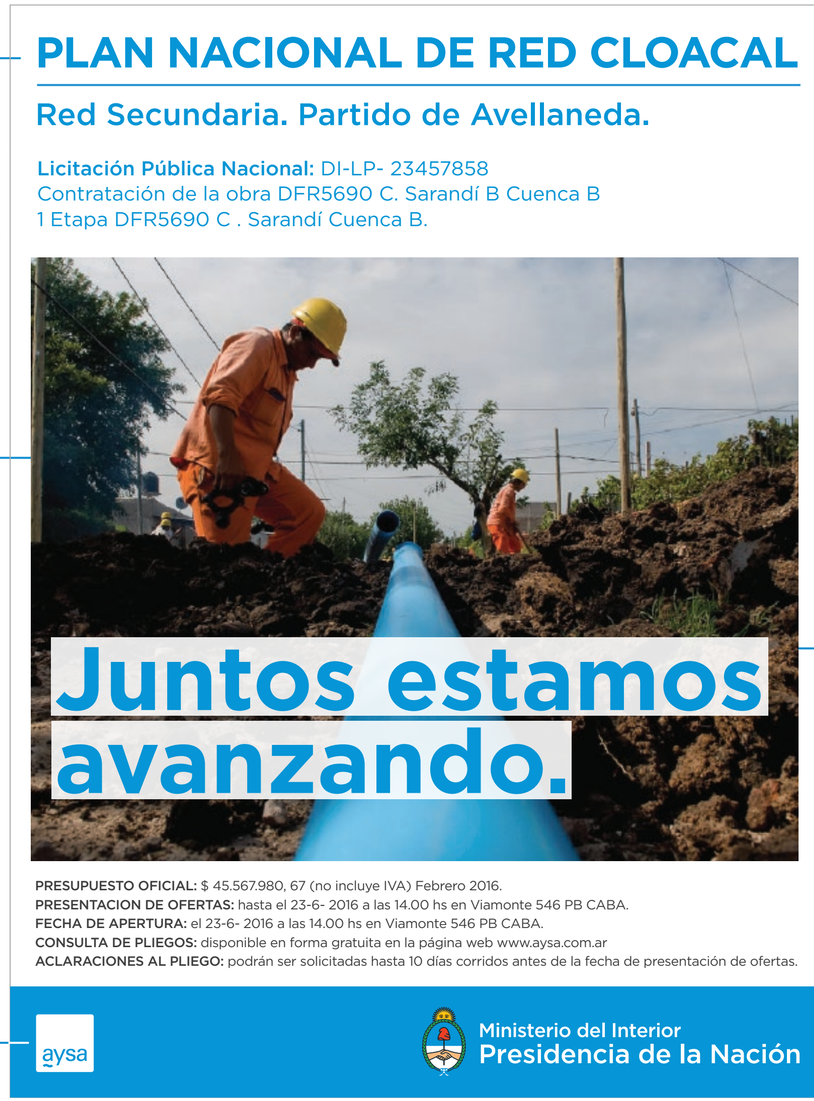

Zócalo contenedor del claim

Zócalo
C 85 M 25 Y 0 K 0

Marca Presidencia + Ministerio

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

3/Anexo/Plan Belgrano

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Logotipo

Aplicación principal



IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV











IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Logo Plan Belgrano

Aplicación en carteles de obra

Las Provincias que pertenezcan al Plan deberán colocar el logo

Logo
Plan Belgrano

Si es necesario se aplica un gradient de negro a blanco en “Multiply” sobre la foto para que el logo tenga contraste.



Unidad Ejecutora
IPV

Unidad Ejecutora
Provincial

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Logo Plan Belgrano

Aplicación en licitaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL BICENTENARIO

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA DEL NORTE GRANDE
PRÉSTAMO BIRF 7992-AR PLAN BELGRANO

CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Pedido de Propuestas: UEP-7992-08/2016
La República Argentina, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaria de Recursos Hídricos, ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para el financiamiento parcial del Proyecto Infraestructura Hídrica del Norte Grande, Préstamo BIRF 7992-AR, y se propone utilizar una parte de los fondos de este Préstamo para gastos elegibles en el marco del Programa.
Los trabajos que deberá brindar la firma comprenden la realización de un PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTION INTEGRADA Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. Esto consiste en elaborar un Plan Hídrico Provincial para el uso y aprovechamiento del agua con enfoque en subcuencas prioritarias a fin de dar soluciones técnicas alternativas de carácter estructurales y no estructurales. Se incluirán estudios para actualizar la información sobre subsistemas hídricos y la determinación de los niveles de riesgo de inundaciones y su mapeo.
La firma seleccionada realizará, las que se enumeran a continuación:
• **ESTUDIO DE CUENCAS**
• **EVALUACIÓN DEL MANEJO DE EXCEDENTES**
• **ECONOMÍAS PRODUCTIVAS**
Se estima un período de ejecución del contrato de 10 meses.
La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE) del Ministerio del Interior, obras Públicas y Vivienda, Secretaria de Obras Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, invita a las firmas elegibles a expresar su interés en prestar los trabajos solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los trabajos requeridos. Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes:
• Antecedentes y Experiencia de la Firma: deberá acompañarse antecedentes generales y específicos de la firma en inspecciones de obras de infraestructura hidráulica y de drenaje urbano en los últimos diez (10) años, indicando: nombre del proyecto y descripción del trabajo realizado, lugar, duración del trabajo (meses), monto aproximado, entidad contratante y datos actualizados de contacto, equipo de trabajo asignado, organigrama de la firma consultora y breve descripción de los antecedentes profesionales del personal miembro de la consultora.
• **ANTECEDENTES JURÍDICO-ESTATUTARIOS:** Deberá indicarse el nombre o razón social, domicilio legal, año y país de constitución de la firma, datos sobre inscripción por ante el organismo registral competente, remitiendo además, acta constitutiva de la/s empresa/s. En caso de unión transitoria de empresas, consorcio o similar, deberá enviar comprobante de intención de conformar una unión temporal e informar sobre las firmas con las que se articulará, indicando el porcentaje de participación de cada uno de los miembros integrantes e identificando qué firma será la Representante de la asociación en participación por ante el Comitente. Indicar nombre del representante legal y adjuntar poder de representación.
• **ANTECEDENTES FINANCIEROS:** Deberá remitirse los tres (3) últimos balances y la facturación promedio mensual de los últimos tres (3) años de la firma.
Las expresiones de interés de los interesados es requerido bajo el párrafo 1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial de Mayo de 2004, versión revisada en Octubre de 2006 y Mayo de 2010, referente a la política de conflicto de interés del Banco Mundial.
Las firmas se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones.
Las firmas serán seleccionadas en base al método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) descrito en las Normas de Consultoría.
Las expresiones de interés deberán prepararse en idioma español.
Las firmas interesadas podrán obtener información adicional en la dirección indicada al pie de este aviso, durante días hábiles en el horario de 10:00 a 17:00 horas, como asimismo, a la siguiente dirección de correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com.
En la página web de la Unidad: www.ucpypfe.gov.ar se encuentra publicado el Anexo al presente aviso, el cual contiene los Formularios } que podrán ser completados y enviados por las firmas interesadas.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación (personalmente, por correo, por fax o por correo electrónico), a más tardar el día 6 de mayo 2016 a las 12:00 horas, en la Mesa de Entradas de la Unidad Ejecutora del Proyecto – Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, sita en calle San Martín Nº 140, 18° Piso (C1004AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina, Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247.

Plan Belgrano — Presidencia de la Nación

Logo
Plan Belgrano

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

4/**Fotos**

Recomendaciones

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Fotos

Recomendaciones

1. Realización y producción de la foto.

Si la obra ya está puesta en marcha se puede realizar una toma fotográfica en el lugar.

Debe verse un estado avanzado de la obra para que la imagen tenga cierta composición.

Si la obra no es de gran magnitud debería hacerse foco en la actividad de los obreros

- **Planos abiertos**
- **Obreros trabajando en el lugar**
- **En lo posible mostrar espacios verdes y cielo abierto**
- **Composiciones limpias, sin demasiados elementos**







IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Fotos

Recomendaciones









IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Fotos
Recomendaciones

- Evitar planos cerrados.
- Evitar que las personas miren a la cámara.
- Debe evitarse fotografiar situaciones poco claras o difíciles de interpretar.
- Deben evitarse los bancos de imágenes.







IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Render
Recomendaciones

2. Render

Podemos utilizar un render 3D de la obra siempre que nos permita entender la obra a realizarse con todos sus detalles.

Deber ser un render realista de calidad y que contemple la presencia de “personas” y espacio verde y / o aire libre.







IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Fotos existentes

Recomendaciones

3. Usar fotos existentes

Al no disponer de una obra en plena actividad podemos usar fotos “genéricas” de obras similares ya existentes.

Por ejemplo, si la obra es la construcción de una nueva escuela se utilizaría la imagen de una escuela real con las características edilicias similares a la proyectada.









IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Presidencia de la Nación

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV



Juntos estamos avanzando.

CONSTRUCCIÓN XXX VIVIENDAS

IAPV
Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Presidencia de la Nación

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

Barrio **Xxxxxxxxxxxxx**

EXPEDIENTE N°: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N°: XXXXXX
MONTO CONTRATO: XXXXXX
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXXX
FECHA DE INICIO: XXXXXX
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX

MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


IAPV
Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos



IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

LISTADO DE ANEXOS

- MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS (oferta basica)
- MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS (oferta basica).
- MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS (oferta variable)
- MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS (oferta variable).
- MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE TERRENO (Proyecto provisto por el comitente).
- COMPROMISO DE VENTA.
- MODELO DE CONTRATO.
- MODELO DE ACEPTACION DE TRAMITE DE LA LEY Nº 7060 DE CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL.
- MODELO DE CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA CARTA COMPROMISO DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO.
- CONVENIO PARTICULAR.
- PLAN DE TRABAJO (en porcentaje) Y PLAN DE INVERSIONES (en pesos).
- CURVA DE TRABAJO (en porcentaje) Y CURVA DE INVERSIONES (en pesos) MAXIMA Y MINIMAS ADMITIDAS
- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
- MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS
- MODELO DE PRESUPUESTO
- CUADRO E
- LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION.
- LISTADO DE EQUIPOS A PRESENTAR
- MODELO DE VISACION MUNICIPAL DEL PROYECTO Y CONVALIDACION DE LA LOCALIZACION
- MODELO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA.
- MODELO DE FACTIBILIDAD DE DESAGUE CLOACAL
- MODELO DE FACTIBILIDAD DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA.
- MODELO DE FACTIBILIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
- MODELO DE CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD
- CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD.
- CERTIFICADO DE ACCESIBILIAD PERMANENTE
- CERTIFICADO DE ESTABILIDAD DE BARRANCAS
- CERTIFICADO DE TERRENO LIBRE DE OCUPANTES
- CERTIFICADO DE LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL
- MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION EN SOPORTE MAGNETICO

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

MODELO DE PROPUESTA

(OFERTA)

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL)

(OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS)

SEÑOR

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE

RIOS

LA FIRMA ..... con domicilio legal en calle ..... Nº ..... de la Ciudad de Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº..... como así también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra denominada ....., todo ello de conformidad con los documentos mencionados más arriba, por el monto de PESOS..... .....($.....), en concepto de **OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS**; manifestando además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto cotizado.

LUGAR Y FECHA .....

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ....., en su calidad de ..... y Director Técnico (respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta.

.... FIRMA

FIRMA

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

MODELO DE PROPUESTA
(OFERTA)

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL)

(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS)

SEÑOR

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE

RIOS

LA FIRMA ..... con domicilio legal en calle ..... Nº ..... de la Ciudad de Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº..... como así también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra denominada ....., todo ello de conformidad con los documentos mencionados más arriba, por el monto de PESOS..... .....($.....), en concepto de**,**
INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS; manifestando además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto cotizado.

LUGAR Y FECHA .....

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ....., en su calidad de ..... y Director Técnico (respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta.

.... FIRMA
FIRMA

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

MODELO DE PROPUESTA
(OFERTA VARIABLE FUNDACIONES)

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL)

(OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS)

SEÑOR
PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE
RIOS

LA FIRMA ..... con domicilio legal en calle ..... Nº ..... de la Ciudad de Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº..... como así también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra denominada ....., todo ello de conformidad con los documentos mencionados más arriba, por el monto de PESOS..... .....($.....), en concepto de **OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS**; manifestando además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto cotizado.

LUGAR Y FECHA .....

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ....., en su calidad de ..... y Director Técnico (respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta.

.... FIRMA
FIRMA

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

MODELO DE PROPUESTA

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL)

(TERRENO)

SEÑOR

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

LAPRIDA Nº 351 PARANA –

ENTRE RIOS

LA FIRMA ..... con domicilio legal en calle ..... Nº ..... de la Ciudad de Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº..... como así también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra denominada ....., todo ello de conformidad con los documentos mencionados más arriba, por el monto de PESOS..... .....($.....), en concepto de**,**
VALOR DE TERRENO; manifestando además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto cotizado.

LUGAR Y FECHA .....

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ....., en su calidad de ..... y Director Técnico (respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta.

.... FIRMA
FIRMA

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

NOTA DE COMUNICACION DE COMPROMISO DE VENTA

(PARA EMPRESAS CUANDO ESTAS PROVEAN EL TERRENO Y NO SEAN TITULARES DEL MISMO)

En nuestro carácter de Oferente de la Licitación pública Nº ..... para la ejecución de viviendas en ..... adjuntamos Título de Propiedad, Certificado de Dominio y compromiso de venta, debidamente certificado por Escribano Público, de los terrenos a utilizar, del que resulta que su/s propietarios Sr./es.....
..... con documento/s Nros. ..... con domicilio en calle ..... de la ciudad de ..... quien/es suscribe/en el presente como prueba de la existencia de un compromiso irrevocable de venta a nuestro favor, condicionado a que se nos adjudique la obra antes mencionada. De no efectuarse la adjudicación, el compromiso quedará sin efecto sin que el propietario tenga derecho a compensación alguna. Este compromiso se mantiene durante un plazo de 90 días corridos a contar desde la fecha de recepción de las presentaciones. Si la ejecución de la obra fuera adjudicada a este oferente, se procederá a la inmediata formalización de la escritura Traslativa de Dominio a favor del Comitente, en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares - artículo 4.4.

NOTA: CERTIFICACION DE FIRMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda representado en este acto por su Presidente, Sr. Alfredo Francolini (D.N.I. Nº .....), con domicilio en calle Laprida N° 351 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en adelante denominado **"EL INSTITUTO"** y la **Empresa «EMPRESA»**, representada en este acto por el Sr. «TITULAR» («TIPO»Nro.«N»), con domicilio constituido en calle «DOMICILIO» de la Ciudad de «CIUDAD», Provincia de Entre Ríos, en adelante **"LA CONTRATISTA"**; convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en el Marco de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6351 y del Acuerdo de Adhesión a la propuesta de "NOMBRE DEL PROGRAMA" suscripto entre la Nación y las Provincias, que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades:

PRIMERA: El presente Contrato de Obra Pública tiene por objeto la ejecución de la Obra denominada **"«OBRA»"** adjudicada por Resolución Nro «RESOLUCIÓN_» I.A.P.V., consistente en la ejecución de **«VIV_LETRAS» («VIV») ("viviendas, honorarios de proyecto urbano y mensura" / "infraestructura y sus complementarias")** en la localidad de «LOCALIDAD», de conformidad con los Pliegos de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que sirvieran de base para la **Licitación Pública Nro. «LICITACION»** y a la propuesta/s que la misma presentara en dicho acto, documentación que la CONTRATISTA declara conocer y aceptar y a cuyo cumplimiento se obliga expresamente.----------

SEGUNDA: "LA CONTRATISTA" en su carácter de adjudicataria de la obra/s individualizada en la Cláusula Primera, se compromete a ejecutarla/s en el plazo convenido y conforme las reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación que se enumera en la Cláusula Décima tercera.----------

---

TERCERA: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose como retribución a **"LA CONTRATISTA"** la suma de **PESOS «MONTO_TOTAL_LETRAS» («MONTO_N»)**, mes básico: **(MES ANTERIOR A LA APERTURA)**, resulta de la oferta más conveniente de la **Licitación Pública Nro. «LICITACION»**. Dicha suma se compone de los parciales consignados en las Cláusulas Cuarta y Quinta.-

CUARTA: La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, de la Nación financiará la obra hasta un monto de PESOS «APORTE LETRAS», a valores de ……..del año xxxx, en los términos establecidos en el

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Programa Federal .....", y en el Convenio Particular respectivo, conforme al Cronograma de Desembolsos convenido con **"EL INSTITUTO",** que se adjunta anexo del Contrato.----------

QUINTA: "EL INSTITUTO" actuará como comitente y co-financiará la obra hasta la suma de PESOS «APORTE_IAPV_LETRAS» («APORTE_IAPV_N»), comprometiendo a tal efecto los fondos propios necesarios.----------

SEXTA: "LA CONTRATISTA" deberá dar inicio a la ejecución física de los trabajos dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la acreditación del anticipo financiero del Primer Desembolso del aporte correspondiente a la Nación, en la cuenta de EL INSTITUTO, lo que será comunicado a LA CONTRATISTA, a los efectos de labrar el Acta de Inicio de Obra. A partir de ese momento comenzará a computarse el plazo de «PLAZO_LETRA» («PLAZO_N») meses, establecidos en las bases y condiciones legales del pliego. ----------

SÉPTIMA: Las obligaciones establecidas en las Cláusulas anteriores, en cuanto a su ejecución, quedarán sujetas a la disponibilidad financiera de los fondos correspondientes al financiamiento comprometido por La Nación según la Cláusula Cuarta.----------

OCTAVA: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos dará lugar a las multas y/o sanciones que fija el Pliego de Bases y Condiciones y la Ley de Obras Públicas provincial, salvo que **"LA CONTRATISTA"** pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa de **"EL INSTITUTO"**. **"LA CONTRATISTA"** se obliga a denunciar y acreditar ante el **"EL INSTITUTO"** todo caso fortuito o situación de fuerza mayor dentro del término de los diez (10) días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en su caso, de haberlos podido conocer.------

NOVENA: El financiamiento a cargo de La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Nación será abonado por ésta, por intermedio de este I.A.P.V., contra certificación de avance de obra, bajo las condiciones que se fijan en las Cláusulas Cuarta y Séptima. Previamente " LA CONTRATISTA" percibira antes del inicio de obra un (15%) en concepto de anticipo financiero con cargo a los montos que financia la Nacion, que se descontara mensualmente durante el plazo de ejecucion de la obra en forma porcentual al avance fisico programado en el Plan de Trabajo. La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ha prestado conformidad a la Poliza Nro. XXXXXXXx extendida por el I.A.P.S., que "LA CONTRATISTA" ofrece como garantia de este anticipo. La presente Poliza es ejecutable por la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ante su sola denucia de incumplimiento formalizada por acto fundado y mantiene su vigencia hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.-

DÉCIMA: De la misma manera, el co-financiamiento a cargo de **"EL INSTITUTO"** será abonado por éste contra certificación del avance de obra, bajo las condiciones que se fijan en las Cláusulas Segunda y Quinta.

DECIMAPRIMERA: A los efectos de que **"EL INSTITUTO"** deposite los pagos que por todo concepto realicen a **"LA CONTRATISTA"** con motivo del presente Contrato, esta última ha abierto la Cuenta Nº..... **«CUENTA»** en

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

el Banco ..... Sucursal. ----------

DECIMASEGUNDA: La liquidación de las redeterminaciones de precio en caso de corresponder, se realizarán según lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/16 con las limitaciones establecidas contractualmente.----------

DECIMATERCERA: La documentación que integra el presente contrato que las partes declaran expresamente conocer y consentir está compuesta por: **a)** Bases y Condiciones Legales Particulares, **b)** Especificaciones Técnicas Particulares, **c)** Bases y Condiciones Legales Generales, **d)** Especificaciones Técnicas Generales, **e)** Documentación técnica elaborada por **"EL INSTITUTO", f)** Documentación Técnica elaborada por **"LA CONTRATISTA"** y aprobada por **"EL INSTITUTO", g)** Convenio Marco de fecha (FECHA) y Convenio Particular respectivo, **h)** la Ley Nº 6351 de Obras Públicas provincial y su reglamentación.---------- **DECIMACUARTA:** Se deja expresa constancia que la recepción definitiva de la obra objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del artículo 1646 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.----------

DECIMAQUINTA: La inspección y el contralor de los trabajos, serán ejercidas por **"EL INSTITUTO"**, aceptando **"LA CONTRATISTA"** su jurisdicción, así como la de los servicios y agentes dependientes del mismo. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de efectuar auditorias técnicas y de control de la certificación y pago cuando lo juzgue conveniente.----------

DECIMASEXTA: "LA CONTRATISTA" afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante **Póliza de Caución Nro. «POLIZA_5_»** expedida por el I.A.P.S. que cubre el cinco por ciento (5%) del importe total de la obra a favor del **"INSTITUTO"**, ello en concepto de Garantía de Contrato, debiendo ser restituida una vez concedida la Recepción Provisoria de la obra, si no mediaran razones para su retención en los términos que fijan los Pliegos de la Licitación. Asimismo del importe de cada certificado de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, según legislación vigente y que será devuelto una vez otorgada la Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por las causales establecidas en los Pliegos.------

DECIMASEPTIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación complementaria del mismo, que ante requerimiento de **"EL INSTITUTO"** deba ser presentada por **"LA CONTRATISTA"**, pasará a ser propiedad de **"EL INSTITUTO"**, haciéndose **"LA CONTRATISTA"** responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de las obras.-

---

DECIMAOCTAVA: Las partes convienen en someterse a la Jurisdicción de las Cámaras en lo contencioso Administrativo de la Provincia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder y teniéndose como domicilios legales los consignados en el presente contrato.--

---

IAPV IAPV IAPV

MODELO FORMULARIO DE ACEPTACION DE TRAMITE DE LA LEY Nº 7060 DE CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Esta Empresa, en uso de las facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, declara que para la dilucidación de cualquier cuestión que se suscita con motivo de la Licitación, contratación y ejecución de las obras.....
.....se somete al trámite establecido en la ley Nº 7060 y eventual uso de la vía contencioso administrativa, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso, la federal, constituyendo domicilio en calle .....Nº..... de la ciudad de Paraná. ----------

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

MODELO CONSTACIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA CARTA COMPROMISO DEL PROGRAMA

Esta Empresa, declara tener conocimiento fehaciente del CONVENIO PARTICULAR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" mediante la cual
se financiará la construcción de viviendas, el mejoramiento del hábitat urbano, obras de infraestructura y complementarias, firmado entre la Provincia de Entre Ríos y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, involucradas en el programa.
Se presenta la siguiente constancia con motivo de la Licitación Pública para la contratación y ejecución de las obras.....

....., ...de .....de 2.014

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los..... días del mes de..... del año 2016 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS

(en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Dr.. IVAN CARLOS KERR, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO …… de la Provincia de..... (en adelante "El INSTITUTO") representado por su Presidente ....., con

domicilio legal en la calle ..... de la Ciudad de ....., en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAD Nº 428/2009 y su modificatoria Resolución N° 0647 de fecha 12 de mayo de 2016.----------

---

PRIMERA: "El INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "……" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".----------

---

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. “LA SUBSECRETARÍA” reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por

“EL INSTITUTO”, hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 691/2016, en el prototipo establecido por “LA SUBSECRETARÍA”. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes correspondiente a la fecha de apertura de la licitación.---

TERCERA: “El INSTITUTO” se compromete a aportar los recursos

que fueran necesarios para solventar

eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, “El INSTITUTO” declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.----------

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General

de Desembolsos que “EL INSTITUTO” acordó con “LA S U B SECRETARÍA” y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, “LA SECRETARÍA” prevé realizar los desembolsos a “EL INSTITUTO” (CUIT……) por anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco …… Nº……de la Sucursal…….. la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA NACIÓN. Los pagos de “EL INSTITUTO” a

las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por “El INSTITUTO“, la cual deberá ser presentada a “LA S U B SECRETARÍA” incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, “LA SUBSECRETARÍA” deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.----------

QUINTA: “EL INSTITUTO” declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos

de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según

el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.----------

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.----------

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

que “EL INSTITUTO” no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo “EL INSTITUTO” efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda “Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46”.----------

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, “LA SUBSECRETARIA” podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.----------

---

DECIMA: “EL INSTITUTO” evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por “EL INSTITUTO” con sus propios recursos.----------

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.----------

---

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de “EL INSTITUTO”, deberán ser sometidos a la consideración de “LA SUBSECRETARÍA” con carácter previo a su ejecución.----------

-

DECIMA TERCERA: “EL INSTITUTO” deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.---------- **DECIMA CUARTA:** “EL INSTITUTO” deberá destinar un cupo de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%), sobre el total de unidades de viviendas que se construyen a través del presente Convenio, para adjudicar a los trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que residan en las

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

respectivas localidades y se hayan registrado para acceder a este beneficio. Asimismo “EL INSTITUTO” se compromete a dar cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de viviendas destinadas a personas discapacitadas.----------

---

DECIMA QUINTA: “LA SUBSECRETARÍA” realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. “EL INSTITUTO” se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.----------

---

DECIMA SEXTA: “EL INSTITUTO” se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.----------

---

DECIMA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO” deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.----------

DECIMA OCTAVA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.----------

DECIMA NOVENA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario DE VIVIENDA Y HABITAD del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS.----------

---

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.----------

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROVJiOA:EH7RE RX>S
MUNO:RO:
IOCAVI».D.
UOOAOOH PUSUCA til':
DtNDMtiAOÓN05IA:
U5ICAOÓN:
.f MPRESA:

ANEXO 1

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

MES BASE:

PIAN Cf
TRABAJOS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

ITEM	RUBRO		IP.'onto Total MES !	M62	M63	M64	M65	M66	MESS	MESS	M69	MEllO
	OBRAS DE VIVIENDAS											
Ul	Obras Preliminares											
2	Excavaciones											
3	Estruaurade H2A2											
4	Mampostería en elevación											
S	Cubiertade techos											
6	Rllloques											
7	Celorrasas											
S	Contrapisos											
9	Pisas											
10	Revestimientos											
11	Aberturas											
12	Instalación eléctrica interna l3 Instalación sanitaria interna											
14	Instalación para gasinterna											
15	Vidrios											
16	Pinturas											
17	Varios											
UI	Honorarios proiectoy mensura											
19	Red de agua frentista											
20	Red de cloacalfrentista											
	TOTAL	1										
	%por MES											
	%ACUMUIAD O											
	S por MES											
	$ ACUMUIADO											

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PW\111\'CtA..:UQ'r$ø:U)S
MU..'8a.P.lO :
t.OCAUOAO:
l)OlAC10HPU
H<CA.m
0:NOMmAOJ
ÓHOk U
SIU.OÓ!ó:
S:WJ(ts.A:

ANEX01

PROGRAMA FEDERAl DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

MES BASE:

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

PLAW O
TÍ:AWO:

ITEM	RUBRO	% ct:.e.rcie	Morrto Tot$1	MES 1	MES 3	MES 4	MES 5	MES6	MES8	MES8	MES9	TOTAl
	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS											
1	Mo-Am.Je:ntos de t rra de lotes											
2	"erco divisoño de or s											
3	Iverettas reg}amentarias o Munk páe$											
4	Muros de contención											
	INFRAESTRUCTURA											
S	Red de distribttdon Séctñca											
6	jA iumbcado Público											
7	cama Vial											
	TOTAL	100%										

1% por MES

!%ACUMULADO


S por MES

S ACUMUlADO

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ANEXO VII
CURVA DE INVERSIONES MAXIMAS Y MÍNIMAS ADMITIDAS

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO PARA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL

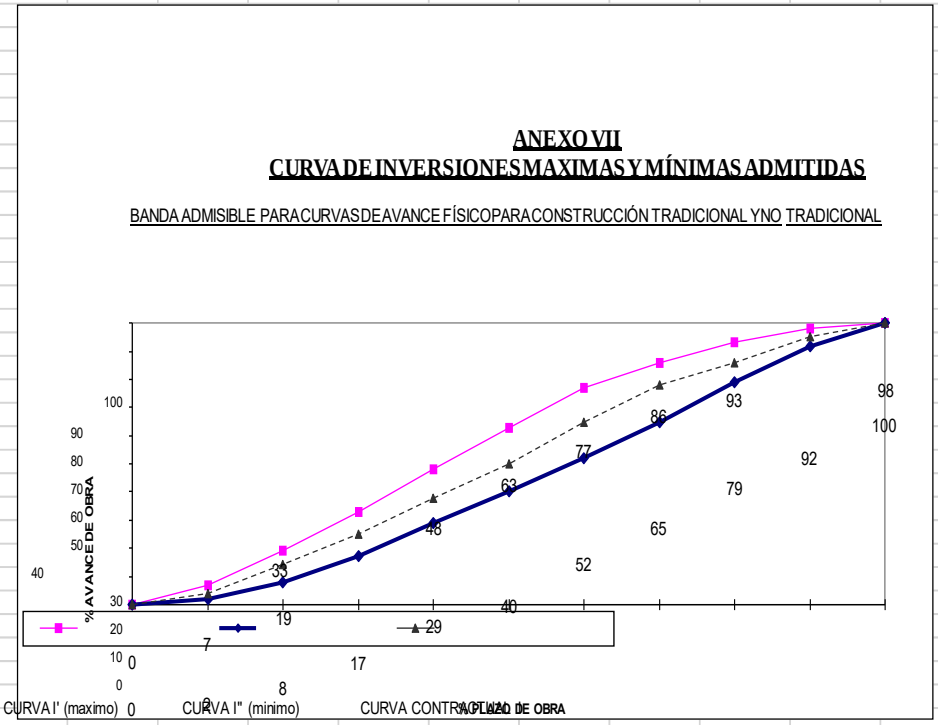

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

COSTO DEL PROYECTO:

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO

OBSERVACIONES

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS: A FECHA:
OBRA: ITEM N°:
UNIDAD:

		DESIGNACIÓN	U	CANT.	A. UNITARIOS	A. TOTALES
EQUIPOS	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
						TOTAL A

MATERIALES	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
						TOTAL B

MANO DE OBRA	14	Oficial Especial				
	15	Oficial				
	16	Medio Oficial				
	17	Ayudante				
	18	Cuadrilla A				
	19					
	20					
						TOTAL C

21	COSTO DIRECTO (CD)			TOTAL D=A+B+C	

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

MODELO DE PRESUPUESTO

Item	Descripción	Un	Cant.	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio Total	%

MONTO TOTAL PRESUPUESTO
OBRA: EMPRESA:

CUADRO E

SUBTOTAL 1 GASTOS GENERALES	
SUBTOTAL 2 BENEFICIO %	
SUBTOTAL 3 IMPUESTO %	
MONTO TOTAL	

Nota: el idice **K max** admitido sera:

Obras de Vivienda= 1,452
Obras de Infraestructuras y Nexos=1,59

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

I.A.P.V. ENTRE RÍOS **LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN** FECHA:

LICITACIÓN Nº (Se incluirán las obras terminadas durante los últimos cinco o más años)

Denominación de la Obra y Ubicación	Comitente y Domicilio	Superficie Cubierta o cantidad de viviendas	Monto de contrato	Plazo de Ejecución contractual	Fecha de Iniciación	Fecha de terminación o porcentaje de la ejecución	En caso de Asociación: nombre de las empresas consorciadas y porcentaje de participación que corresponde al proponente

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

I.A.P.V. ENTRE RÍOS

FECHA:___/__/____

LISTADO DE EQUIPOS A PRESENTAR

(Se incluirán,las obras terminadas durante los últimos cinco o mas años)

LICITACIÓN N°:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N° orden interior	Designación	Marca	Modelo	Potencia o Capacidad	N°de horas de trabajo	Estado	Ubicación Actual	Fecha probable de disponibilidad	Monto

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

VISACION MUNICIPAL DEL PROYECTO CONVALIDACION DE LA LOCALIZACION

LA MUNICIPALIDAD DE ..... CONVALIDA LA LOCALIZACION DEL CONJUNTO DE ..... VIVIENDAS A CONSTRUIRSE POR MEDIO DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA EN LOS TERRENOS UBICADOS EN LA MANZANA Nº ..... ENTRE LAS CALLES .... (se adjunta croquis), POR RESPONDER A LAS PAUTAS DE USO DE SUELO QUE ESTE ORGANISMO TIENE ESTABLECIDAS.
ASIMISMO CERTIFICA QUE HA VISADO LOS PLANOS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

..... de 2.00...-
Lugar y fecha.

.....
Firma y sello del funcionario convalidante.-

.....
Sello del Organismo

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA Y COMPROMISO DE RECEPCION, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

La ..... otorga por la presente, **la factibilidad de servicio de agua**, para las viviendas a construir en el terreno comprendido por las calles .....

MANZANA: ..... de la ciudad de .....

(según croquis adjunto).

A) - CAÑERIAS EXISTENTES:

1) Por calle.....entre .....

y ....., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro

2) Por calle.....entre.....

y ....., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro

3) Por calle.....entre.....

y ....., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro

4) Por calle.....entre.....

y ....., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro

5) Presión existente en Punto de Empalme ..... (m.c.a.).

B) - AMPLIACION A EJECUTAR: deberá empalmarse sobre cañería existente, por calle ..... en su intersección con calle ..... de FºFº/AºCº - clase 5/ P.V.C. C-6, de diámetro ..... según se indica en croquis adjunto. Esta .....

se compromete a recibir, explotar y mantener las obras que como consecuencia de la presente factibilidad sean ejecutadas, previa aprobación del correspondiente proyecto e inspección de las mismas.

OBSERVACIONES: .....

LUGAR Y FECHA: .....

.....

FIRMA

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESAGUE CLOACAL Y COMPROMISO DE RECEPCION, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

La .....

otorga por la presente, **la factibilidad de servicio de desagüe cloacal**, para las viviendas a construir en el terreno comprendido por las calles: .....

..... MANZANA:

..... de la ciudad de .....

(s / croquis de ubicación adjunto).

A) - CAÑERIAS EXISTENTES:

1) Por calle ..... entre .....y

....., caño M.V./R.C.P./Hº simple de diámetro .....con cota de intrados ..... (agua arriba) y ..... (agua abajo). 2) Por calle ..... entre .....

y ....., caño M.V./R.C.P./Hº simple de diámetro ..... con cotas de intrados ..... (agua arriba) y..... (agua abajo). 3) Por calle ..... entre .....

y ....., caño M.V./R.C.P./Hº simple de diámetro ..... con cotas de intrados ..... (agua arriba) y ..... (agua abajo). 4) Por calle ..... entre .....

y ....., caño M.V./R.C.P./Hº simple de diámetro ..... con cotas de intrados ..... (agua arriba) y ..... (agua abajo).

B) - AMPLIACION A EJECUTAR: se deberá prever el vuelco a la Boca de registro existente en la intersección de las calles ..... y ..... de la cual sale la cañería de M.V./R.C.P./Hº simple, de diámetro ....., con una cota de intrados de ..... y una tapada de ..... respecto al juego de marco y tapa; según se indica en croquis adjunto.

Esta .....

Se compromete a recibir, explotar y mantener las obras que como consecuencia de la presente factibilidad sean ejecutadas, previa aprobación del correspondiente proyecto e inspección de las mismas.

OBSERVACIONES: .....

LUGAR Y FECHA:.....

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ENERGIA

La ..... certifica que es factible el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público y domiciliario al proyecto de ..... viviendas, a construirse en los terrenos comprendido por las calles: .... con las siguientes condiciones:

1) Punto de conexión: Se encuentra en .....
..... con una tensión de ..... voltios, ejecutada con cable tipo ..... de ..... de ..... distante a ..... metros de la subestación de ..... KVA existente en las calles .....
según se observa en planos adjuntos.

2) Compromiso de recepción, explotación y mantenimiento. Este organismo se compromete a recepcionar, explotar y mantener las obras de energía eléctrica que según lo expuesto en el punto anterior queden por cuenta y cargo del usuario y formen parte de las instalaciones de conjunto e infraestructura del complejo habitacional a ejecutar.

3) Observaciones:.....
.....

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO

La Municipalidad de ..... ***CERTIFICA QUE ES FACTIBLE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO*** al grupo habitacional de ..... viviendas a construirse en el terreno ubicado en calle ....., entre ..... y ....., manzana n° ....., lote n° ....., (se adjunta croquis).

.....
lugar y fecha

.....
firma y sello de funcionario responsable

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD

LA MUNICIPALIDAD DE ..... CERTIFICA QUE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA MANZANA Nº ..... ENTRE LAS CALLES ..... (se adjunta croquis), no presenta problemas de inundabilidad ante crecidas de..... por encontrarse por encima de la "COTA MAXIMA DE INUNDABILIDAD", que es..... ni por precipitaciones, descargas, aluviones, desagües, etc.

..... de 2.00...-

Lugar y fecha.

.....

Firma y sello del funcionario certificante.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad de ..... Departamento ..... Provincia de Entre ríos, certifica que es factible la provisión de los siguientes servicios con la modalidad detallada, a la fracción de terreno ubicada en las calles .....
.....

- Recolección de residuos, frecuencia .....
Nº de veces / día, semana.

- Riego y conservación de calles, frecuencia .....
Nº de veces / día, semana.

- Barrido y limpieza de calles, frecuencia .....
Nº de veces / día, semana.

- Transporte urbano, frecuencia .....
Nº de veces / día, semana.

Además se compromete a realizar la correspondiente ampliación y a mantener y explotar tales servicios, a partir de la fecha de habilitación de las viviendas.

..... de 2.00...-
Lugar y fecha.

.....
Firma y sello del funcionario convalidante.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD PERMANENTE

La Municipalidad de ..... ***CERTIFICA QUE ES FACTIBLE LA VINCULACIÓN VIAL EN FORMA PERMANENTE*** a la trama urbana existente del terreno ubicado en calle (*) ....., entre (*) ..... y (*) ....., manzana n° ....., lote n° ....., (se adjunta croquis), donde se proyecta construir un grupo habitacional.

Además se compromete a efectuar los trazados de conservación y mantenimiento de las obras ejecutadas como consecuencia de la presente factibilidad, por sí o por terceros, previa aprobación del proyecto correspondiente e inspección de las mismas.

Nota: (*) detallar nombre y características de la calle

.....
lugar y fecha

.....
firma y sello de funcionario responsable

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE ESTABILIDAD DE BARRANCA

La Municipalidad de ..... ***CERTIFICA*** que el terreno ubicado en calle ....., entre ..... y ....., manzana n° ....., lote n° ....., (se adjunta croquis), donde se proyecta construir un grupo habitacional, se encuentra a una distancia de ..... mts. del borde de barrancas ubicadas en ...., ***NO PRESENTANDO PROBLEMAS DE ESTABILIDAD***.

.....
lugar y fecha

.....
firma y sello de funcionario responsable

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE TERRENO LIBRE DE OCUPANTES

La Municipalidad de ..... ***CERTIFICA*** que el terreno ubicado en calle ..... entre ..... y ....., manzana n° ....., lote n° ....., (se adjunta croquis), donde se proyecta construir un grupo habitacional, ***SE ENCUENTRA LIBRE DE OCUPANTES***.

.....
lugar y fecha

.....
firma y sello de funcionario responsable

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

CERTIFICADO DE LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL

La Municipalidad de ..... ***CERTIFICA*** que el terreno ubicado en calle ..... entre ..... y ....., manzana n° ....., lote n° ....., (se adjunta croquis), donde se proyecta construir un grupo habitacional, ***PERMITEN EL LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL EN SU TOTALIDAD DE SU SUPERFICIE***

.....
lugar y fecha

.....
firma y sello de funcionario responsable

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

SEÑOR
PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
LAPRIDA 351
PARANA-ENTRE RIOS

LA FIRMA……..con domicilio legal en calle……Nº……., de la Ciudad de……..manifiesta que la documentación presentada en escrito debidamente foliada y firmada por nosotros es copia fiel del soporte magnético entregada por ustedes en el momento de adquirir el pliego.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
ENTRE RIOS

RESOLUCION DE DIRECTORIO No. 2059

PARANA, 11 OCT 2016

VISTO:

El Decreto N° 2715/16 MPIyS; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho instrumento se derogaron los Decretos N°2.539/2002 SOSP, N° 3.338/2005 GOB que aprobaron la Metodología de Redeterminaciones de Precios de los Contratos de Obra Pública, así como las Resoluciones N° 729/05 SMOySP, N° 249/08 SPI, N° 1.036 Spel, N° 314/11 MPIyS, Decreto N° 278/09 GOB, Decreto N° 3173/11 GOB y toda otra disposición administrativa dictada en concordancia con dichas normas;;

Que asimismo por dicho Decreto la Provincia se adhiere parcialmente al Decreto N° 691/16 P.E.N., por el cual se aprobó el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de la Administración Pública Nacional y se aprueba un nuevo Régimen Provincial de Redeterminación de Precios;

Que en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5° y 20° del Anexo al Decreto Nº 2715/16 MPIyS "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública de la Administración Pública Provincial", deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones, de próximas licitaciones, la Estructura de Ponderación de insumos principales y/o componentes, y las fuentes de precios correspondientes;

Que es del caso establecer la Estructura de Ponderación de Insumos Principales, la que se anexa a la presente, denominada: Obras de I.A.P.V;

Que en dicho anexo se determinan los insumos y/o componentes a ponderar al momento de la Redeterminación de cada uno de los rubros

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
ENTRE RIOS

RESOLUCION DE DIRECTORIO No. 2059

///2.-

Que teniendo en cuenta el volumen de obras en curso de llamado a Licitaciones, resulta necesario incluir en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento, la estructura de ponderación de los insumos principales y/o de costos que por el presente se propicia su aprobación de manera excepcional;

Que conforme a lo que dispone el Artículo 5° del Decreto 2517/16MPIyS que crea la Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública de la Administración Pública Provincial, cuyas funciones se encuentran detalladas en el Artículo 6° del Decreto mencionado, resulta conveniente y necesario poner en funcionamiento la misma a partir de la fecha de la presente Resolución;

Que la presente Resolución será parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones que conforman los legajos licitatorios, como anexo al Proyecto de Obra integrado - entre otros - por los Pliegos Técnicos, que estén alcanzados por las disposiciones del Decreto N° 2715/16 MPIyS;

Que por ello y en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL I.A.P.V.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Aprobar la Estructura de Ponderación de insumos y/o componentes principales, que como Anexo forma parte de la presente.-

ARTICULO 2°.- Utilizar la estructura de ponderación, que se aprueba como Anexo, de base para establecer el momento que corresponda la redeterminación de acuerdo al Decreto 2715/16.

ARTICULO 3°.- Establecer como fuente a utilizar, la que periódicamente se publica en el sitio web oficial, por la Dirección General del Registro de Contratista de Obras y Servicios y Variaciones de Costos.-

Laprida 351 Tel.: 0343-4234523/4233186 - Fax:4230349 Paraná Entre Ríos

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
ENTRE RIOS

RESOLUCION DE DIRECTORIO No. 2059

///3.-

ARTÍCULO 4°.- Disponer que la presente Resolución sea parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones que conforman los Legajos Licitatorios, que estén alcanzados por las disposiciones del Decreto N° 2715/16 MPIyS.-

ARTÍCULO 5°.- Comunicar a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.), a la Cámara Argentina de la Construcción (C.A.C.) y al Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios.-

ARTÍCULO 6°.-Por Gerencia Técnica, Gerencia Contable y Gerencias Regionales, tomar debido conocimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.-

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar y archivar.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
ENTRE RIOS

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2285

REG. DE NOTAS: 14220-170652-2016.-

PARANA, 08 NOV 2016

VISTO:

La Resolución de Directorio N° 2059 de fecha 11 de Octubre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que por dicho instrumento se aprobó la Estructura de Ponderación de insumos y/o componentes principales, atento a los establecido por el Decreto N° 2715/16 MPIyS;

Que por el articulo 3° se estableció como fuente a utilizar, la que periódicamente se publica en el sitio web oficial, por la Dirección General del Registro de Contratista de Obras y Servicios y Variaciones de Costos, a incorporar a los Pliegos de Base y Condiciones de las Licitaciones a realizar que se tomaron a partir de lo expuesto tanto en el Articulo 7 del Decreto Nacional 691/16, así como también el Articulo 7 del Decreto 2715/16 MPIyS donde establecen la posibilidad que el Comitente fije su propia Tabla en base a los INDICES que considere pertinente;

Que la Gerencia Técnica informa que a efectos de no generar discordancias futuras, dado que se ha aclarado desde la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda que aplicarán dichos indices por los precios que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO corresponde modificar el Articulo 3° en función de lo dispuesto por Nación según Decreto 691/16;

Que en virtud de proceder a aplicar los indices del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, es necesario dejar sin efecto el ANEXO I de la Resolución de Directorio N° 2059/16 y aprobar el nuevo anexo que se adjunta a la presente;

Que se hace necesario rectificar la Resolución de Directorio N° 2059 de fecha 11 de

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
ENTRE RIOS

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2285

REG. DE NOTAS: 14220-170652-2016.-

///2.-

Octubre de 2016;

Que por ello y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DEL I.A.P.V.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR el Articulo 3° de la Resolución de Directorio N° 2059 de fecha 11 de Octubre de 2016, el que en su parte pertinente, quedará redactado conforme lo siguiente:

"... *ARTICULO 3°.-* Establecer como fuente a utilizar, la que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO.-..."

ARTÍCULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO el ANEXO de la Resolución de Directorio N° 2059 de fecha 11 de Octubre de 2016; atento a los considerandos que anteceden.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar la nueva Estructura de Ponderación de insumos y/o componentes principales, que como Anexo I forma parte de la presente; atento a los considerandos que anteceden.-

ARTÍCULO 4°.- Disponer que la presente Resolución sea parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones que conforman los Legajos Licitatorios, que estén alcanzados por las disposiciones del Decreto N° 2715/16 MPIyS.-

ARTÍCULO 5°.- Comunicar a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.), a la Cámara Argentina de la Construcción (C.A.C.) y al Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios.-

ARTÍCULO 6°.-Por Gerencia Técnica, Gerencia Contable y Gerencias Regionales, tomar debido conocimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.-

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar y archivar.-

BSA.-

Sr. MARCELO DANIEL FLORES
VICEPRESIDENTE DIRECTORIO
INST. AUTARQ. PLAN Y VIVIENDA

Sr. ALFREDO FRATTEGIANI
Inst. Autárq. Plan. y Vivienda

Sr. FABIAN FLORES
VOCAL DIRECTORIO
INST. AUTARQ. PLAN Y VIVIENDA

Arq. AMALIA V. PERONI
VOCAL DIRECTORIO
INST. AUTARQ. PLAN Y VIVIENDA

Laprida 351 Tel.: 0343-4234523/4233186 - Fax:4230349 Paraná Entre Ríos

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
ENTRE RIOS

ANEXO RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2285
REG. DE NOTAS: 14220-170652-2016.-

08 NOV 2016

TABLA PONDERATORIA INDICES INDEC

CODIGOS		Designación	Obras I.A.P.V
51560-12	CAP.M.OBRA	OFICIAL	0,50
37440-11	CAP.MAT	Cemento portland env. 50 Kg.	0,06
37510-11	CAP.MAT	Hormigón Elaborado H 17	0,04
15310-11	CAP.MAT	Arena común en Paraná	0,03
42120-21	CAP.MAT	Puerta balcon c/celosías - 1,50x2,00 - aluminio pesado	0,09
37370	CAP.MAT	Cerámico 30X30 cm. tránsito medio	0,03
37350-11	CAP.MAT	Ladrillo hueco18x18x33	0,04
46340-31	CAP.MAT	Cable de aislación plástica de 1X2 mm2.	0,03
41242-11	CAP.MAT	Acero alta resistencia - Ø 8 mm x 12 m.	0,03
42999-2	IPIB apert.	Chapa de HºGº ondulada nº25	0,02
35110-31	CAP.MAT	Pintura al látex envase 4 l. 1ª calidad p/interior	0,02
37210-12	CAP.MAT	Inodoro loza blanca	0,03
36320-12	CAP.MAT	Caño PVC - ø 110 mm. - 3,2 mm. x 4 m.	0,04
33360-1	IPIB apert.	Gas Oil	0,01
71240-11	SERVICIOS	Camión volcador - 320/340 HP - chasis corto	0,03
		Σ	1,00

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Modelo Tabla Vinculada

Mes	Base	13	ago-2016
	Estudio	13	ago-2016

Asunto: **Tabla de Insumos**

Cod	Elemento de Referencia	Insumo en Análisis de Precio	Un	Precio Redeterminado	Precio Base	Tabla Base	Tabla Estudio	Coef Actualiz
51560-14	Ayudante	Ayudante	hs	$ 86,52	$ 86,52	121,92	121,92	1,0000
51560-12	Oficial	Oficial	hs	$ 102,22	$ 102,22	122,23	122,23	1,0000
51560-11	Oficial especializado	Oficial especializado	hs	$ 119,97	$ 119,97	122,33	122,33	1,0000
51560-13	Medio Oficial	Medio Oficial	hs	$ 18,91	$ 18,91	122,41	122,41	1,0000
37510-11	Hormigón elaborado	Hormigón elaborado	m3	$ 1.210,00	$ 1.210,00	127,87	127,87	1,0000
41242-11	Acero aletado conformado, en barra	Hierro nervado de construcción	kg.	$ 14,00	$ 14,00	132,94	132,94	1,0000
42944-2	Clavos	Alambre, clavos,madera,etc.-	gl	$ 20,00	$ 20,00	122,70	122,70	1,0000
37440-11	Cemento portland normal, en bolsa	Cemento Portland	kgs	$ 2,00	$ 2,00	132,98	132,98	1,0000
15310-11	Arena fina	Arena	m3	$ 210,00	$ 210,00	132,79	132,79	1,0000
15320-11	Canto rodado natural	Canto rodado	m3	$ 408,26	$ 408,26	121,52	121,52	1,0000
41242-11	Acero aletado conformado, en barra	Hierro de nervado de construcción	kgs	$ 14,00	$ 14,00	132,94	132,94	1,0000
31210-11	Tabla con una cara cepillada para encofrado	Madera de obra	pie	$ 16,00	$ 16,00	129,18	129,18	1,0000
44440-2	Hormigoneras de 130 a 300 litros	Hormigonera 300lts	hs	$ 10,00	$ 10,00	149,85	149,85	1,0000
41242-11	Acero aletado conformado, en barra	Hierro 8mm	Barra	$ 69,00	$ 69,00	132,94	132,94	1,0000
41242-11	Acero aletado conformado, en barra	Hierro 4,2mm	Barra	$ 14,00	$ 14,00	132,94	132,94	1,0000
37440-31	Cemento de albañilería	Cemento albañilería	kg	$ 1,50	$ 1,50	133,91	133,91	1,0000
37350-11	Ladrillo cerámico hueco	Ladrillos hueco 18 x 18 x 33	u.	$ 8,00	$ 8,00	119,52	119,52	1,0000
37350-11	Ladrillo cerámico hueco	Ladrillos hueco 12 x 18 x 33	u.	$ 5,00	$ 5,00	119,52	119,52	1,0000
37350-11	Ladrillo cerámico hueco	Ladrillo hueco 8x18x33	u.	$ 4,00	$ 4,00	119,52	119,52	1,0000
37990-1	Hidrófugos	Hidrofugo	kg	$ 5,00	$ 5,00	127,10	127,10	1,0000
42999-2	Chapas metálicas	Chapa galvanizada nº25	m2	$ 45,00	$ 45,00	133,30	133,30	1,0000
41251-1	Perfiles de hierro	Perfil "C" 80 x 40 x 15 x 1,6	ml	$ 30,00	$ 30,00	113,30	113,30	1,0000
41251-1	Perfiles de hierro	Perfil "C" 120 x 40 x 15 x 1,6	ml	$ 40,00	$ 40,00	113,30	113,30	1,0000
37420-1	Cales	Cal	kg	$ 1,05	$ 1,05	121,80	121,80	1,0000
37370-0	Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos d	Cerámica esmaltada 20x20	m2	$ 100,00	$ 100,00	124,64	124,64	1,0000
37990-2	Pegamentos para revestimientos	Pegamento p/ cerámica	kg	$ 2,00	$ 2,00	126,50	126,50	1,0000
37370-0	Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos d	Azulejo 15x15 San Lorenzo blanco 1°calidad.	m2	$ 162,00	$ 162,00	124,64	124,64	1,0000
42120-11	Puerta metálica vidriada	Puerta P1 ciega de ingreso Aluvier	u.	$ 3.500,00	$ 3.500,00	134,62	134,62	1,0000
42120-11	Puerta metálica vidriada	Puerta c/ventana de abrir c/vidrio repartido	u.	$ 2.800,00	$ 2.800,00	134,62	134,62	1,0000
31600-22	Puerta placa de madera, de calidad media	Puerta placa pino 70 x 2 x 15	u.	$ 800,00	$ 800,00	125,99	125,99	1,0000
31600-22	Puerta placa de madera, de calidad media	Puerta placa pino 60 x 2 x 15	u.	$ 800,00	$ 800,00	125,99	125,99	1,0000
42120-0	Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: V	Ventanas corr. c/celosia de abrir; marco unid	u.	$ 3.200,00	$ 3.200,00	116,13	116,13	1,0000
42120-0	Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: V	Ventana de cocina c/2 proyectantes	u.	$ 1.200,00	$ 1.200,00	116,13	116,13	1,0000
37550-11	Vigueta de hormigón pretensado	Pilar de entrada de hormigón premoldeado	u.	$ 670,00	$ 670,00	125,08	125,08	1,0000
41277-11	Caño de chapa galvanizada	Caño galvanizado 1 1/2" x 3m c/pipeta	u.	$ 270,00	$ 270,00	134,80	134,80	1,0000
42999-51	Jabalina	Elementos de puesta a tierra	gl	$ 200,00	$ 200,00	150,28	150,28	1,0000
46340-31	Cable con conductor unipolar	Cable subterráneo	ml	$ 24,00	$ 24,00	122,31	122,31	1,0000
46212-1	Interruptores eléctricos	Elem. de protecc. - termomagn. y disy.-	gl	$ 200,00	$ 200,00	115,80	115,80	1,0000
42999-23	Caja de chapa para tablero	Caja para tablero seccional	u.	$ 100,00	$ 100,00	124,91	124,91	1,0000
46212-1	Interruptores eléctricos	Llave termomagnética 20A	u.	$ 70,29	$ 70,29	115,80	115,80	1,0000
37210-12	Inodoro de calidad media	Inodoro loza blanca	u	$ 142,12	$ 142,12	127,23	127,23	1,0000

INDEC

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COD	MATERIAL.-	octubre-15	noviembre-15	diciembre-15	enero-16	febrero-16	marzo-16	abril-16	mayo-16	junio-16	julio-16	agosto-16	septiembre-16	octubre-16
	CAP. MATERIALES													
37210-51	Accesorios de loza para baño de calidad media	**100,0**	102,2	106,6	112,5	115,8	115,8	119,2	120,9	120,9	120,9	120,9	120,9	
37210-52	Accesorios de loza para baño de calidad inferior	**100,0**	102,6	101,0	105,4	110,9	110,9	115,3	140,3	138,6	140,5	144,0	144,0	
42911-81	Accesorios metálicos para baño	**100,0**	104,2	114,6	114,6	114,3	116,1	121,7	122,0	123,8	125,4	127,9	128,2	
41242-11	Acero aletado conformado, en barra	**100,0**	104,3	123,2	128,3	128,6	129,1	127,2	127,4	128,4	133,4	132,9	133,6	
37440-21	Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos	**100,0**	103,2	109,0	113,5	117,4	129,9	127,2	129,5	129,9	132,5	133,5	137,3	
38130-13	Alacena de cocina de madera, de calidad inferior	**100,0**	100,0	108,1	110,6	118,3	125,7	125,7	125,7	126,9	126,8	131,9	140,5	
38130-12	Alacena de cocina de madera, de calidad media	**100,0**	101,4	109,9	114,7	129,4	137,2	141,8	141,8	141,8	151,4	163,4	166,1	
38130-11	Alacena de cocina de madera, de calidad superior	**100,0**	100,0	106,5	110,9	113,5	125,7	125,7	125,7	125,7	135,6	135,6	135,6	
27230-11	Alfombra de pelo cortado de material sintético, con colocación	**100,0**	104,1	110,4	120,7	124,5	125,8	125,8	130,1	132,8	132,8	135,4	135,4	
44821-11	Anafe a gas	**100,0**	104,1	107,1	112,1	116,0	117,4	121,4	122,5	122,7	125,1	125,1	125,1	
37560-11	Anillo para cámara de inspección de PVC	**100,0**	103,6	115,2	113,5	114,4	115,2	116,6	118,7	119,8	126,1	126,1	128,8	
15400-11	Arcilla expandida	**100,0**	100,0	100,0	104,5	105,4	106,3	109,3	112,0	112,5	112,5	112,5	115,3	
15310-11	Arena fina	**100,0**	102,6	107,3	111,5	112,1	113,8	121,5	125,8	128,3	130,3	132,8	134,2	
46531-11	Artefacto de iluminación	**100,0**	100,3	104,6	105,9	107,7	116,3	123,1	122,3	124,9	130,3	129,8	128,5	
43540-11	Ascensor de 15 paradas	**100,0**	100,0	104,9	127,8	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	141,3	141,7	142,1	
43540-12	Ascensor de 7 paradas	**100,0**	100,0	101,6	107,1	112,3	112,3	112,3	112,3	112,6	142,4	142,7	143,0	
37370-21	Azulejo	**$**	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	
37370-11	Baldosa cerámica esmaltada	**$**	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	
37370-12	Baldosa cerámica roja	**$**	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	
37690-11	Baldosa de laja negra	**100,0**	103,2	109,5	114,9	119,0	119,4	123,0	130,4	132,3	134,2	135,8	136,1	
42911-11	Bañera de chapa porcelanizada	**100,0**	100,0	107,2	107,5	111,6	111,4	117,4	120,5	117,5	119,1	119,1	120,9	
37129-11	Bañera de plástico reforzado con fibra de vidrio	**100,0**	105,1	110,8	120,5	123,1	126,5	126,3	135,8	137,2	135,8	135,8	135,8	
35110-41	Barniz con poliuretano	**100,0**	100,6	111,6	122,1	122,1	128,9	133,2	134,9	133,8	137,4	137,5	137,4	
37210-23	Bidé de calidad inferior	**100,0**	101,5	109,3	112,5	116,2	115,8	116,6	125,3	125,3	128,1	128,2	128,3	
37210-22	Bidé de calidad media	**100,0**	103,0	111,7	117,1	120,7	120,7	120,7	125,0	127,3	127,4	129,0	131,3	
37210-21	Bidé de calidad superior	**100,0**	105,7	111,9	119,4	120,1	119,8	120,7	123,1	123,9	123,9	123,9	123,9	
41543-21	Boca de acceso de plomo	**100,0**	103,2	117,8	126,1	132,9	132,9	133,7	133,8	133,8	136,2	139,1	139,1	
46340-31	Cable con conductor unipolar	**100,0**	102,5	122,0	129,6	133,2	135,9	133,9	131,1	121,5	123,3	122,3	122,7	
46320-11	Cable coaxil 75 ohms	**100,0**	112,5	104,8	114,2	123,9	136,1	140,9	141,8	142,2	141,7	141,7	142,3	
46340-11	Cable telefónico de 1 par	**100,0**	106,8	125,9	122,8	134,5	134,5	131,2	135,3	127,9	132,3	136,9	133,4	
46340-12	Cable telefónico de 101 pares	**100,0**	107,6	125,2	137,3	145,2	146,4	134,2	133,9	132,2	136,9	134,6	137,1	
46340-21	Cable tipo Sintenax	**100,0**	101,6	120,8	126,8	130,4	132,0	131,8	127,8	124,4	124,1	124,0	122,5	
46212-21	Caja de chapa con tablero trifásico	**100,0**	103,7	125,2	118,8	121,5	122,2	125,2	125,3	126,3	126,1	126,1	127,2	
42999-23	Caja de chapa para tablero	**100,0**	108,8	108,2	120,1	120,9	132,5	122,7	123,8	124,9	124,8	124,9	127,9	
42999-21	Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica	**100,0**	100,6	119,2	129,1	136,0	137,7	138,1	138,1	138,4	138,4	138,4	146,5	
42999-31	Caja para pares telefónicos	**100,0**	101,4	109,2	110,6	107,3	118,3	118,3	118,3	118,3	121,0	121,0	120,9	
42999-22	Caja rectangular de chapa para instalación eléctrica	**100,0**	101,6	119,7	129,2	133,6	136,3	136,3	138,4	139,6	139,6	139,6	141,0	
31600-63	Cajonera para placard, de calidad inferior	**$**	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	
31600-62	Cajonera para placard, de calidad media	**$**	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	
31600-61	Cajonera para placard, de calidad superior	**$**	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	
37420-11	Cal área hidratada	**100,0**	102,6	110,1	122,4	128,9	123,9	128,5	129,0	129,2	132,5	132,5	136,2	
37420-12	Cal hidráulica hidratada	**100,0**	104,0	112,8	116,4	122,6	124,4	130,8	134,0	133,3	136,3	136,8	139,8	
44822-11	Calefactor de tiro balanceado	**100,0**	102,9	106,0	117,6	119,0	122,2	126,5	129,1	131,2	134,0	135,6	135,6	
44826-11	Calefón de tiro balanceado	**100,0**	103,3	110,4	116,8	117,0	119,9	118,6	120,8	121,0	126,1	127,6	127,6	
44826-12	Calefón de tiro natural	**100,0**	103,0	106,0	109,4	115,3	117,4	123,3	126,0	126,0	129,0	129,6	128,5	
42911-21	Canilla de bronce	**100,0**	104,6	112,4	118,9	122,6	126,6	129,1	130,0	130,1	131,1	137,8	137,5	
41277-21	Caño de acero para instalaciones eléctricas	**100,0**	101,2	114,2	124,9	126,4	126,8	128,8	129,3	130,4	132,4	130,6	131,8	
41277-11	Caño de chapa galvanizada	**100,0**	104,1	118,2	128,2	127,6	130,2	130,1	132,5	130,7	134,1	134,8	137,1	
41516-11	Caño de cobre de 0,013 m	**100,0**	104,9	104,0	105,7	109,0	119,0	123,1	121,0	121,3	121,3	121,3	128,0	
41516-12	Caño de cobre de 0,019 m	**100,0**	104,3	102,0	104,4	104,4	105,1	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	114,9	
41279-11	Caño de hierro fundido de 0,064 m	**100,0**	106,2	107,3	114,8	114,8	114,8	121,7	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2	
41279-12	Caño de hierro fundido de 0,100 m	**100,0**	106,2	102,7	112,3	112,2	112,2	119,0	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	
41277-41	Caño de hierro galvanizado	**100,0**	102,1	122,1	118,0	121,6	123,1	125,6	125,8	125,2	128,0	131,0	131,0	
41277-31	Caño de hierro negro con revestimiento epoxi	**100,0**	102,2	123,6	120,3	129,1	138,9	140,2	139,9	141,4	145,3	145,6	143,6	
41543-11	Caño de plomo	**100,0**	102,0	106,2	110,9	114,2	120,9	120,5	121,6	121,6	122,6	126,4	126,4	
36320-21	Caño de polipropileno de 0,013 m	**100,0**	99,6	105,2	118,8	121,9	119,9	124,2	125,0	125,7	125,7	125,3	123,5	
36320-22	Caño de polipropileno de 0,019 m	**100,0**	100,0	105,2	118,3	123,1	127,6	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	130,3	
36320-11	Caño de PVC de 0,063 m	**100,0**	103,7	114,9	124,1	129,9	145,2	148,3	151,5	151,5	152,3	153,7	155,8	
36320-12	Caño de PVC de 0,110 m	**100,0**	104,1	110,8	121,0	124,2	128,1	132,8	133,0	134,2	134,2	135,0	133,0	
15320-11	Canto rodado natural	**100,0**	102,9	107,0	113,1	114,4	115,6	115,8	118,6	119,8	120,5	121,5	122,9	
37350-61	Cascote	**100,0**	100,9	105,4	109,6	113,7	114,3	129,1	129,3	130,9	130,9	133,4	133,8	
37440-31	Cemento de albañilería	**100,0**	105,1	114,5	118,7	124,1	126,8	126,6	129,6	129,7	133,1	133,9	138,2	

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

ANEXO II
PROTOTIPO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO 2016

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROTOTIPO 55,00 m2

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

2016

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANO 01


INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO DE: PLANTA GENERAL VIVIENDAS APAREADAS

ESC: 1:100

FECHA: 2016

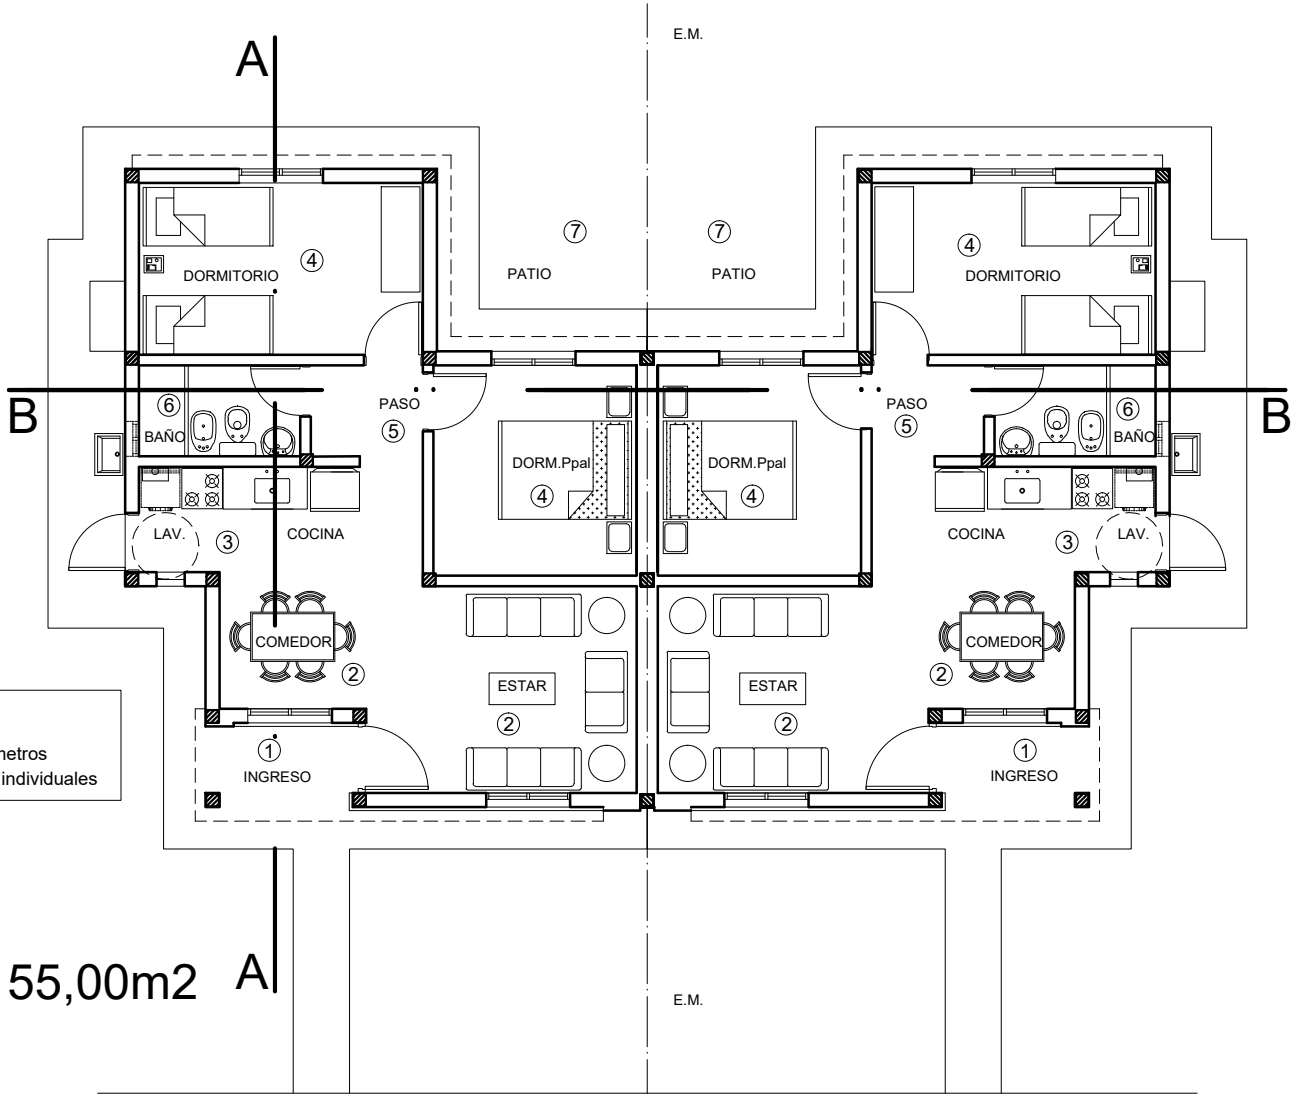

NOTA:
-Medianera espesor 0,30 metros en viviendas apareadas e individuales


PROTOTIPO 55,00m2

PLANTA GENERAL


IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROTOTIPO 55,00m2

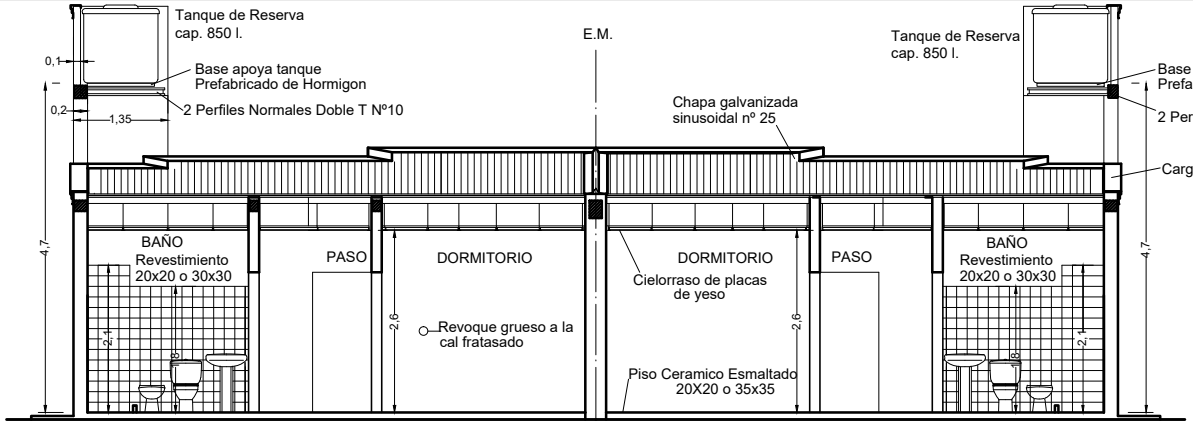


CORTE B-B

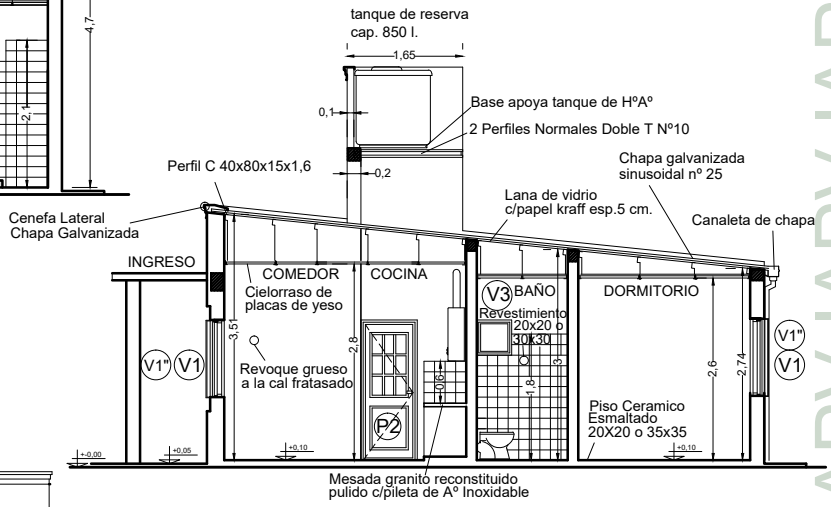

CORTE A-A

NOTA:

-Medianera espesor 0,30 metros
en viviendas apareadas e individuales

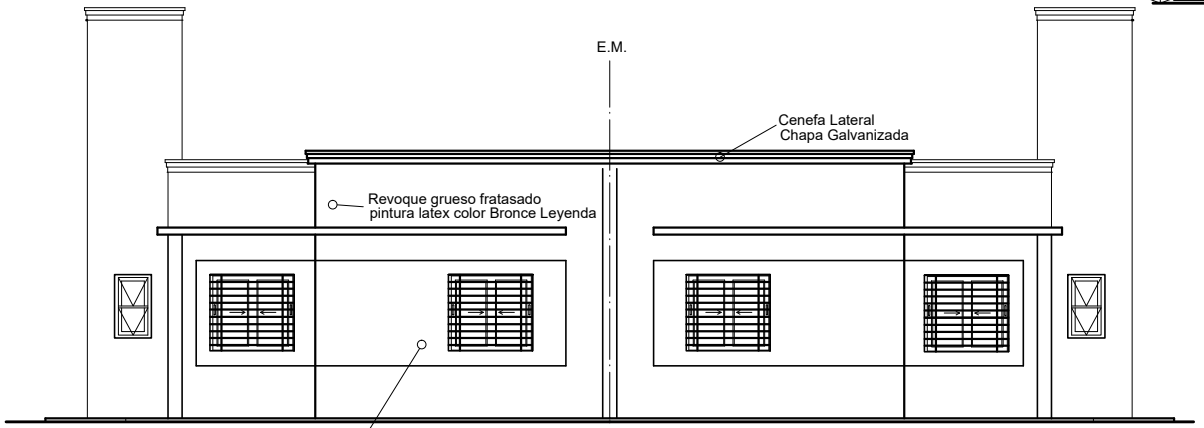

FACHADA

NOTA:

Los encadenados de arriostriamiento
iran acompañando la pendiente de la cubierta
excepto donde apoya la losa de ingreso

PLANO	INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
02	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:100
	PLANO DE: CORTES- FACHADA	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANO 03

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA


TEMA: TECHO DIGNO

PLANO DE: PLANTA DE TECHOS VIVIENDAS APAREADAS

ESC: 1:100


FECHA: 2016

PROTOTIPO 55,00m2

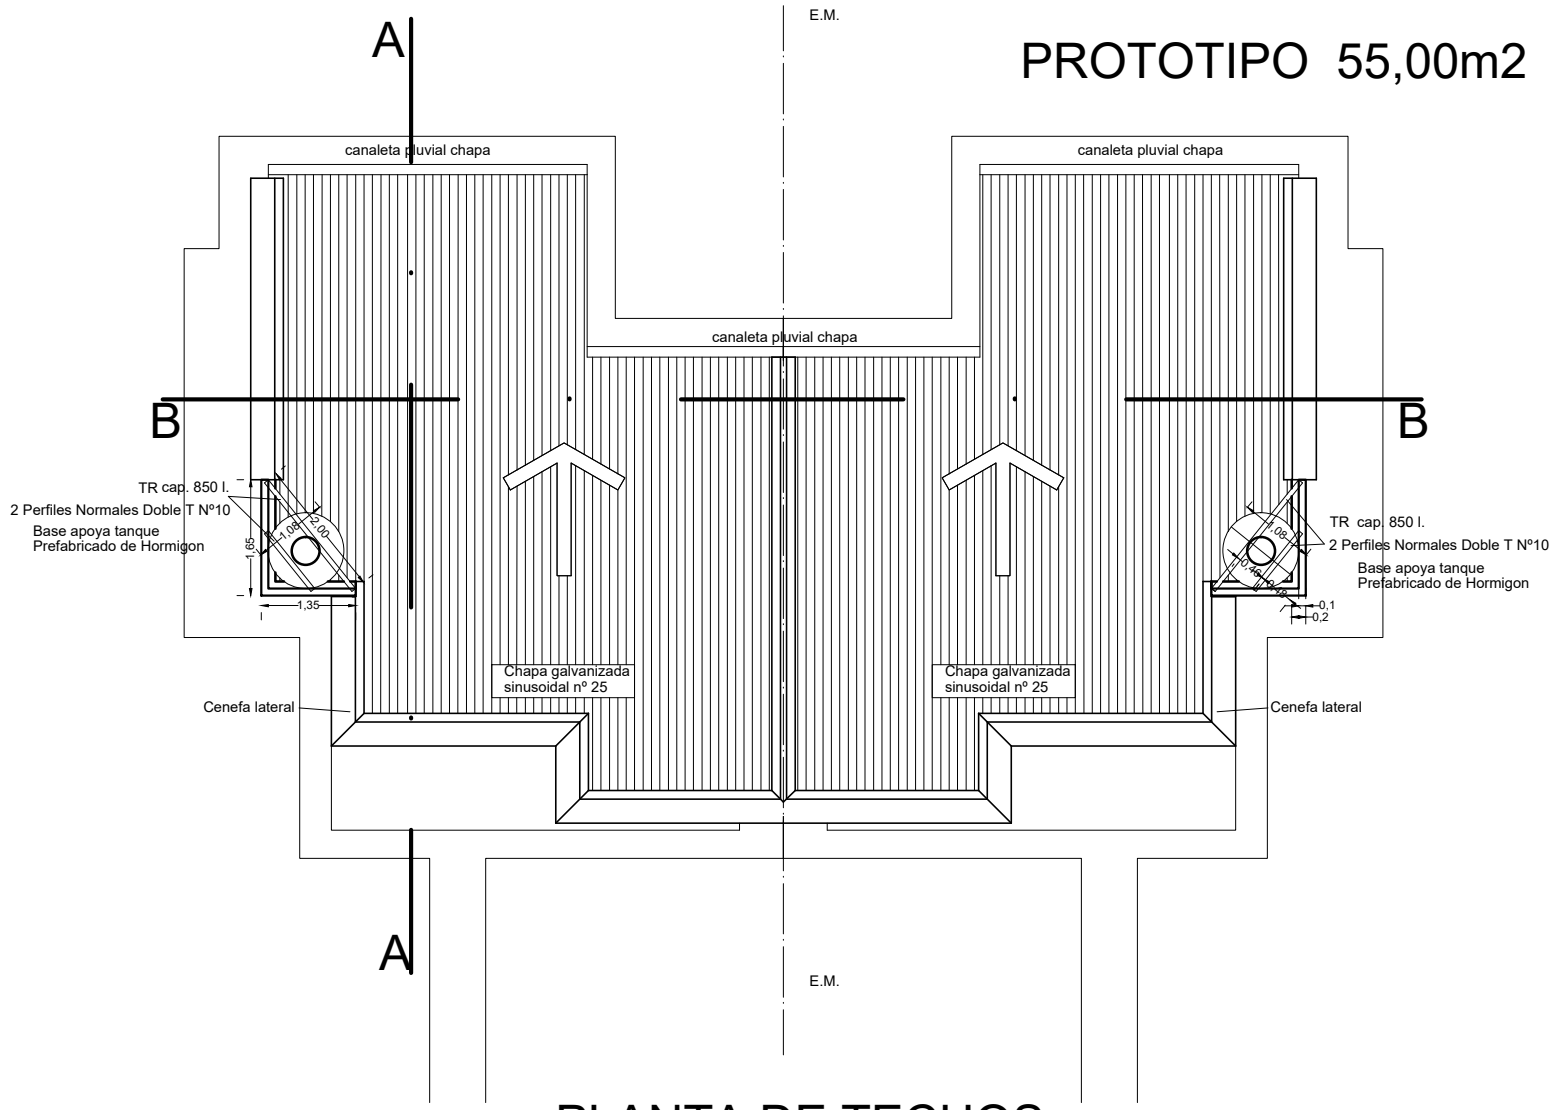

PLANTA DE TECHOS


IAPV IAPV IAPV

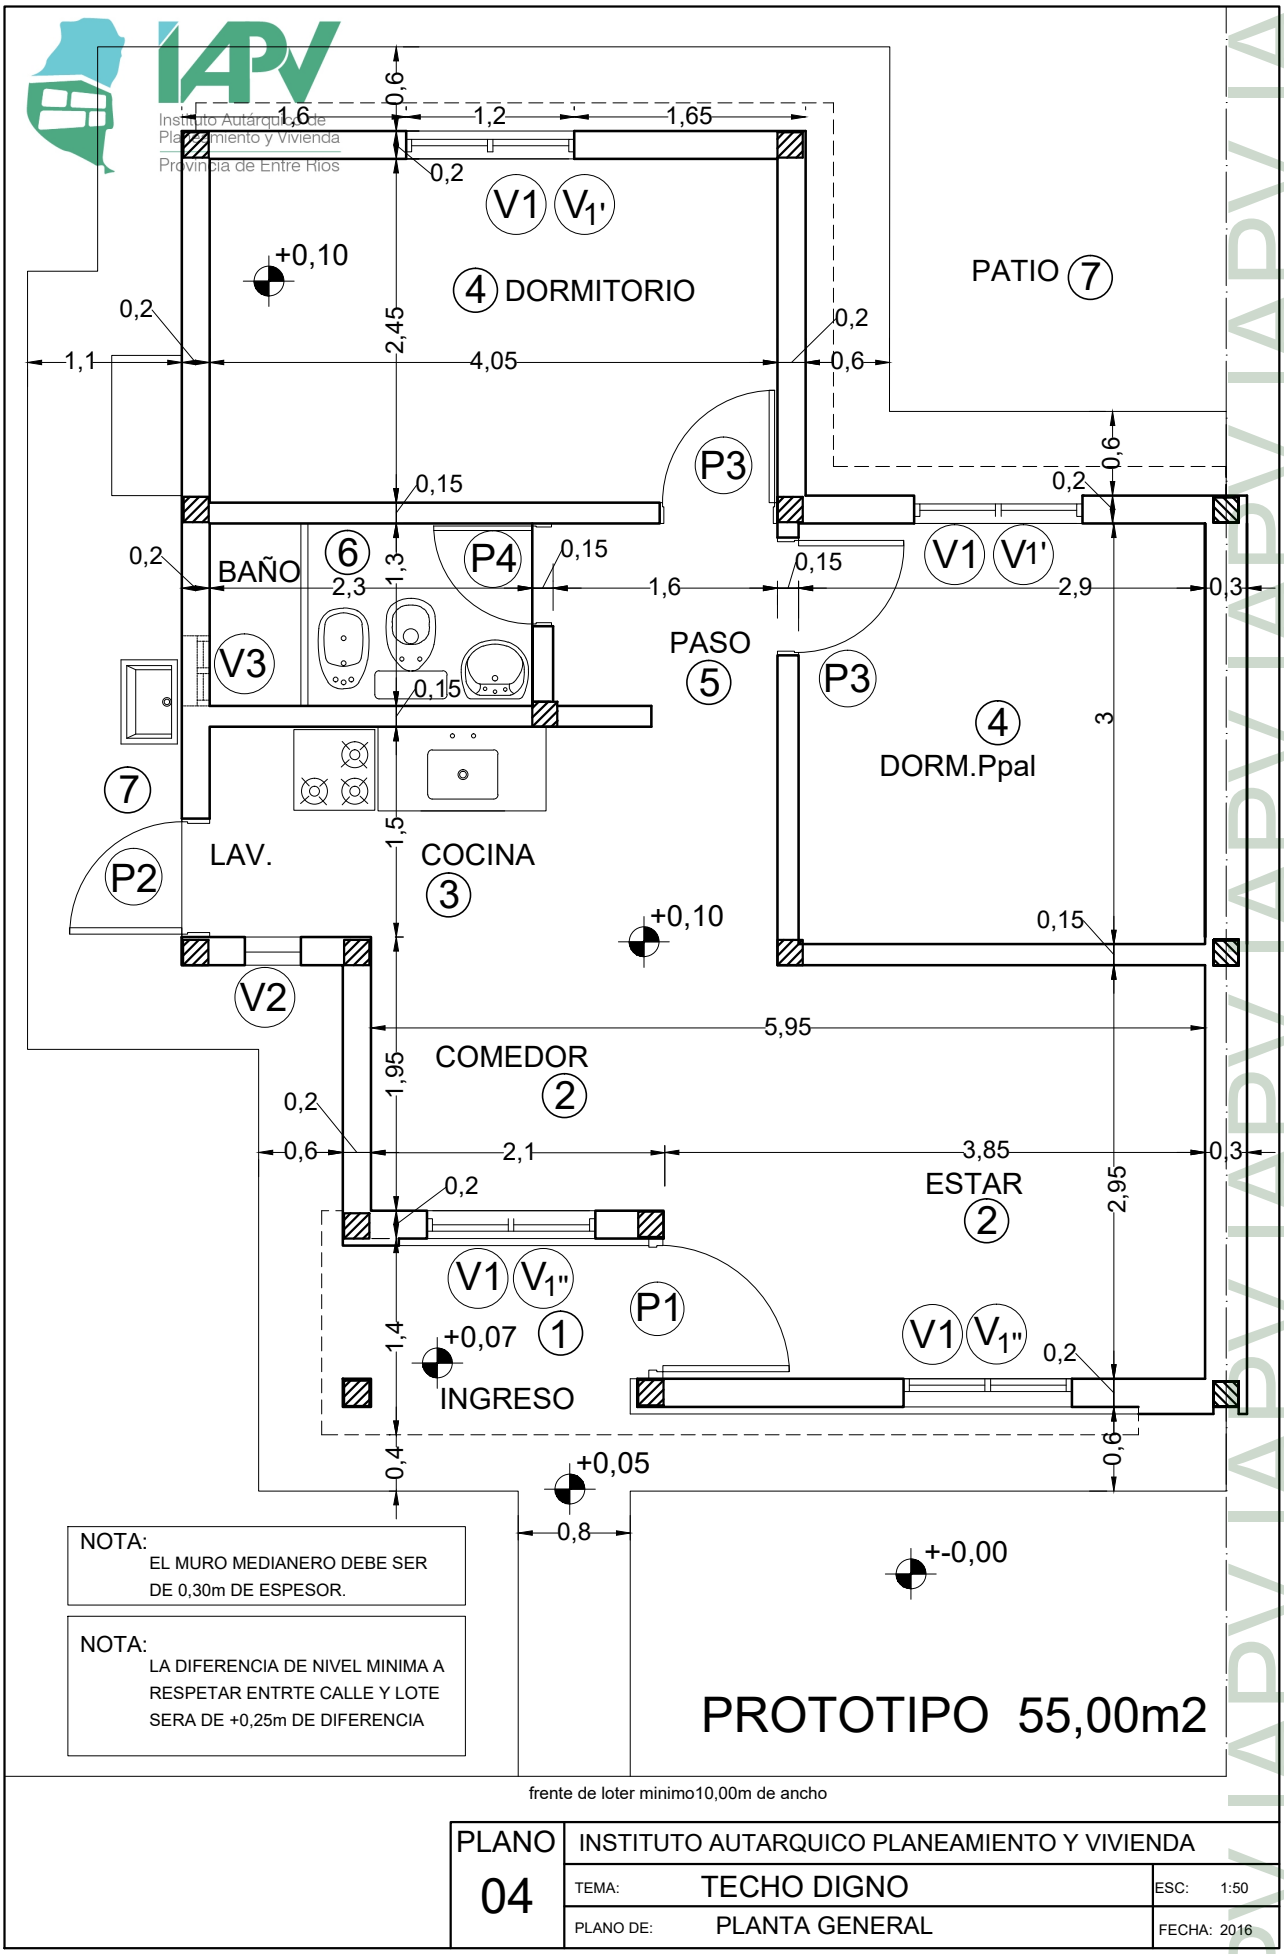

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROTOTIPO 55,00m2

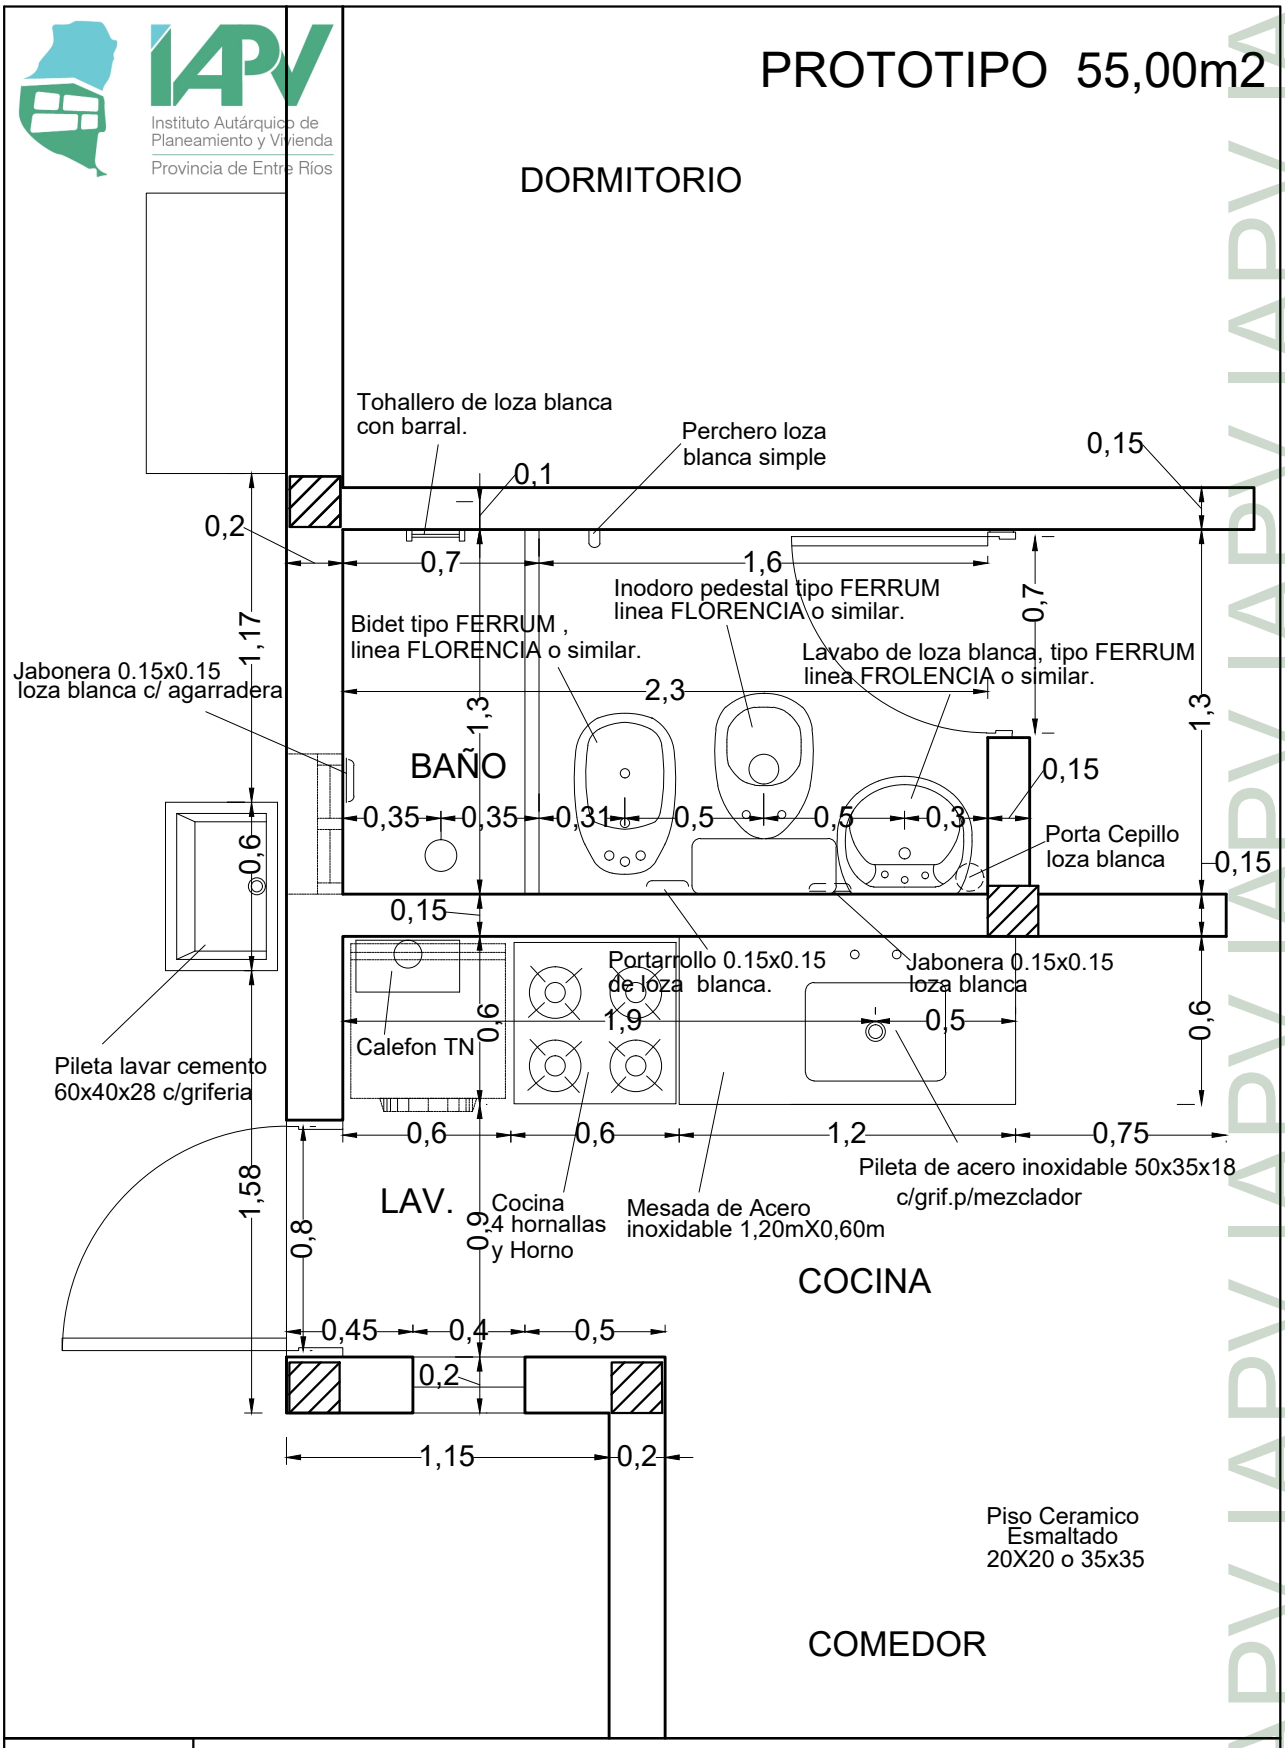

PLANO 05	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:25
	PLANO DE: DESARROLLO BAÑO Y COCINA	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANILLA DE LOCALES

RUBRO	TERMINACIONES	LOCALES								
		1 INGRESO	2 ESTAR-COMEDOR	3 COCINA - LAV.	4 DORMITORIOS	5 PASO	6 BAÑO	7 PATIO	8 LINEA MUNICIPAL	
CONTRAPISO	SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 12 CM.		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 10 CM	⊘						⊘		
SOLADOS	CERAMICO ESMALTADO 20X20		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CARPETA DE CEMENTO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CARPETA DE CEMENTO P/EXTERIOR EN VEREDAS	⊘						⊘		
ZOCALOS	CERAMICO ESMALTADO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
REVESTIMIENTO	AZULEJOS BLANCOS 15 X15			⊘			⊘			
MUROS	LADRILLO COMUN		⊘		⊘					
	LADRILLO CERAMICO	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘		
REVOQUE	IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO			⊘			⊘			
	INTERIOR: GRUESO FRATASADO A LA CAL		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	EXTERIOR: IMPERM. Y GRUESO FRATASADO	⊘						⊘		
CIELORRASO	DESMONTABLE CON PLACA DE YESO	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
CARPINTERIA	P1		⊘							
	P2			⊘						
	P3				⊘					
	P4						⊘			
	V1		⊘		⊘					
	V2			⊘						
	V3						⊘			
	V1´				⊘					
	V1"		⊘							
INST.SANITARIA	INODORO PEDESTAL LOZA BLANCA CON ASIENTO						⊘			
	BIDET LOZA BLANCA						⊘			
	LAVATORIO LOZA BLANCA CON GRIFERIA						⊘			
	1 PORTARROLLO-1TOHALLERO-2 JABONERAS-1 PERCHA						⊘			
	DUCHA COMPLETA (incluye brazo y flor)						⊘			
	PILETA DE AªINOX. 50x40x18 C/GRIF.P.MEZCLADOR			⊘						
	PILETA LAVAR CEMENTO 50x40x28 CON GRIFERIA			⊘						
INST. ELECTRICA	BRAZO			⊘			⊘	⊘		
	CENTRO	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	TIMBRE CAMPANILLA	⊘								
	TOMACORRIENTE		⊘	⊘	⊘		⊘	⊘		
	TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO				⊘					
	TOMA PARA TELEFONO		⊘							
	TOMA PARA CABLEVIDEO		⊘		⊘					
	CAJA MEDIDOR Y TABLERO DE ENTRADA								⊘	
INST. GAS	PICOS PARA CALEFON O TERMOTANQUE Y COCINA			⊘						
	PICO PARA CALEFACTOR		⊘							
	NICHO REGULACION Y MEDICION								⊘	
PINTURA	CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO		⊘							
	CARPINTERIA DE MADERA: 1 MANO TAPAPOROS 2 MANOS BARNIZ				⊘		⊘			
	ESTRUCTURA DE TECHOS:2 MANOS ANTIOXIDO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CIELORRASO PLACA DE YESO :PREPINTADO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CIELORRASO MADERA: TRATAMIENTO INSECTICIDA CARA VISTA: 1 MANO DE BARNICETA 2 MANOS DE BARNIZ									
	EN MUROS INTERIORES : A LA CAL		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	EXTERIORES : LATEX p/EXTERIORES	⊘						⊘		
VIDRIOS	DOBLES TRANSPARENTES		⊘	⊘	⊘	⊘				
	TRANSLUCIDOS						⊘			
MESADA	ACERO INOXIDABLE			⊘						

PLANO	INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
06	TEMA: TECHO DIGNO	
	PLANO DE: PLANILLA DE LOCALES-	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos


INSTALACIONES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO 2016


I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

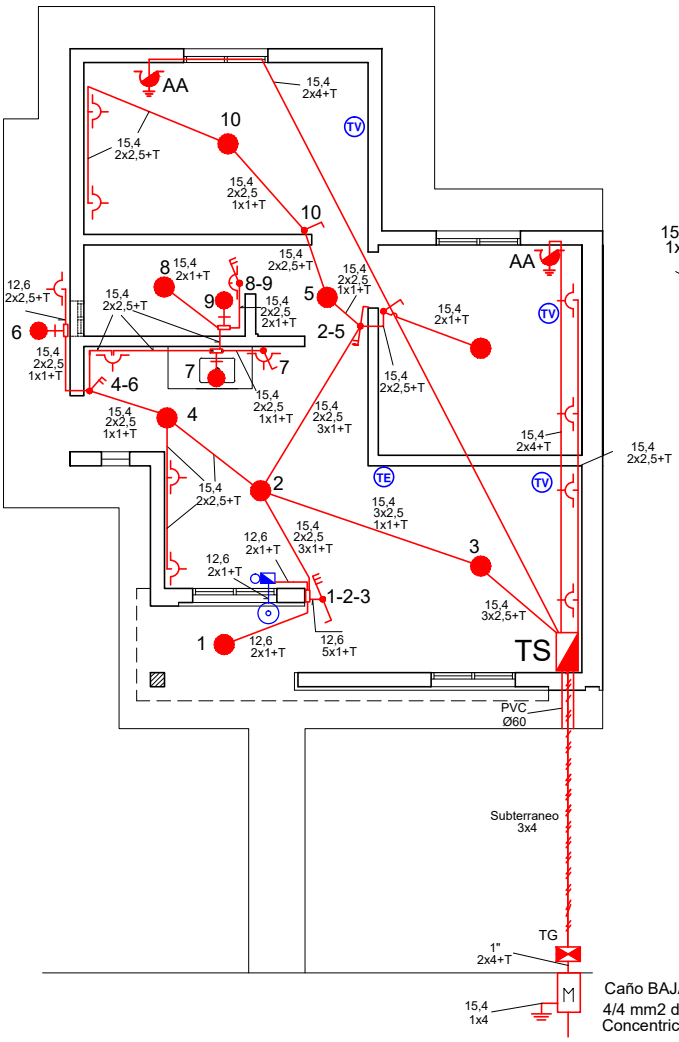

ESQUEMA CONEXION

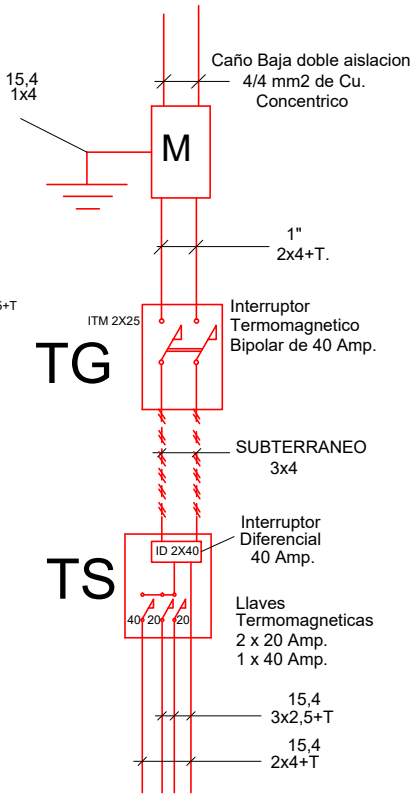

PLANTA GENERAL

PROTOTIPO 55,00m2

NOTA:

Las Cañerias seran de acero semipesado, las cajas de de chapa Nº 20 y los conectores de chapa galvanizada, o de cañeria de PVC rigido normalizado para su uso en instalaciones electricas internas.

DETALLE DE LA INST.	
MEDIDOR MONOF.	1
TAB.GRAL.	1
TAB.SECC.	1
CENTRO DE LUZ	8
BRAZO DE LUZ	3
TOMACORRIENTE	12
TOMACORRIENTE (AA)	2
TIERRA ELECTRICA	1
CAMP.ELECTRICA Incluido pulsador campanilla	1
TELEVISION	3
TELEFONO	1

PLANO 07	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:100
	PLANO DE: Instalación Electrica Interna	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANO 08


INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO DE: Instalación Sanitaria Interna


ESC: 1:100

FECHA: 2016

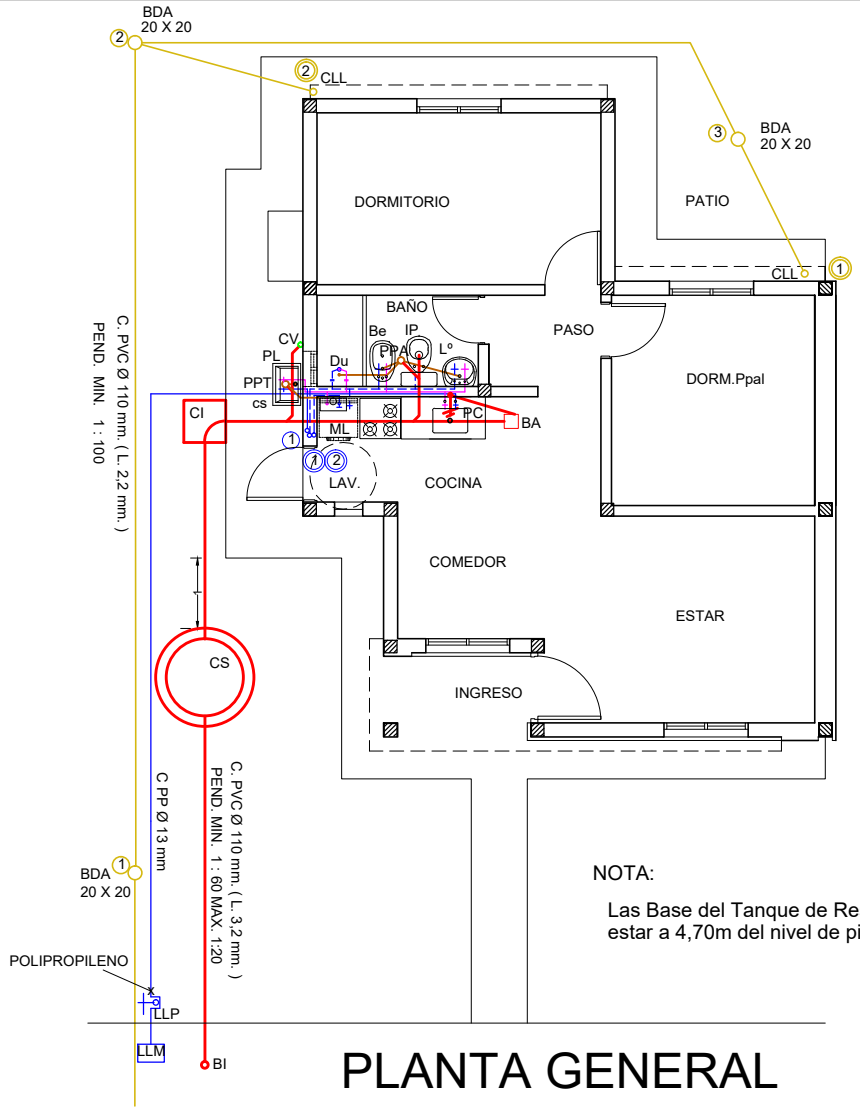

PLANTA GENERAL

PROTOTIPO 55,00m2

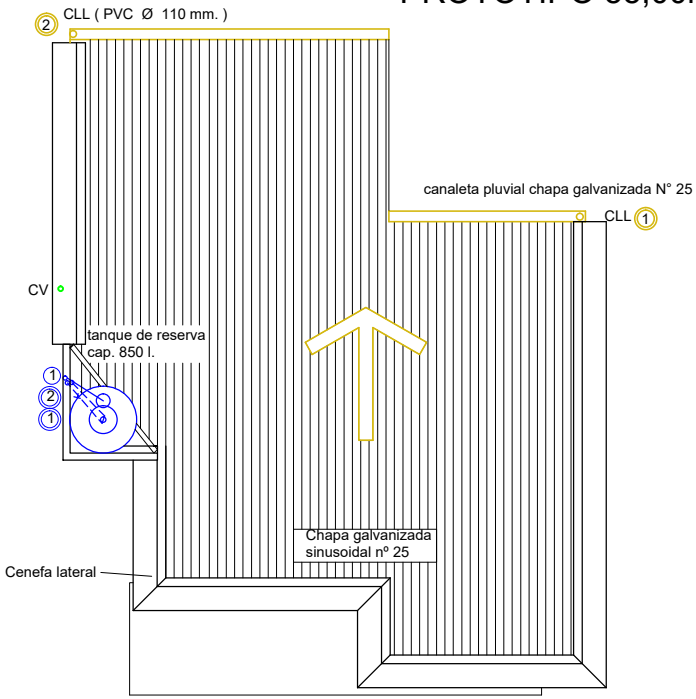

PLANTA DE TECHOS

NOTA:

Las Base del Tanque de Reserva (TR) debera estar a 4,70m del nivel de piso terminado del baño

CUADRO DE RESUMEN

DESIGNACION	CAÑERIAS DEDESAGUES PRIMARIOS Nº	MAT.	Ø	CAÑERIAS DEDESAGUES PLUVIALES Nº	MAT.	Ø
TRAMO	1	PVC	110	1-2	PVC	110
HORIZ. COLUMNA	⁄	⁄	⁄	1	PVC	110
COLUMNA	⁄	⁄	⁄	2	PVC	110
PP	2	PVC	63			
IP	1	PVC	110			
B.ACC.	1	PVC	110			
B.I.	1	PVC	110			
C.S.	1	PVC	110			

VENTILACIONES	DESIG.	Nº	MAT.	Ø
	HOR. COL.	1	PVC	63
	COL.	1	PVC	63

DESIG.	B.D.A. Nº	B.D.T. 1 a 2


ARTEFACTOS Y ACCESORIOS	
BAÑO	IP - DAI - Lº 2CS- DU 2CS-Be 2CS 2LLP- PPA Ø63 - DESCØ40
P.C.	2 CS - SIF. BA. Ø50 - DESC. Ø63
P.L.	2 CS PPT-DESC. Ø40

CAÑERIAS DE AGUA


CONEXION: PPR Ø 13 mm
SUBIDA A.T.R.: PPR.Ø 13mm
BAJADA A CAL.: PPR.Ø 19mm
BAJADA AGUA FRIA: PPR Ø 13mm
DISTRIB. A.F. Y A. CAL: PPR Ø 13mm

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

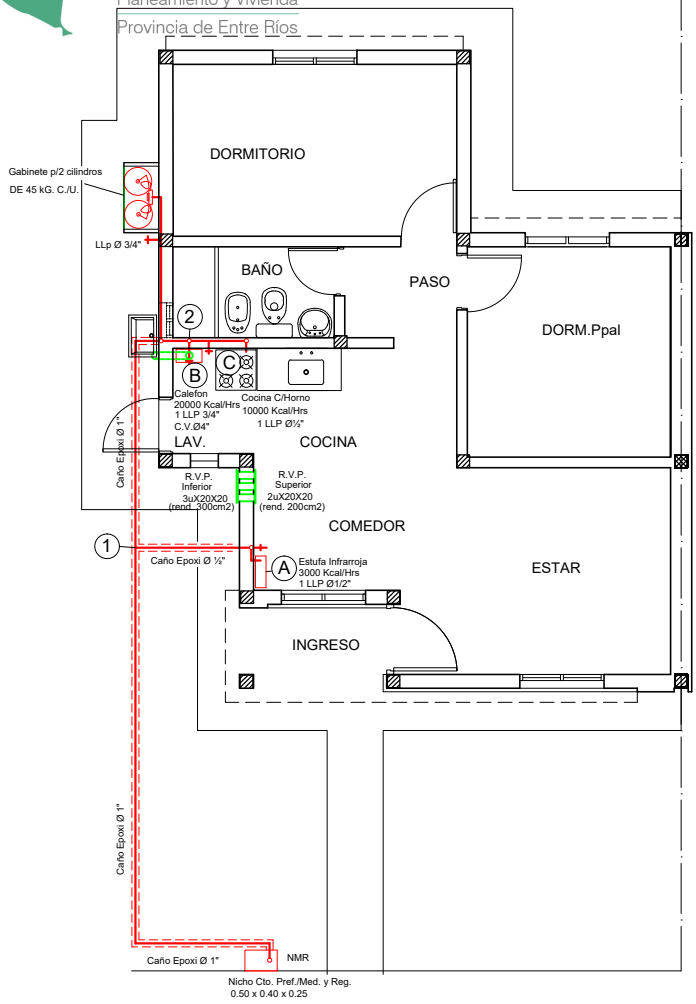

PLANTA GENERAL

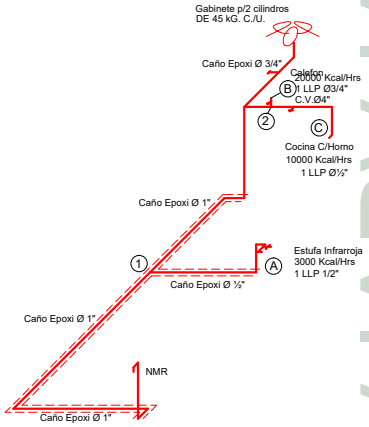

AXONOMETRIA

cañería con revestimiento epoxi

CALCULO DE DIAMETROS para Cañeria EPOXI							
TRAMO	LONGITUD Real	LONGITUD Cálculo	LONGITUD Equivalente	LONGITUD Total	Consumos		Diámetros
					Kcal./hs.	m3/hs.	Ø
C - 2	1,25	14,55	8,44	22,99	1000	1,07	1/2"
B - 2	0,25	13,55	9,69	23,24	20000	2,15	3/4"
2 - 1	5,00	14,55	9,69	24,24	30000	3,22	1"
A - 1	1,80	10,10	6,28	16,38	3000	0,32	1/2"
1 - NMR	8,30	14,55	9,69	24,24	33000	3,54	1"

PLANO 09	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:100
	Cálculo de Cañerias de Instalacion Gas -Combinada	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE DE ABERTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO


2016

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

P1

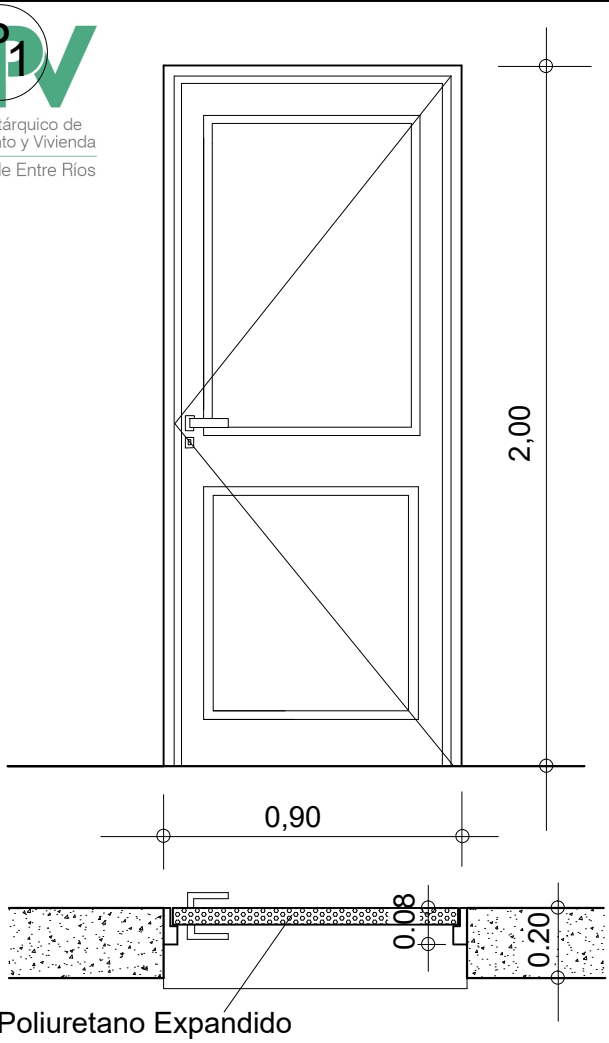


TIPOLOGIA	PUERTA INGRESO
MARCO	Aluminio Linea Standart 4 GRAMPAS DE AMURAR BURLETES PERIMETRALES DE GOMA
HOJA	HOJA DE ABRIR, PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS CERRADURA DOBLE PALETA, MANIJA BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)
OBSERVACIONES	

PLANO 10	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE:PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

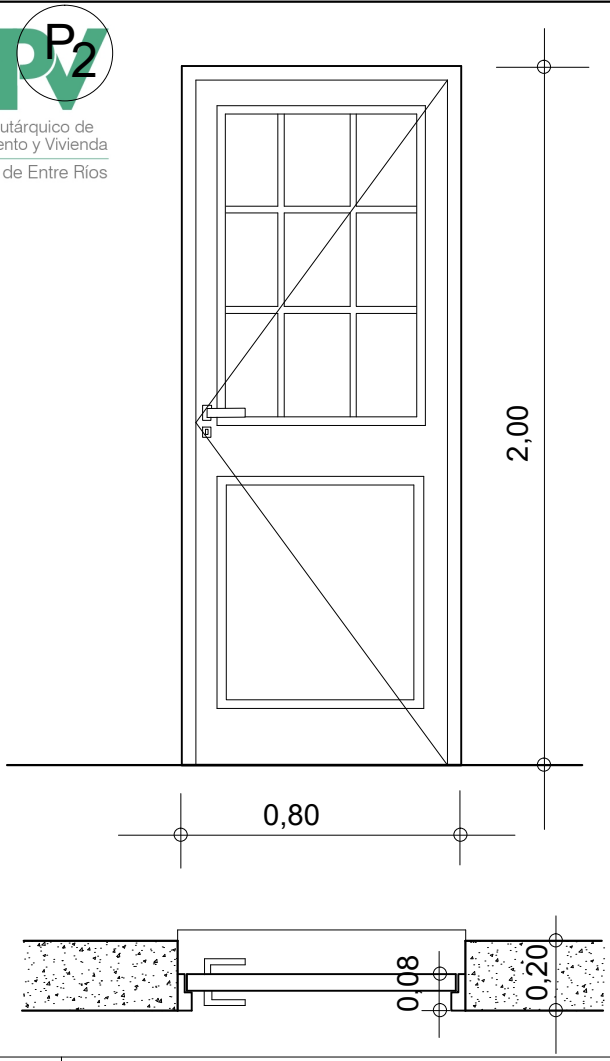

TIPOLOGIA	PUERTA SALIDA A PATIO
MARCO	PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD PERIMETRAL, CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE ESCUADRAS. GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
HOJA	HOJA DE ABRIR, PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD. PAÑO DE VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER-SAL. PAÑO SUPERIOR CON BRAZO DE EMPUJE.
HERRAJES	MANIJA BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)
OBSERVACIONES	

PLANO 11	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	PLANO DE: PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA: 2016

IAPV/IAPV/IAPV/IAPV/IAPV/IAPV/IAPV/IAPV

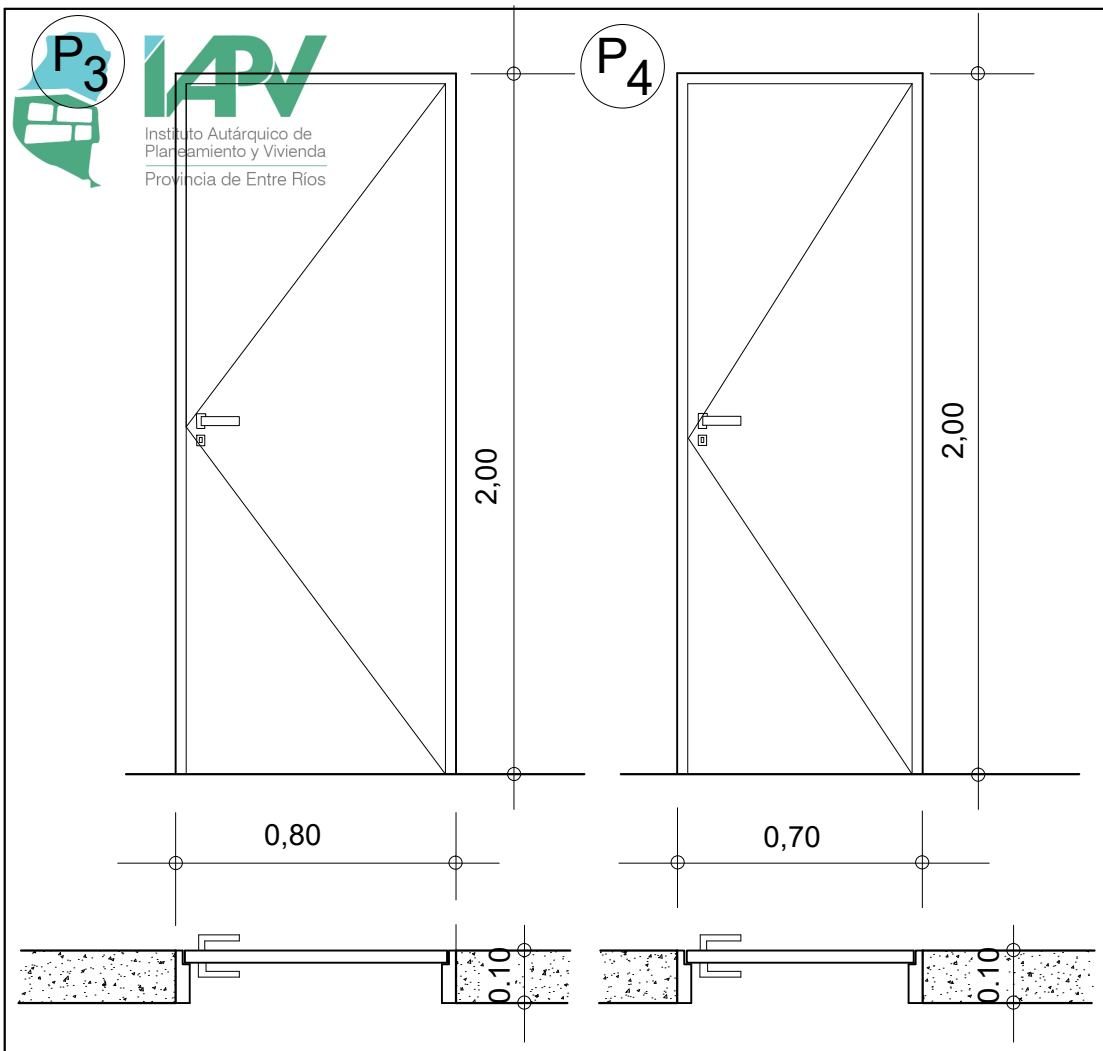


MARCO	CAJON CHAPA PLEGADA D.D. B.W.G. Nº 18 4 GRAMPAS DE AMURAR
HOJA	PLACA TERCIADO DE PINO DE 35 mm. DE ESPESOR INTERIOR NIDO DE ABEJA
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIO	
HERRAJES	3 FICHAS REFORZADAS, MANIJA DE BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN , CERRADURA COMUN.
PINTURA	MARCO 1 MANO ANTIOX.,2 MANOS ESMALTE SINTETICO HOJA 1 MANO TAPAPOROS, 2 MANOS BARNIZ.
OBSERVACIONES	DOBLE CONTACTO ENTRE LAS PUERTAS Y HOJAS

PLANO 12	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE:PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV

V1

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

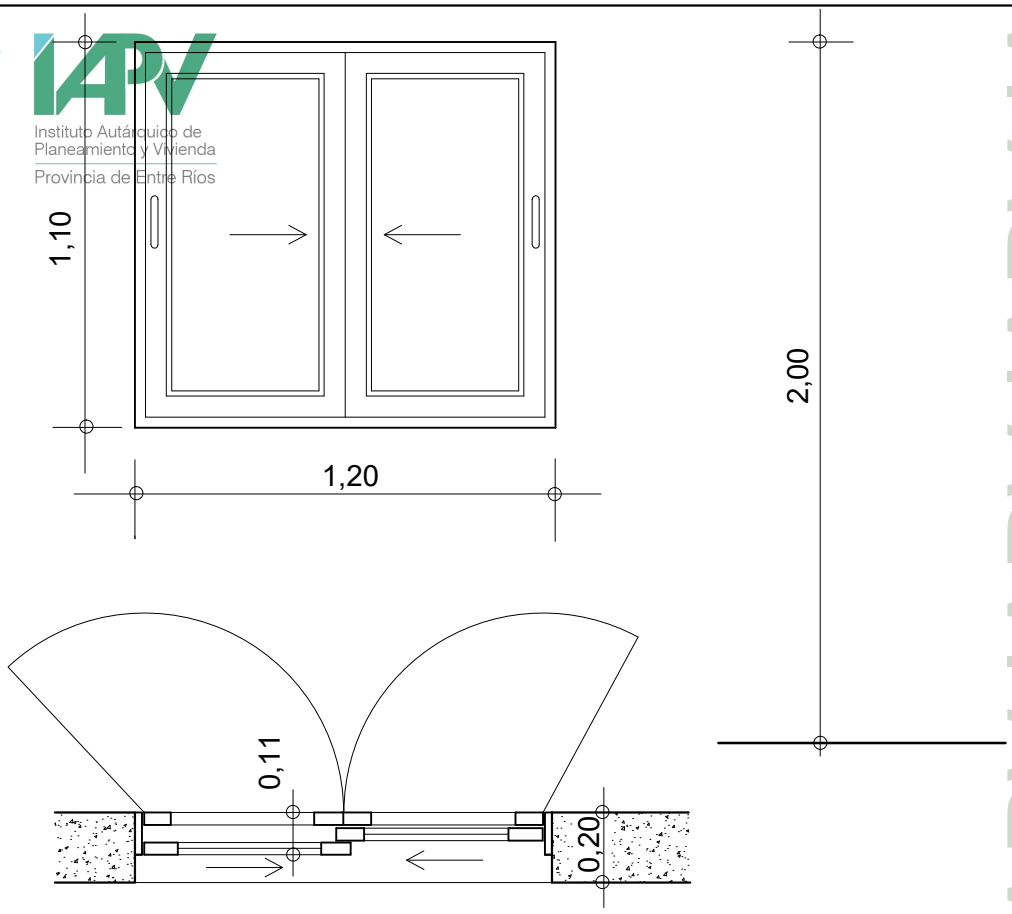

TIPOLOGIA	VENTANA CORREDIZA O SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL
MARCO	MARCO UNIFICADO DE PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD,PERIMETRAL DE 13,5 cm. CON UNIONES A 45 º POR MEDIO DE ESCUADRAS. GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
HOJA	DOS HOJAS CORREDIZAS PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD CON SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO. VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER-SAL.
HERRAJES	TIRADORES LATERALES DE POLIMERO. DISPOSITIVO ANTIRRUIDO. CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN OPCION BLANCO.
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO COLOR BLANCO)
OBSERVACIONES	


PLANO 13	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE:PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


V1'

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

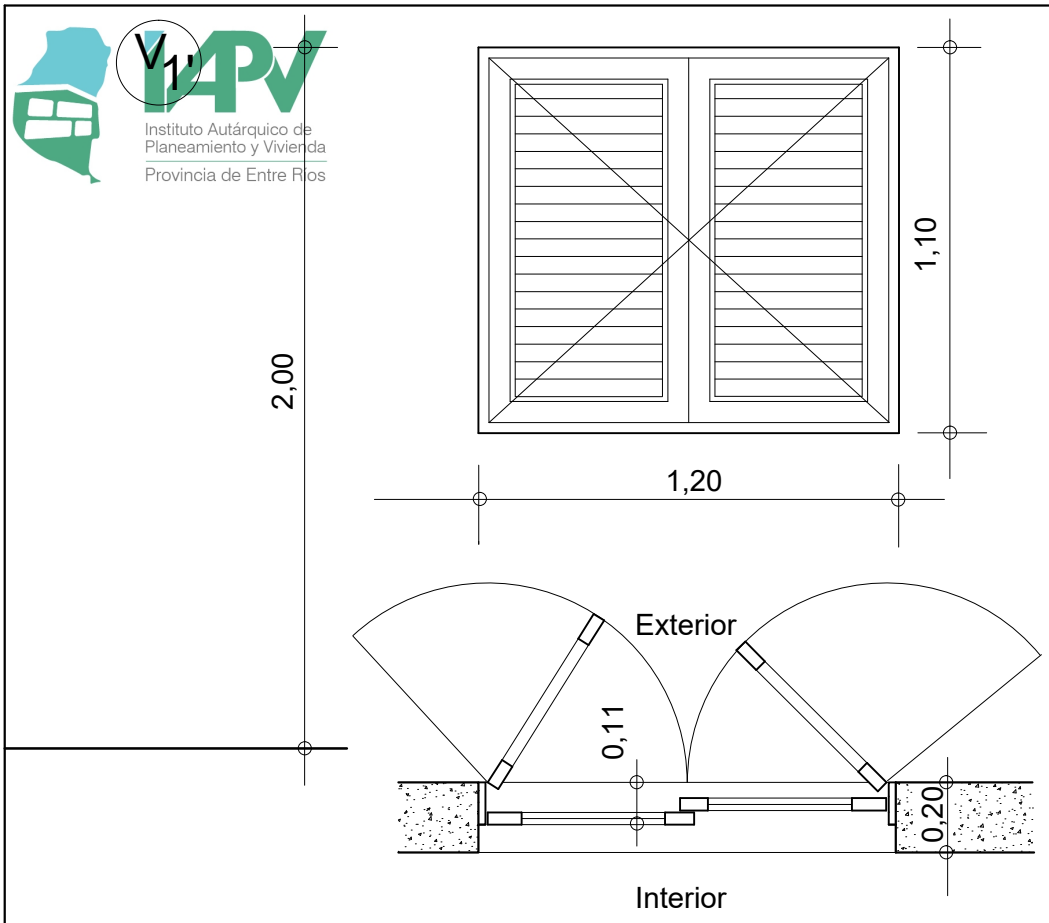

TIPOLOGIA	CELOSIA DE ALUMINIO DE REBATIR
MARCO	IDEM V1
HOJA	DOS HOJAS REBATIBLES TABLILLAS DE CELOSIAS DE 70 MM DE ALTO CON CALADO PARA VENTILACION.
HERRAJES	CIERRE CENTRAL FALLEBA EMBUTIR BRONCE PLATIL BISAGRAS ENCOLIZADAS CON REGULACION DE ALTURA SELLADO PERIMETRAL CON FELPA DE POLIPROPILENO SILICONADO.
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO COLOR BLANCO)
OBSERVACIONES	COLOCAR A PLOMO EXTERIOR


PLANO 14	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE:PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA:2016

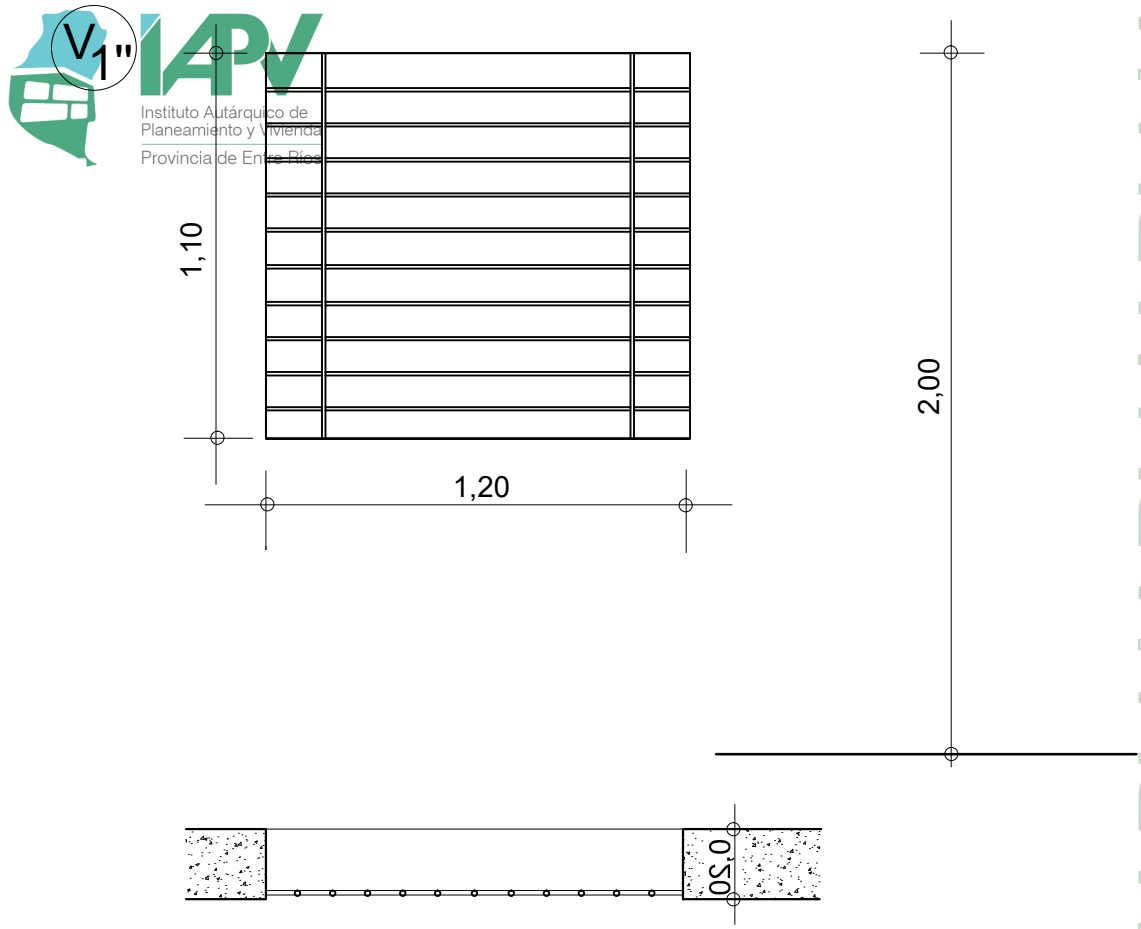

TIPOLOGIA	REJA DE HIERRO DE DIAMETRO 12, LISO CON PLANCHUELA
MARCO	AMURADO
HOJA	
HERRAJES	
PINTURA	ANTIOXIDO MAS SINTETICO COLOR BLANCO
OBSERVACIONES	

PLANO 15	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE:PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

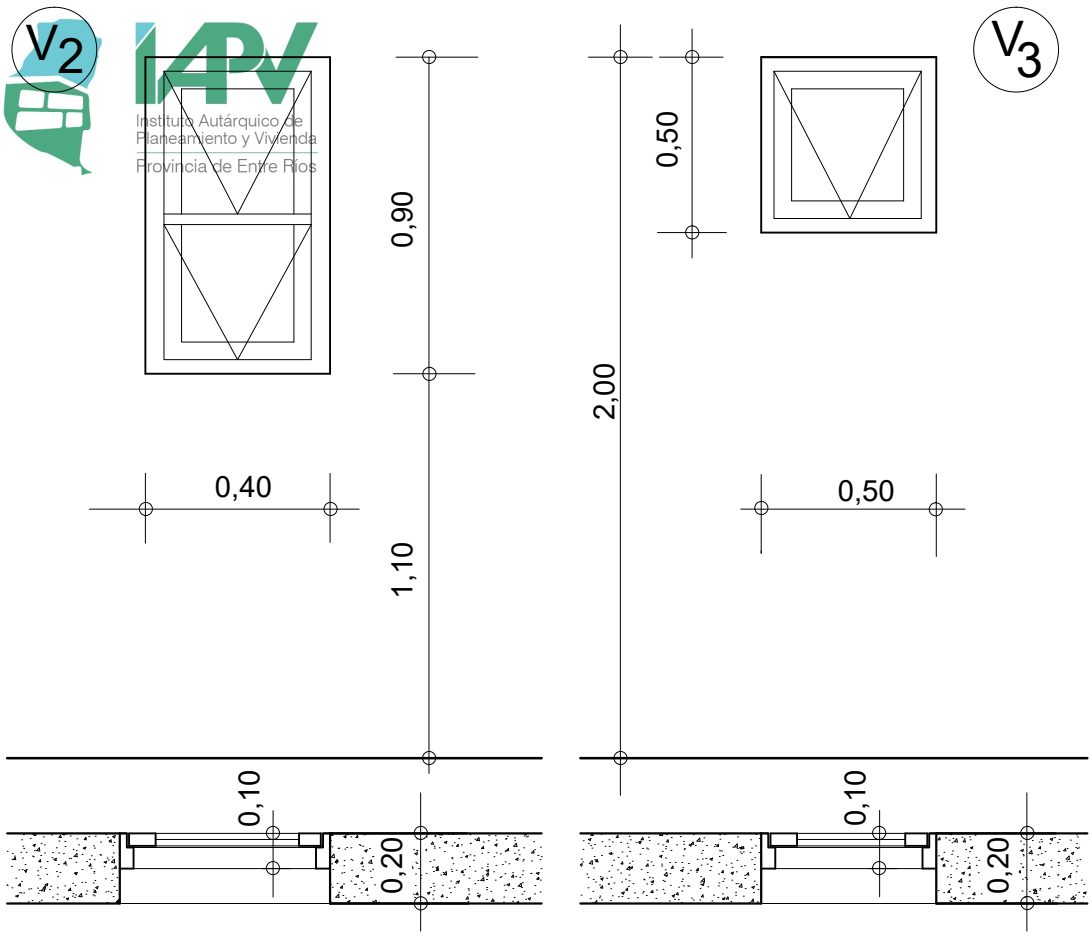

TIPOLOGIA	VENTANA REBATIBLE
MARCO	PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD PERIMETRAL DE 75mm. CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE ESCUADRAS. GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
HOJA	Ventana c/ sistema de proyeccion hacia el exterior mediante Brazo de Empuje PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVERSAL
HERRAJES	TIRADORES LATERALES DE POLIMERO. DISPOSITIVO ANTIRRUIDO. CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN OPCION BLANCO.
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

PLANO 16	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE:PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

ESTRUCTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO


I.A.P.V.

AGOSTO 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE FUNDACION

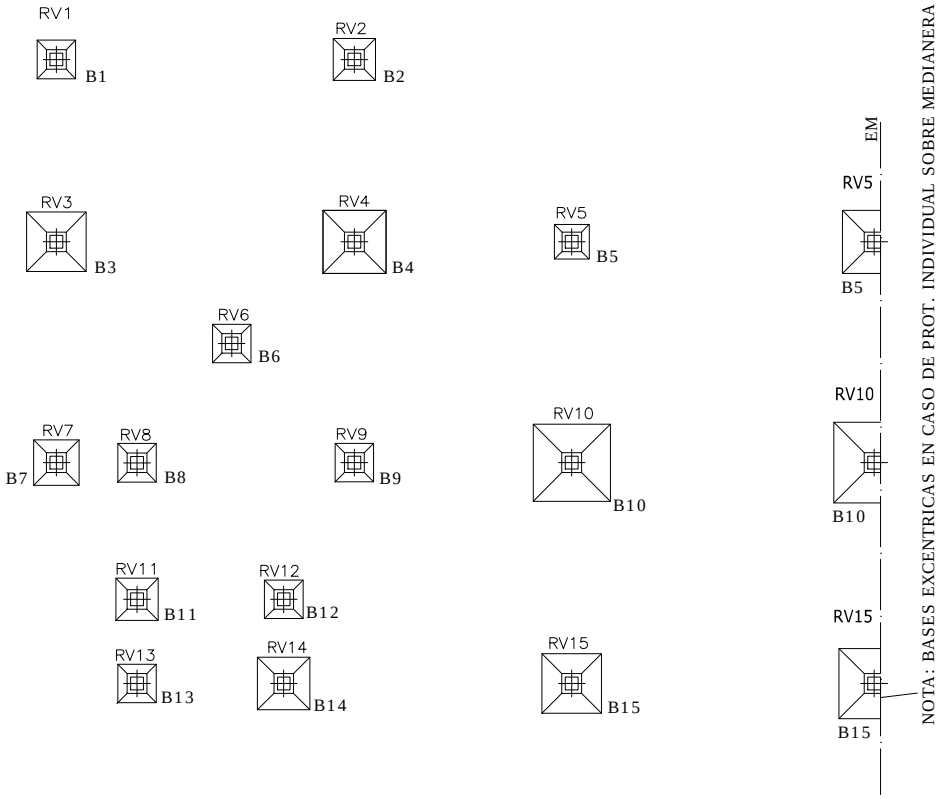

HORMIGON H-20
ACERO ADN420

RV: RIOSTRAS VERTICALES 18x18 - 4Ø8, est.1Ø4.2 c/15cm
LAS RIOSTRAS VERTICALES LLEGAN HASTA LA ALTURA SUPERIOR DE LA MAMPOSTERIA
LOS FUSTES DE LAS RIOSTRAS VERTICALES SON DE 23x23 cm Y EN EL CASO DE
EL DE LAS BASES EXCÉNTRICAS VAN ARMADOS CON 4Ø12. est. 1Ø6 c/15cm.-
Pf: -1.10m de T.N. (estimada, ver informe geotécnico).-


NOTA: En el caso que el Estudio de Suelos recomiende la ejecución de platea, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente, conforme al Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas Particulares, y la misma formará parte de la propuesta básica.

PLANO 17	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO 55 m2	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCTURA DE FUNDACION	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE ENCADENADOS INFERIORES

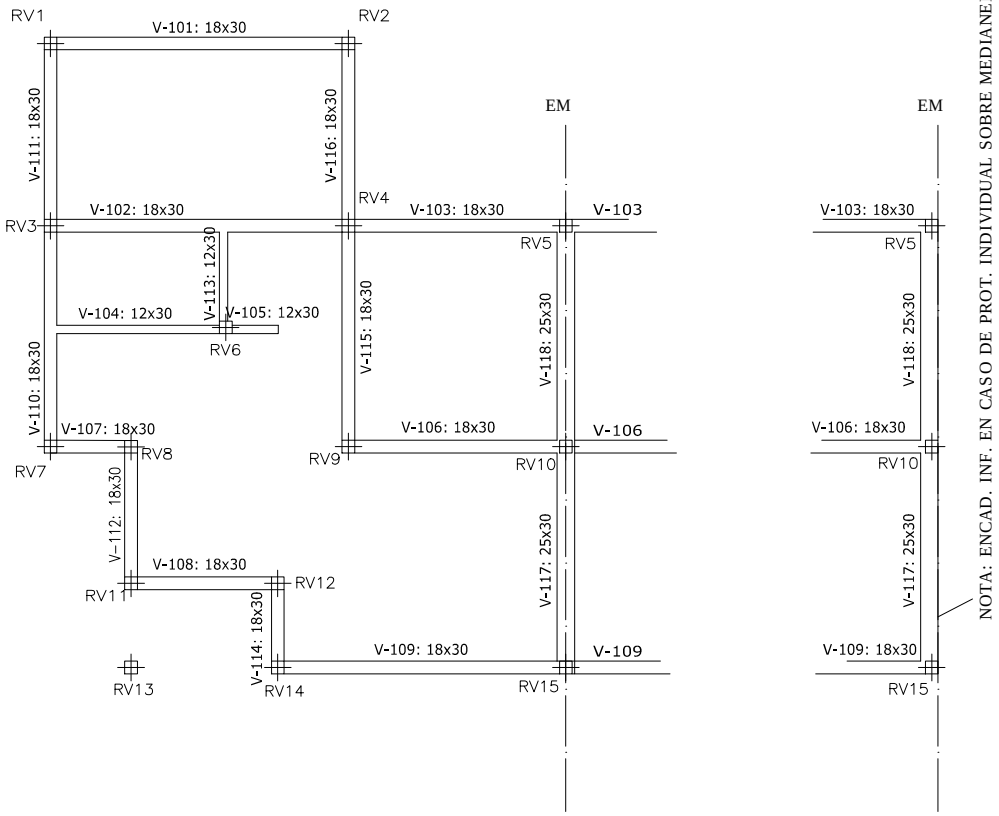

NOTA: ENCAD. INF. EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL SOBRE MEDIANERA


HORMIGON H-20
ACERO ADN420

PLANO 18	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO 55m2	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCT. DE ENCAD. INFERIORES	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE ENCADENADOS SUPERIORES

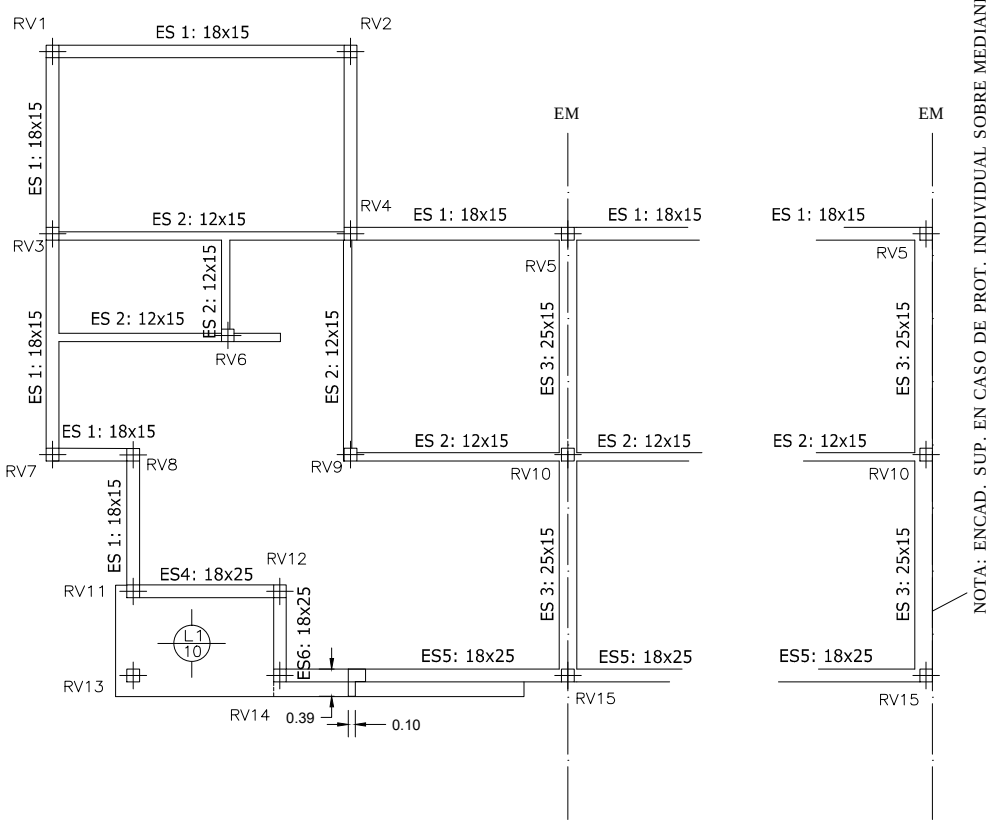

NOTA: ENCAD. SUP. EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL SOBRE MEDIANERA

HORMIGON H-20
ACERO ADN420


LOSA L1: LLENA Armadura Inferior 1Ø6 c/15 cm, ambos sentidos → 8 ⊂ 25 ⊃ —(en Vigas)

PLANO 19	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO 55m2	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCT. DE ENCAD. SUPERIORES	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

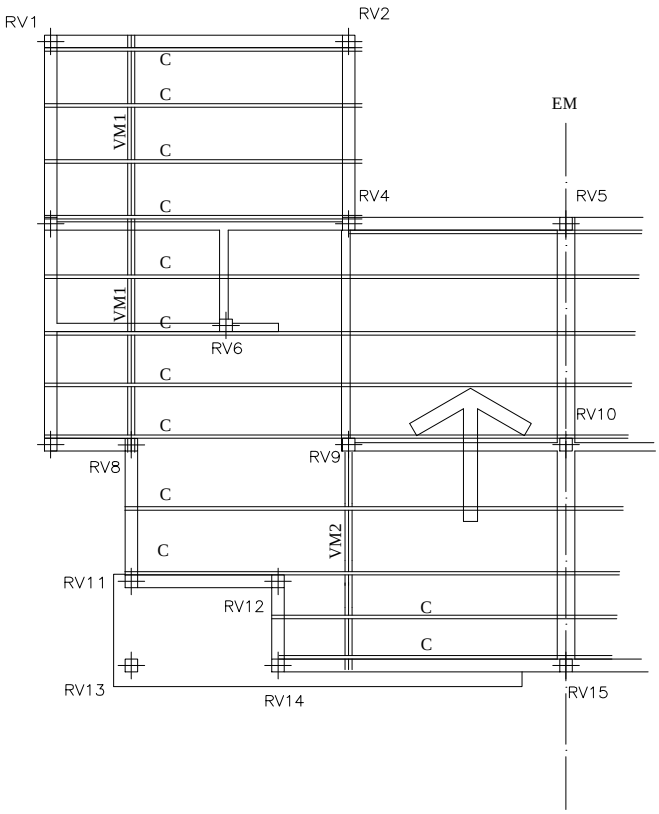

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 25
C: correas (clavadores) en un perfil C de 80x40x15 de 1.60 mm
VM1: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C compuestas de dos C de 80x40x15 de 1.60mm
VM2: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C compuestas de dos C de 100x50x15 de 1.60mm


Los perfiles C (clavadores) van anclados a los Encadenados Superiores en su punto de apoyo.-


PLANO 20	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO 55m2	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Planilla de:	**BASES CENTRADAS**	Hormigón:	H-20	T.A.Suelo	**1,00** kg./cm2
Obra:	**TECHO DIGNO - PROT. 55m2 - APAREADO**	Acero:	A.D.N. 420	Profundidad:	**- 1,10** T.N.
Planta:	**FUNDACION**				
Fecha:	**04-08-16**				



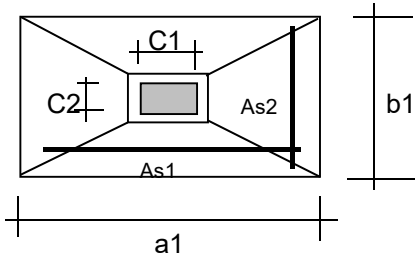


				HORMIGON									ARMADURAS								
Posic.	N	Pt.	S	**a1**	**b1**	d	C1	C2	h	**do**	M1	M2	As1			As2			V	OBSERV.
	tn	tn	m2	**cm**	**cm**	cm	cm	cm	cm	**cm**	tncm	tncm	cm2	Nº	Ø	cm2	Nº	Ø	m3	**Tens. Trab.**
B1	2,66	2,87	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,95**
B2	2,89	3,12	0,31	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,26	5	8	0,26	5	8	0,063	**0,87**
B3	5,89	6,36	0,64	**85**	**85**	15	**23**	**23**	25	**30**	33	33	0,63	7	8	0,63	7	8	0,157	**0,88**
B4	7,21	7,79	0,78	**90**	**90**	15	**23**	**23**	25	**30**	45	45	0,85	7	8	0,85	7	8	0,175	**0,96**
B5	4,12	4,45	0,44	**70**	**70**	15	**23**	**23**	20	**25**	16	16	0,38	7	8	0,38	7	8	0,097	**0,91**
B6	2,08	2,25	0,22	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,15	5	8	0,15	5	8	0,053	**0,74**
B7	3,22	3,48	0,35	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	9	9	0,29	5	8	0,29	5	8	0,063	**0,97**
B8	2,65	2,86	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,95**
B9	2,42	2,61	0,26	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,18	5	8	0,18	5	8	0,053	**0,86**
B10	10,17	10,98	1,10	**110**	**110**	15	**23**	**23**	30	**35**	87	87	1,35	9	8	1,35	9	8	0,285	**0,91**
B11	2,82	3,05	0,30	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,25	5	8	0,25	5	8	0,063	**0,85**
B12	2,20	2,38	0,24	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,16	5	8	0,16	5	8	0,053	**0,79**
B13	0,90	0,97	0,10	**55**	**55**	15	**23**	**23**	11	**16**	2	2	0,09	5	8	0,09	5	8	0,047	**0,32**
B14	4,76	5,14	0,51	**75**	**75**	15	**23**	**23**	20	**25**	21	21	0,50	7	8	0,50	7	8	0,111	**0,91**
B15	6,70	7,24	0,72	**90**	**90**	15	**23**	**23**	25	**30**	42	42	0,79	7	8	0,79	7	8	0,175	**0,89**


I.A.P.V. Las Bases deberán ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 1

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Planilla de:	**BASES CENTRADAS**	Hormigón:	H-20	T.A.Suelo	**1,00** kg./cm2
Obra:	**TECHO DIGNO - PROT. 55m2 - INDIVIDUAL**	Acero:	A.D.N. 420	Profundidad:	**- 1,10** T.N.
Planta:	**FUNDACION**				
Fecha:	**04-08-16**				



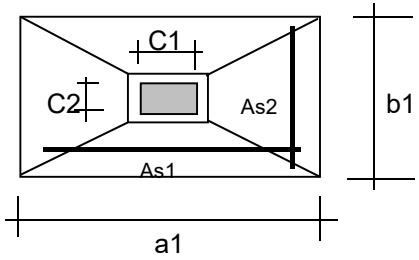


				HORMIGON									ARMADURAS							
Posic.	N	Pt.	S	**a1**	**b1**	d	C1	C2	h	**do**	M1	M2	As1			As2			V	OBSERV.
	tn	tn	m2	**cm**	**cm**	cm	cm	cm	cm	**cm**	tncm	tncm	cm2	Nº	Ø	cm2	Nº	Ø	m3	**Tens. Trab.**
B1	2,66	2,87	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,95**
B2	2,89	3,12	0,31	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,26	5	8	0,26	5	8	0,063	**0,87**
B3	5,89	6,36	0,64	**85**	**85**	15	**23**	**23**	25	**30**	33	33	0,63	7	8	0,63	7	8	0,157	**0,88**
B4	7,21	7,79	0,78	**88**	**88**	15	**23**	**23**	25	**30**	43	43	0,82	7	8	0,82	7	8	0,169	**1,00**
B6	2,08	2,25	0,22	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,15	5	8	0,15	5	8	0,053	**0,74**
B7	3,22	3,48	0,35	**65**	**65**	15	**23**	**23**	15	**20**	11	11	0,35	5	8	0,35	5	8	0,073	**0,82**
B8	2,65	2,86	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,95**
B9	2,44	2,64	0,26	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,18	5	8	0,18	5	8	0,053	**0,87**
B11	2,82	3,05	0,30	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,25	5	8	0,25	5	8	0,063	**0,85**
B12	2,20	2,38	0,24	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,16	5	8	0,16	5	8	0,053	**0,79**
B13	0,90	0,97	0,10	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	2	2	0,07	5	8	0,07	5	8	0,053	**0,32**
B14	4,76	5,14	0,51	**75**	**75**	15	**23**	**23**	20	**25**	21	21	0,50	7	8	0,50	7	8	0,111	**0,91**


IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Planilla de: **BASES EXCENTRICAS**
Obra: **TECHO DIGNO - PROT. 55m2 - INDIVIDUAL**
Ubicación: **FUNDACION**
Fecha: **04-08-16**

Hormigón: H-20 T.A.Suelo **1,00** kg./cm2
Acero: A.D.N. 420 Profundidad: **- 1,10** T. N.



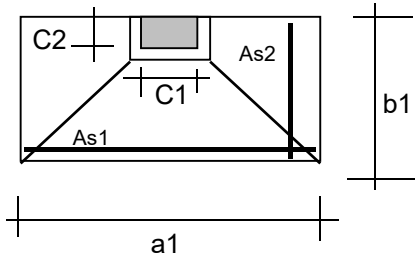

				HORMIGON									ARMADURAS							
Posic.	P	Pt.	S	**a1**	**b1**	**d**	C1	C2	h	**do**	M1	M2	As1			As2			V	OBSERV.
	tn	tn	m2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	tncm	tncm	cm2	Nº	Ø	cm2	Nº	Ø	m3	**Tens. Trab.**
B5	3,23	3,49	0,35	**70**	**55**	20	**23**	**23**	25	**30**	13	30	0,24	5	8	0,57	7	8	0,096	**0,91**
B10	9,03	9,75	0,98	**145**	**70**	20	**23**	**23**	45	**50**	116	142	1,21	7	8	1,49	11	8	0,333	**0,96**
B15	5,16	5,57	0,56	**105**	**55**	20	**23**	**23**	30	**35**	41	48	0,65	5	8	0,75	9	8	0,156	**0,96**

I.A.P.V. Las Bases deberan ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 3

IAPV IAPV IAPV

IAPV Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Provincia de Entre Ríos

ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. INFERIORES

Sistema de unidades: M K S
Luz (m)
Momentos (t·m)
Áreas (cm²)
Corte (t)

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cor
V-101(RV1-**RV2**)	18			-----	0.00	-----	-----	-----	1.53	-1.53
Arm.Montaje: 2Ø8			0.90	1						
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10										
Estribos: 1eØ6c/0.20										

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.		A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-102(RV3-**RV4**)	18 X 30			-----	-1.00	-----	-----	1.65	1.13	-1.65
Arm.Superior: ----- 4Ø8			0.70	1.10	0.20	1.26	2.07	0.48		
Arm.Montaje: 2Ø8										
Arm.Inferior: 2Ø12										
Estribos: 1eØ6c/0.20										
V-103(RV4-RV5)	18 X 30	3.10	-1.00	-----	0.00	1.66	-----	-----	1.48	-0.84
			-----	0.50	0.30	-----	0.89	0.59		
Arm.Superior: 4Ø8 -----										
Arm.Montaje: 2Ø8										
Arm.Inferior: 2Ø8										
Estribos: 1eØ6c/0.20										
V-103(RV4-RV5)	18 X 30	3.10	-1.00	-----	0.00	1.66	-----	-----	1.48	-0.84
Tensor: 0.34cm2			-----	0.50	0.30	-----	0.89	0.59		
Arm.Superior: 4Ø8 -----										
Arm.Montaje: 2Ø8										
Arm.Inferior: **2Ø10**										
Estribos: 1eØ6c/0.20										

V-103 EN CASO DE PROTOTIPO INDIVIDUAL CON BASES EXCÉNTRICAS

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-104(A0-RV6)	12 X 30	2.50	0.00	-----	-0.10	-----	-----	0.32	0.62	-0.72
Arm.Montaje: 2Ø8			0.20	0.40	0.10	0.36	0.71	0.32		
Arm.Inferior: 2Ø8										
Estribos: 1eØ6c/0.20										
V-105(RV6-)	12 X 30	0.75	-0.10	-----	0.00	0.32	0.32	0.32	0.38	-0.00
Arm.Montaje: 2Ø8			-----	0.00	-----	-----	-----	-----		
Arm.Inferior: 2Ø8										
Estribos: 1eØ6c/0.20										

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-106(RV9-**RV10**)	18			-----	0.00	-----	-----	-----	0.93	-0.92
			0.40	0.70	**0.40**		1.34	0.71		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 3Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	**M.Cent.**	M.Der.	A.Izq.		r.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-106(RV9-RV10)	**18** X 30		0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.93	-0.92
Tensor:1.33cm2			0.40	0.70	**0.40**		1.34	0.71		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: **3Ø12**
Estribos: 1eØ6c/0.20

V-106 EN CASO DE PROTOTIPO INDIVIDUAL CON BASES EXCÉNTRICAS

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-107(RV7-**RV8**)	18			-----	0.00	-----	-----	-----	0.65	-0.66
			0.10	0.20	**0.10**		0.48	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-108(RV11-RV12)	18 X 30	2.09	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.72	-0.72
			0.20	0.40	0.20	0.48	0.71	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-109(RV14-RV15)	18 X 30	4.11	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	1.48	-1.48
			0.80	1.50	0.80	1.44	2.80	1.44		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10
Estribos: 1eØ6c/0.20

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.I	Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.
V-109(RV14-RV15)	18 X 30		0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	1.48	-1.48
Tensor:0.54cm2			0.80	1.50	0.80		2.80	1.44		
Arm.Montaje:	2Ø8									
Arm.Inferior:	**3Ø12**									
Estribos:	1eØ6c/0.20									

V-109 EN CASO DE PROTOTIPO INDIVIDUAL CON BASES EXCÉNTRICAS

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	C	er.
V-110(RV7-**RV3**)	18 X 30			-----	-1.10	-----	-----	1.81	1.97	-2.17
			0.90	1.50	0.10		2.72	0.48		
Arm.Superior:	-----	4Ø8+1Ø8								
Arm.Montaje:	2Ø8									
Arm.Inferior:	2Ø12, 1Ø10									
Estribos:	1eØ6c/0.20									
V-111(RV3-RV1)	18 X 30		-1.30	-----	0.00		0.51	-----	1.45	-0.39
			-----	0.10	0.10	-----	0.48	0.48		
Arm.Superior:	4Ø8+1Ø8	-----								
Arm.Montaje:	2Ø8									
Arm.Inferior:	2Ø8									
Estribos:	1eØ6c/0.24(2.42)									

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-112(RV11-RV8)	18 X 30	1.95	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.78	-0.78
			0.20	0.40	0.20	0.48	0.72	0.48		
Arm.Montaje:	2Ø8									
Arm.Inferior:	2Ø8									
Estribos:	1eØ6c/0.20									

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-113(RV6-A1)	12 X 30	1.45	0.00	-----	0.00	0.32	-----	-----	0.38	-0.33
			0.10	0.10	0.10	0.32	0.32	0.32		
Arm.Montaje:	2Ø8									
Arm.Inferior:	2Ø8									
Estribos:	1eØ6c/0.20									

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.		A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-114(RV14-RV12)	18 X 30		0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.38	-0.39
			0.10	0.10	0.10		0.48	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.		Cort.Izq.	Cort.Der.
V-115(RV9-RV4)	18			-----	-0.50	-----	-----	0.86	0.74	-1.08
			0.30	0.50	-----	0.55	0.90	-----		
V-116(RV4-RV2)	18 X 30		-0.50	-----	0.00		-----	-----	1.13	-0.72
			-----	0.40	0.20	-----	0.69	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-117(RV15-RV10)	25 X 30	3.15	0.00	-----	-1.50	-----	-----	2.63	2.18	-3.21
			0.90	1.40	-----	1.62	2.62	-----		
V-118(RV10-RV5)	25 X 30	3.15	-1.50	-----	0.00	2.64	-----	-----	3.01	-1.99
			-----	1.30	0.80	-----	2.34	1.47		

V-117(RV15-RV10)
Arm.Superior: ----- 4Ø8+1Ø12
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 3Ø12
Estribos: 1eØ6c/0.20

V-118(RV10-RV5)
Arm.Superior: 4Ø8+1Ø12 -----
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 3Ø12
Estribos: 1eØ6c/0.20

NOTA: EN TODOS LOS CASOS DE CONTINUIDAD DE VIGAS, LA ARMADURA SUPERIOR EN EL APOYO SE ESTABLECE CON LA PROLONGACION DE LA ARMADURA SUPERIOR(PERCHAS) HACIA LA VIGA ADYACENTE UNOS 80cm, LO MISMO PARA ÉSTA: 2Ø8+2Ø8=2.0cm2 MAS (+) EL ADICIONAL CUANDO CORRESPONDA.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. SUPERIORES

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES 1	18 X 15		----	-----	-----	----	-----	---	----	-----
			----	-----	-----	----	-----	---	----	-----

Arm.Superior: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ4.2c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES 2	12 X 15		----	-----	-----	----	-----	---	----	-----
			----	-----	-----	----	-----	---	----	-----

Arm.Superior: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ4.2c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES 3	25 X 15		----	-----	-----	----	-----	---	----	-----
			----	-----	-----	----	-----	---	----	-----

Arm.Superior: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ4.2c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES-4 (RV11-RV12)	**18 X 25**	2.09	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.37	-0.38
			0.10	0.20	0.10	0.39	0.47	0.39		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.15

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES-5 (RV14-RV15)	**18 X 25**	4.11	-0.10	-----	0.00	0.39	-----	-----	0.78	-1.01
			0.50	1.00	0.60	1.11	2.20	1.43		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12
Estribos: 1eØ6c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES- 6(RV14-RV12)	**18 X 25**	1.20	0.00	-----	0.00	0.39	-----	-----	0.15	-0.28
			0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.15

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

ANEXO II

PROTOTIPO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO SITUACIONES ESPECIALES 2016

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROTOTIPO 56,50 m2

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

2016

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

PLANO 17

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA


TEMA: TECHO DIGNO

PLANO DE: PLANTA GENERAL VIVIENDAS APAREADAS

PROTOTIPO DISC.

ESC: 1:100

FECHA: 2016

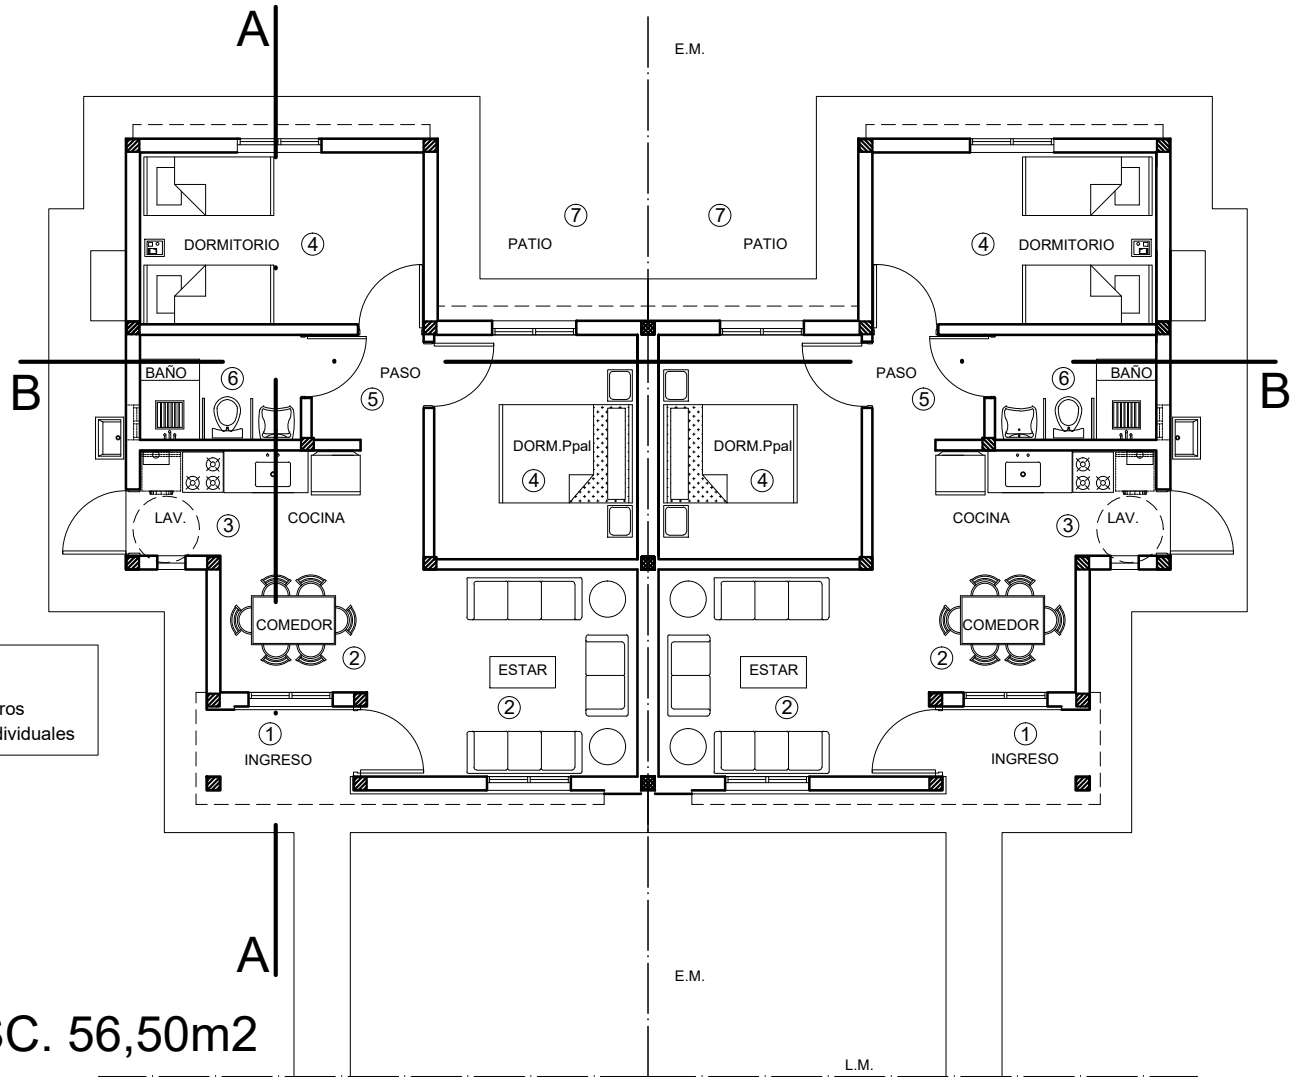

NOTA:

-Medianera espesor 0,30 metros en viviendas apareadas e individuales


PROTOTIPO DISC. 56,50m2

PLANTA GENERAL


IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

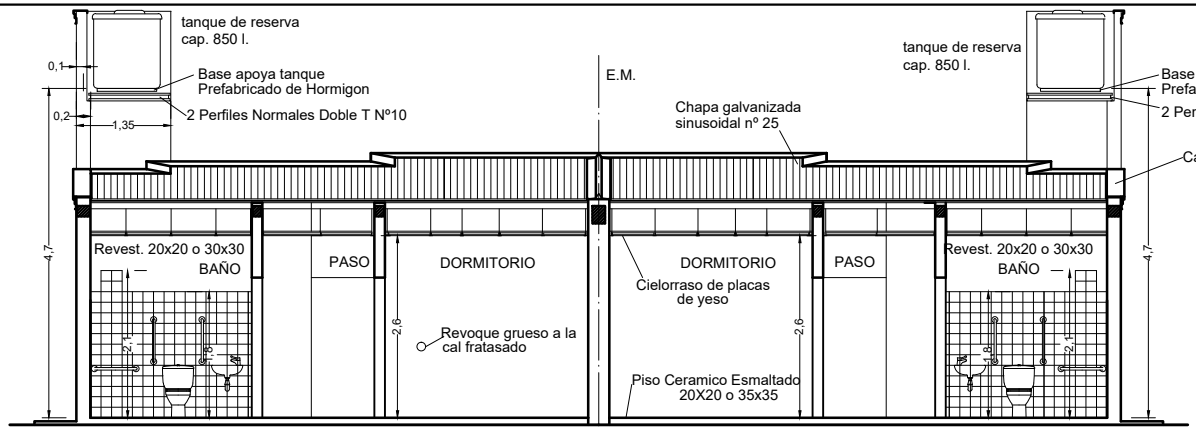


CORTE B-B

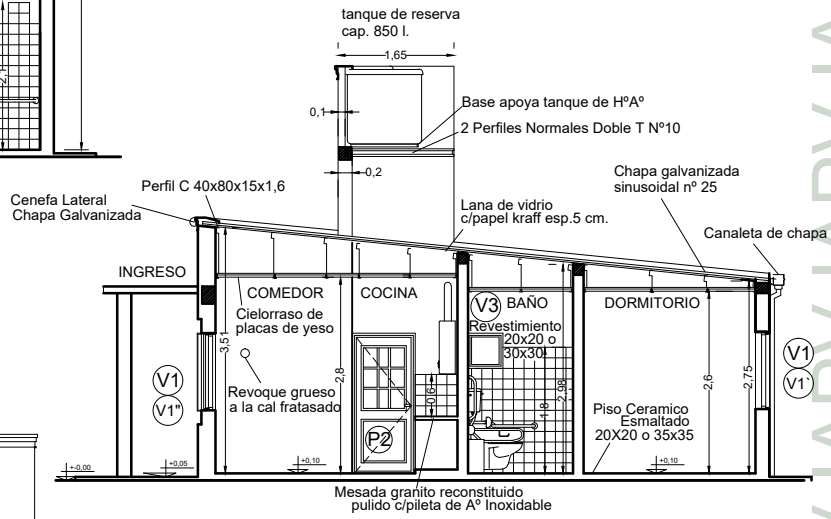

CORTE A-A

NOTA:

-Medianera espesor 0,30 metros
en viviendas apareadas e individuales

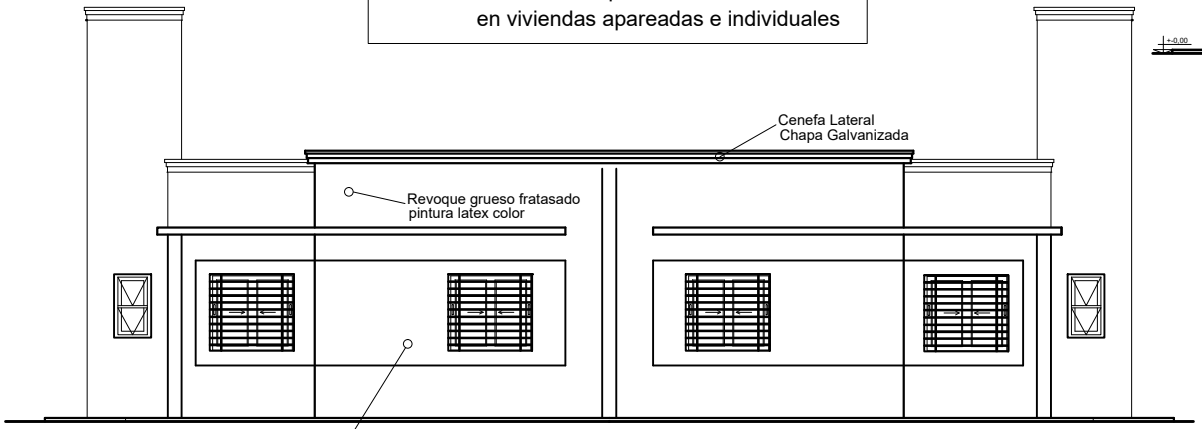

FACHADA

NOTA:

Los encadenados de arriostriamiento
iran acompañando la pendiente de la cubierta
excepto donde apoya la losa de ingreso

PLANO	INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA		
18	TEMA: TECHO DIGNO		ESC: 1:100
	PLANO DE: CORTES- FACHADA	PROTOTIPO DISC.	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV

PLANO 19

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA


TEMA: TECHO DIGNO

PLANO DE: PLANTA DE TECHOS VIVIENDAS APAREADAS PROTOTIPO DISC.

FECHA: 2016


ESC: 1:100

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

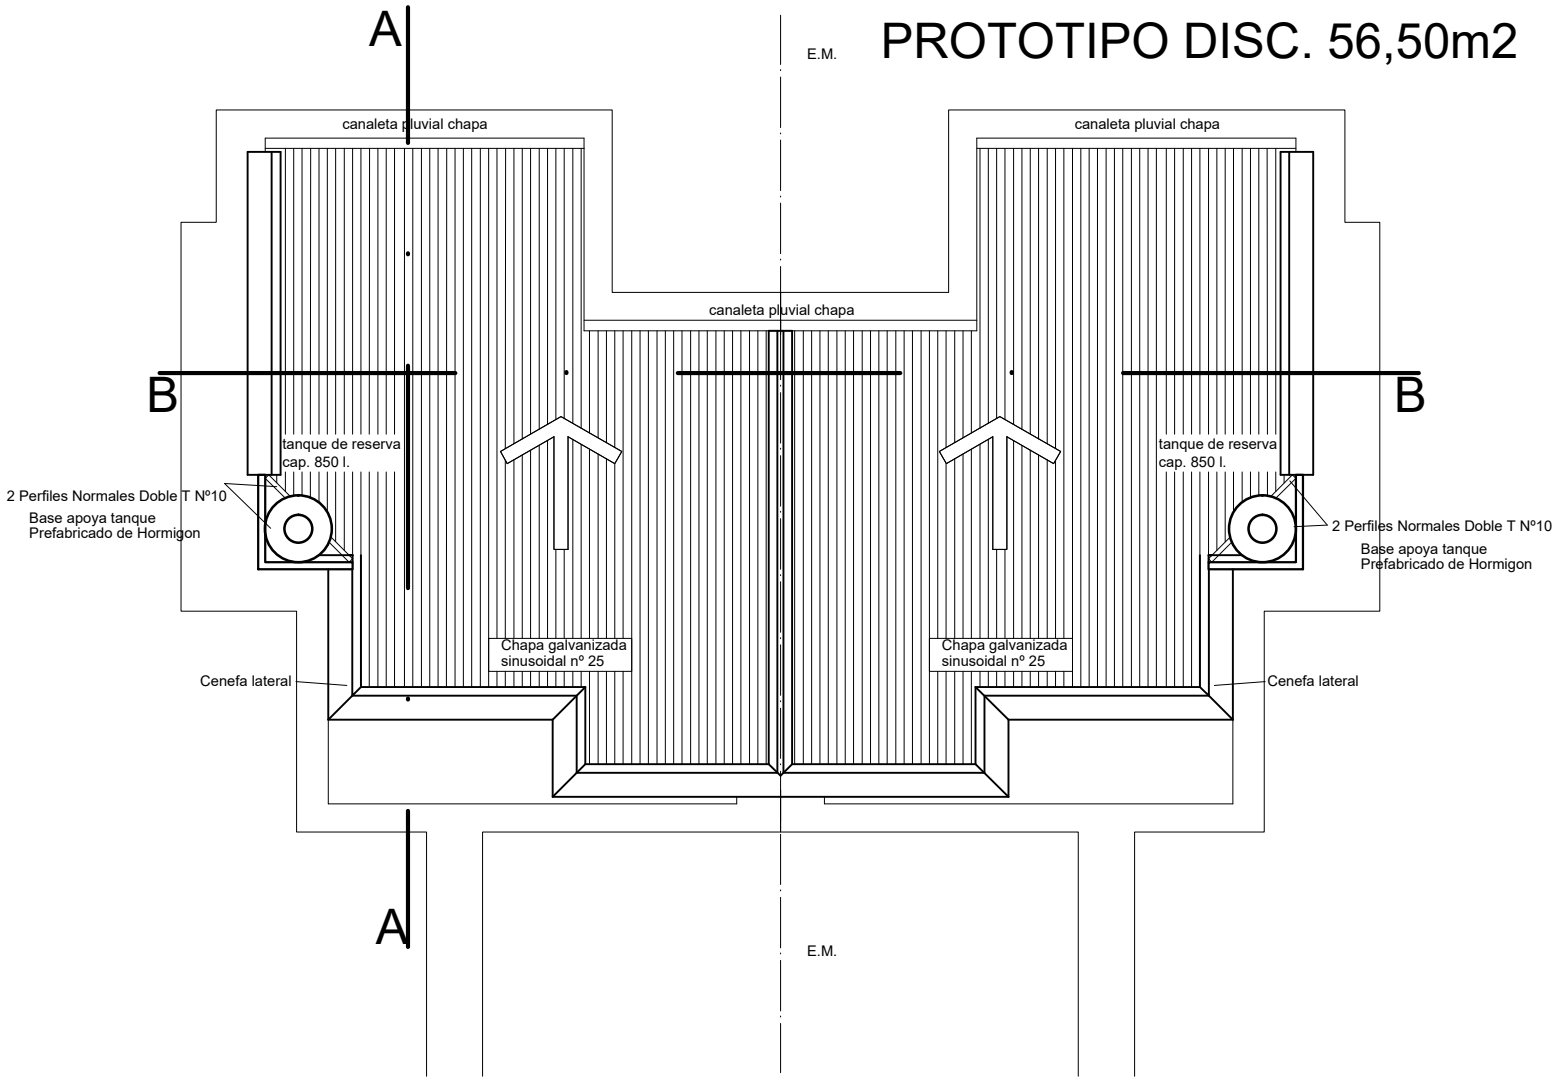

PLANTA DE TECHOS


IAPV IAPV IAPV

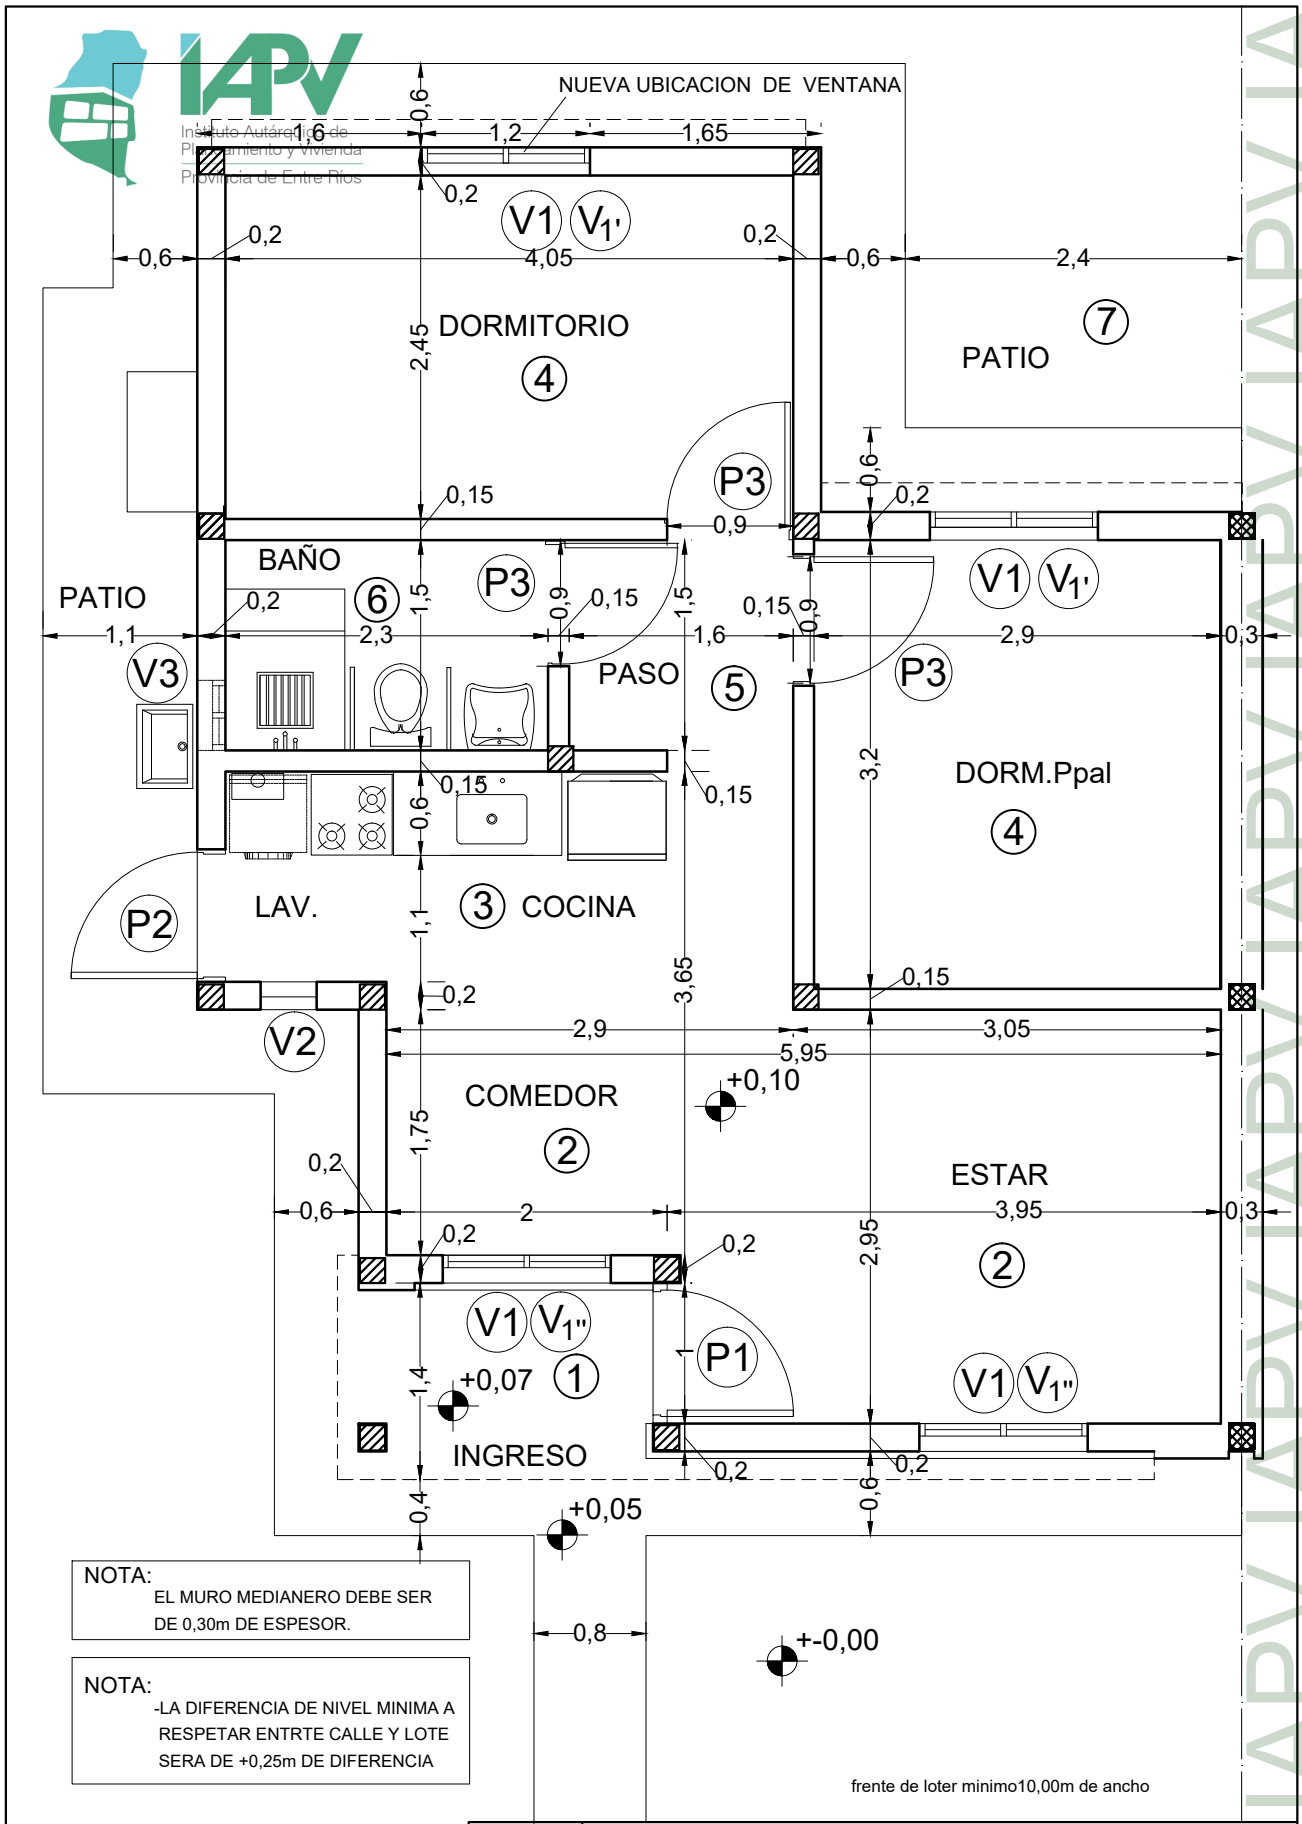

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

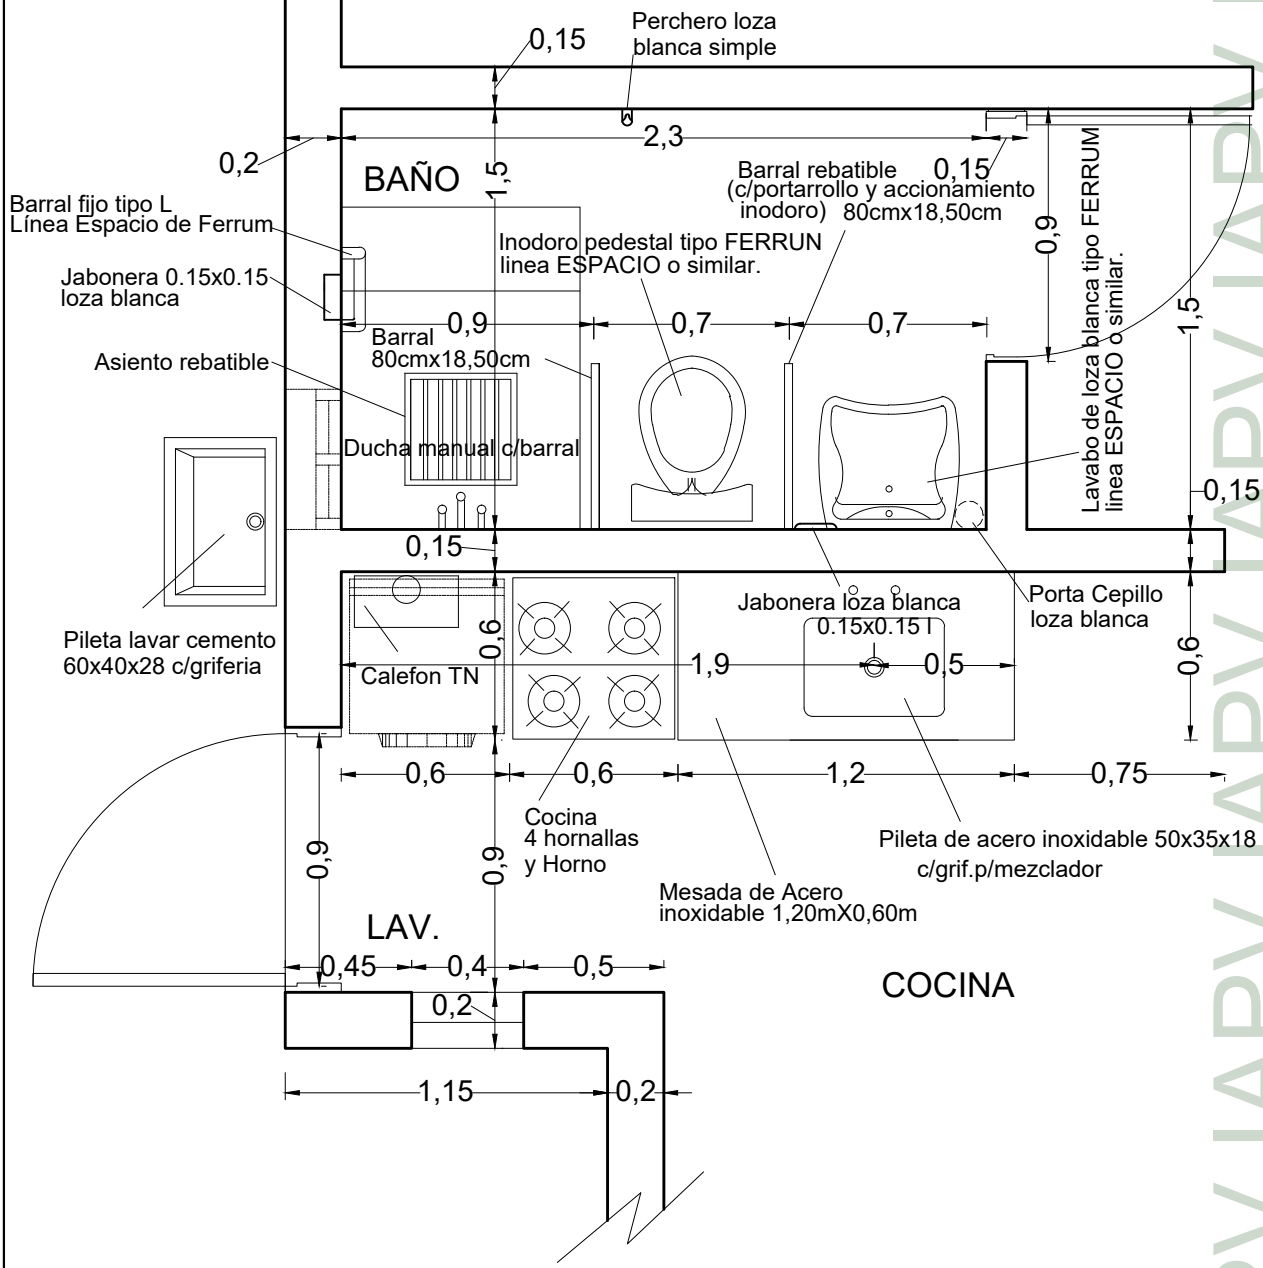

PLANO 21	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:25
	PLANO DE: DESARROLLO BAÑO Y COCINA	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANILLA DE LOCALES

RUBRO	TERMINACIONES	LOCALES								
		1 INGRESO	2 ESTAR-COMEDOR	3 COCINA - LAV.	4 DORMITORIOS	5 PASO	6 BAÑO	7 PATIO	8 LINEA MUNICIPAL	
CONTRAPISO	SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 12 CM.		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 10 CM	⊘						⊘		
SOLADOS	CERAMICO ESMALTADO 20X20		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CARPETA DE CEMENTO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CARPETA DE CEMENTO P/EXTERIOR EN VEREDAS	⊘						⊘		
ZOCALOS	CERAMICO ESMALTADO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
REVESTIMIENTO	AZULEJOS BLANCOS 15 X15			⊘			⊘			
MUROS	LADRILLO COMUN		⊘		⊘					
	LADRILLO CERAMICO	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘		
REVOQUE	IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO			⊘			⊘			
	INTERIOR: GRUESO FRATASADO A LA CAL		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	EXTERIOR: IMPERM. Y GRUESO FRATASADO	⊘						⊘		
CIELORRASO	DESMONTABLE CON PLACA DE YESO	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
CARPINTERIA	P1		⊘							
	P2			⊘						
	P3				⊘					
	P4						⊘			
	V1		⊘		⊘					
	V2			⊘						
	V3						⊘			
	V1´				⊘					
	V1"		⊘							
INST.SANITARIA	INODORO PEDESTAL LOZA BLANCA CON ASIENTO						⊘			
	BIDET LOZA BLANCA						⊘			
	LAVATORIO LOZA BLANCA CON GRIFERIA						⊘			
	1 PORTARROLLO-1TOHALLERO-2 JABONERAS-1 PERCHA						⊘			
	DUCHA COMPLETA (incluye brazo y flor)						⊘			
	PILETA DE AªINOX. 50x40x18 C/GRIF.P.MEZCLADOR			⊘						
	PILETA LAVAR CEMENTO 50x40x28 CON GRIFERIA			⊘						
INST. ELECTRICA	BRAZO			⊘			⊘	⊘		
	CENTRO	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	TIMBRE CAMPANILLA	⊘								
	TOMACORRIENTE		⊘	⊘	⊘		⊘	⊘		
	TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO				⊘					
	TOMA PARA TELEFONO		⊘							
	TOMA PARA CABLEVIDEO		⊘		⊘					
	CAJA MEDIDOR Y TABLERO DE ENTRADA								⊘	
INST. GAS	PICOS PARA CALEFON O TERMOTANQUE Y COCINA			⊘						
	PICO PARA CALEFACTOR		⊘							
	NICHO REGULACION Y MEDICION								⊘	
PINTURA	CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO		⊘							
	CARPINTERIA DE MADERA: 1 MANO TAPAPOROS 2 MANOS BARNIZ				⊘		⊘			
	ESTRUCTURA DE TECHOS:2 MANOS ANTIOXIDO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CIELORRASO PLACA DE YESO :PREPINTADO		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	CIELORRASO MADERA: TRATAMIENTO INSECTICIDA CARA VISTA: 1 MANO DE BARNICETA 2 MANOS DE BARNIZ									
	EN MUROS INTERIORES : A LA CAL		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘			
	EXTERIORES : LATEX p/EXTERIORES	⊘						⊘		
VIDRIOS	DOBLES TRANSPARENTES		⊘	⊘	⊘	⊘				
	TRANSLUCIDOS						⊘			
MESADA	ACERO INOXIDABLE			⊘						

PLANO 26	INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	
	PLANO DE: PLANILLA DE LOCALES — SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos


INSTALACIONES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO SITUACION ESPECIALES 2016


I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

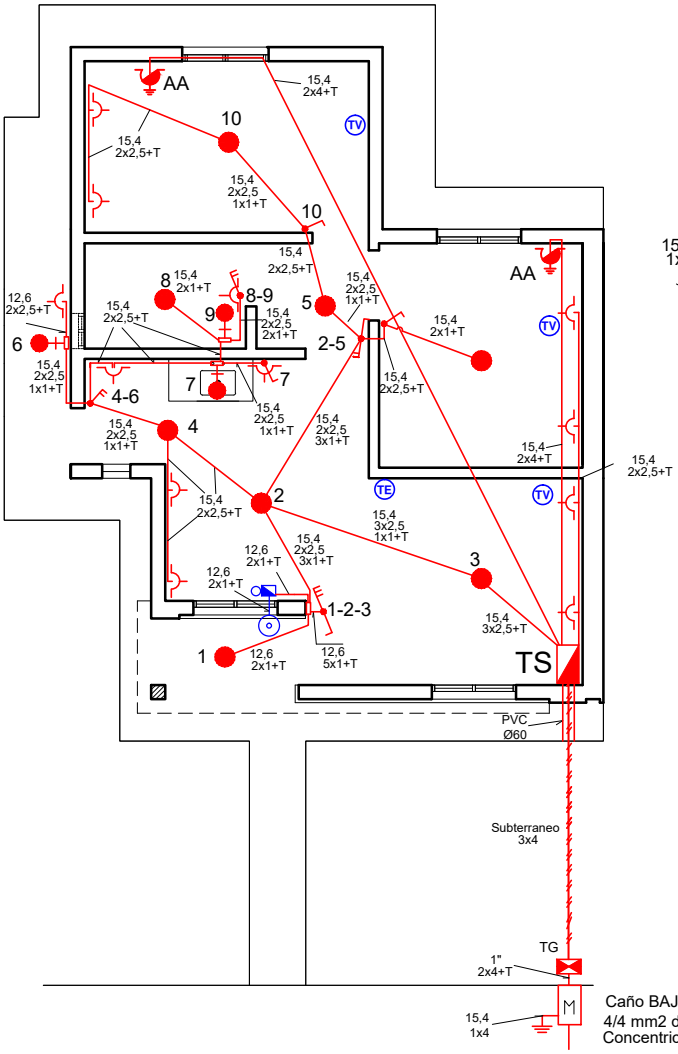

ESQUEMA CONEXION

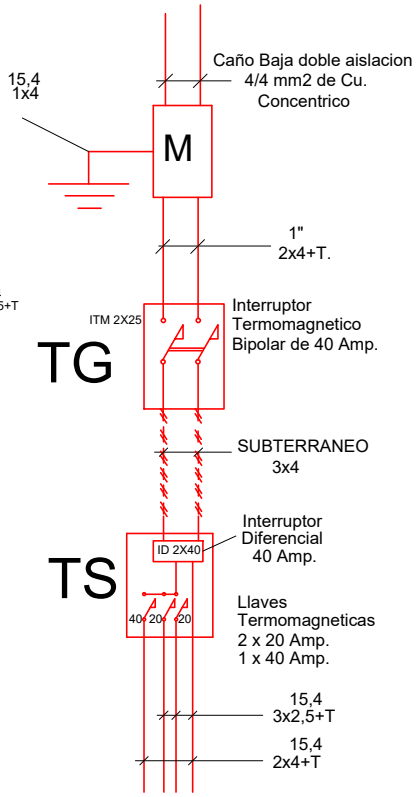

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

NOTA:

Las Cañerias seran de acero semipesado, las cajas de de chapa Nº 20 y los conectores de chapa galvanizada, o de cañeria de PVC rigido normalizado para su uso en instalaciones electricas internas.

DETALLE DE LA INST.	
MEDIDOR MONOF.	1
TAB.GRAL.	1
TAB.SECC.	1
CENTRO DE LUZ	8
BRAZO DE LUZ	3
TOMACORRIENTE	12
TOMACORRIENTE (AA)	2
TIERRA ELECTRICA	1
CAMP.ELECTRICA Incluido pulsador campanilla	1
TELEVISION	3
TELEFONO	1

PLANO 23	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:100
	PLANO DE: Instalación Electrica Interna PROTOTIPO DISC.	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANO 24

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA


TEMA: TECHO DIGNO

PLANO DE: Instalación Sanitaria Interna PROTOTIPO DISC.


ESC: 1:100

FECHA: 2016

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

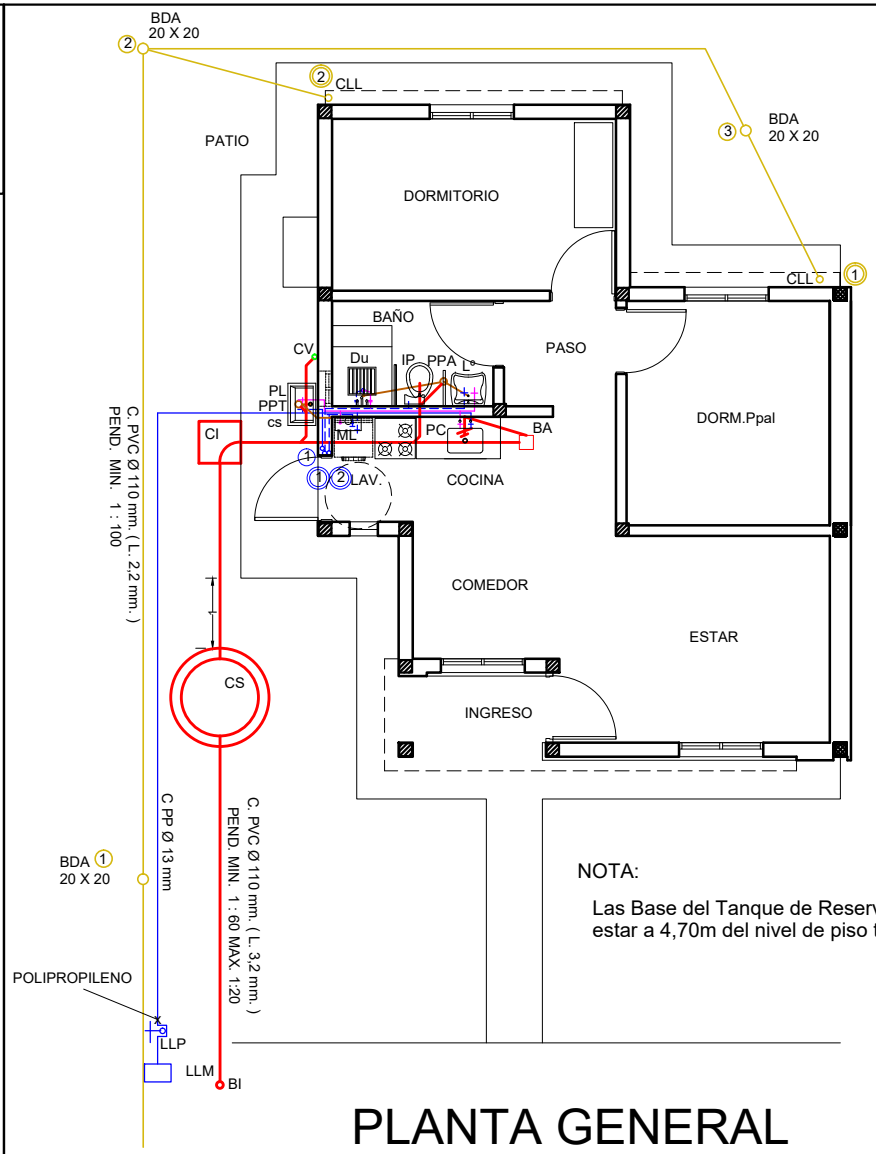

PLANTA GENERAL

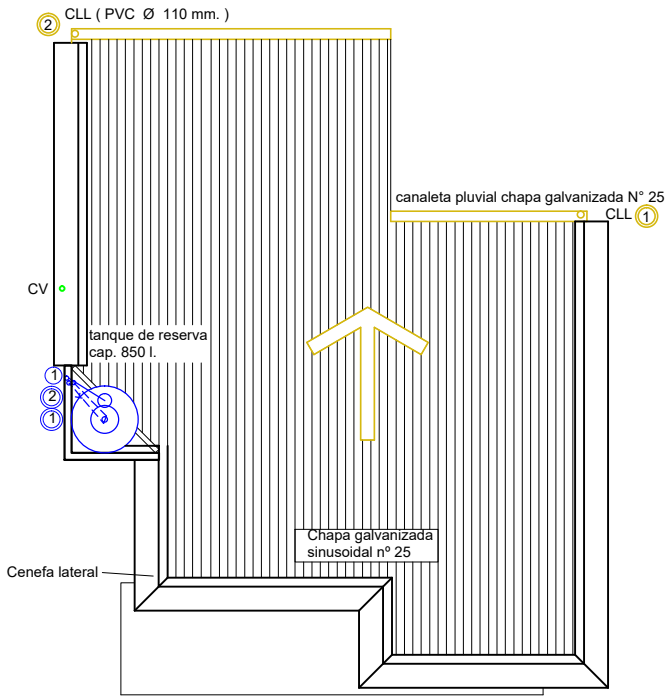

PLANTA DE TECHOS

NOTA:

Las Base del Tanque de Reserva (TR) debera estar a 4,70m del nivel de piso terminado del baño

CUADRO DE RESUMEN

DESIGNACION	CAÑERIAS DEDESAGUES PRIMARIOS Nº	MAT.	Ø	CAÑERIAS DEDESAGUES PLUVIALES Nº	MAT.	Ø
TRAMO	1	PVC	110	1-2	PVC	110
HORIZ. COLUMNA	/	/	/	1	PVC	110
COLUMNA	/	/	/	2	PVC	110
PP	2	PVC	63			
IP	1	PVC	110			
B.ACC.	1	PVC	110			
B.I.	1	PVC	110			
C.S.	1	PVC	110			

DESIG.	B.D.A. Nº	B.D.T. 1 a 2

VENTILACIONES DESIG.	Nº	MAT.	Ø
HOR. COL.	1	PVC	63
COL.	1	PVC	63


ARTEFACTOS Y ACCESORIOS	
BAÑO	IP - DAI - Lª 2CS- DU 2CS-Be 2CS 2LLP- PPA Ø63 - DESCØ40
P.C.	2 CS - SIF. BA. Ø50 - DESC. Ø63
P.L.	2 CS PPT-DESC. Ø40


CAÑERIAS DE AGUA

CONEXION: PPR Ø 13 mm
SUBIDA A.T.R.: PPR.Ø 13mm
BAJADA A CAL.: PPR.Ø 19mm
BAJADA AGUA FRIA: PPR Ø 13mm
DISTRIB. A.F. Y A. CAL: PPR Ø 13mm mm

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

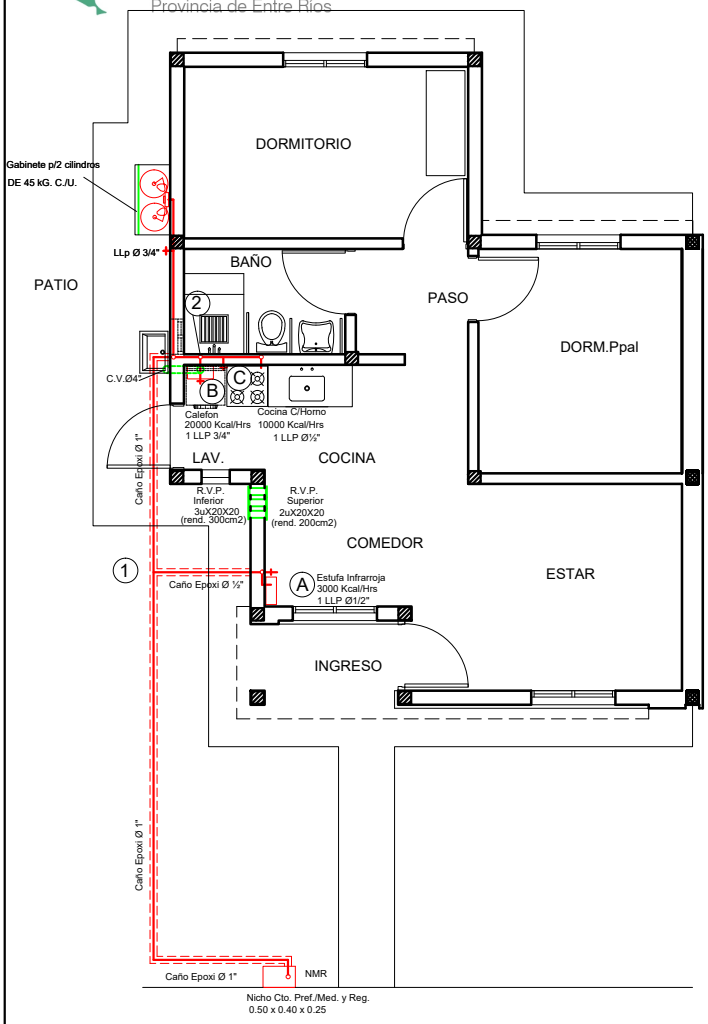

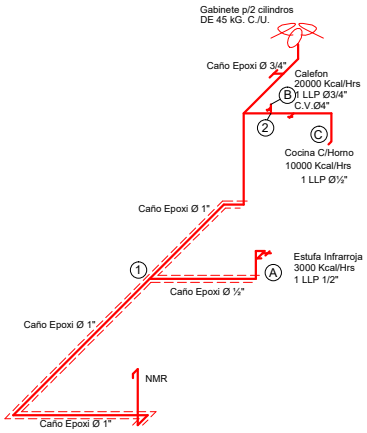

AXONOMETRIA

PLANTA GENERAL

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

cañería con revestimiento epoxi

CALCULO DE DIAMETROS para Cañeria EPOXI							
TRAMO	LONGITUD Real	LONGITUD Cálculo	LONGITUD Equivalente	LONGITUD Total	Consumos		Diámetros
					Kcal./hs.	m3/hs.	Ø
C - 2	1,25	14,55	8,44	22,99	1000	1,07	1/2"
B - 2	0,25	13,55	9,69	23,24	20000	2,15	3/4"
2 - 1	5,00	14,55	9,69	24,24	30000	3,22	1"
A - 1	1,80	10,10	6,28	16,38	3000	0,32	1/2"
1 - NMR	8,30	14,55	9,69	24,24	33000	3,54	1"

PLANO 25	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:25
	Cálculo de Cañerias de Instalacion Gas -Combinada PROTOTIPO DISC.	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE DE ABERTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

2016


SITUACIONES ESPECIALES

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

P1

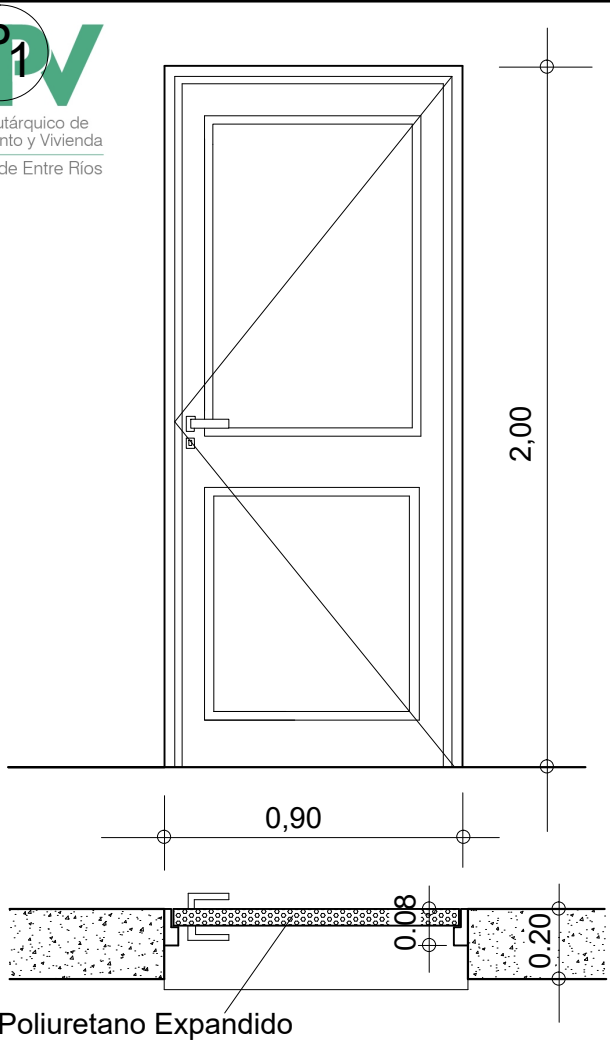


TIPOLOGIA	PUERTA INGRESO
MARCO	Aluminio Linea Standart 4 GRAMPAS DE AMURAR BURLETES PERIMETRALES DE GOMA
HOJA	HOJA DE ABRIR, PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS CERRADURA DOBLE PALETA, MANIJA BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)
OBSERVACIONES	

PLANO 26	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

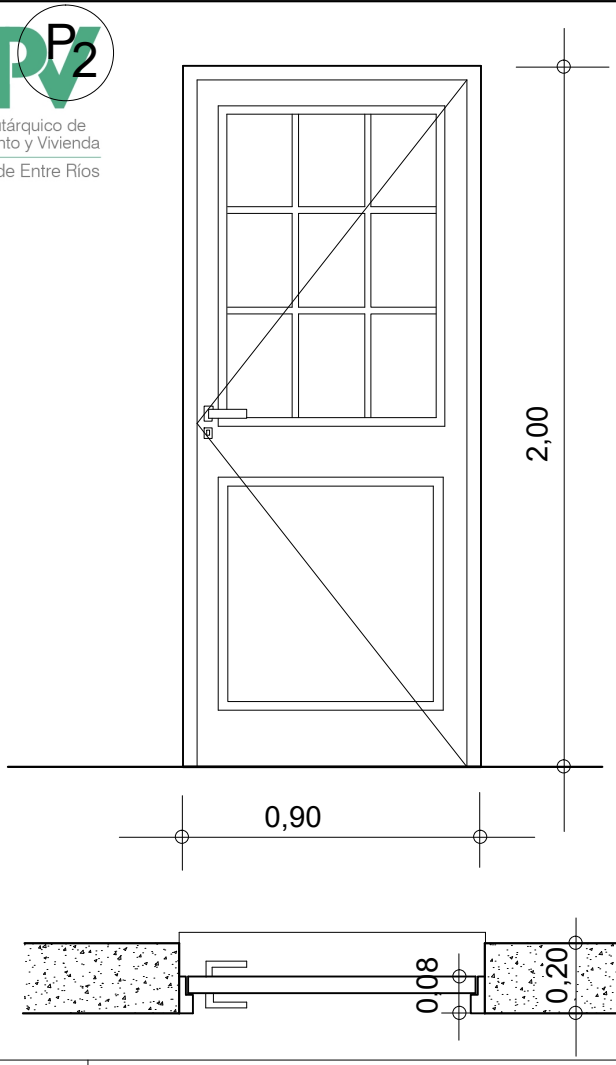


TIPOLOGIA	PUERTA SALIDA A PATIO
MARCO	PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD PERIMETRAL, CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE ESCUADRAS. GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
HOJA	HOJA DE ABRIR, PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD. PAÑO DE VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- PAÑO SUPERIOR CON BRAZO DE EMPUJE.
HERRAJES	MANIJA BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)
OBSERVACIONES	

PLANO 27	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

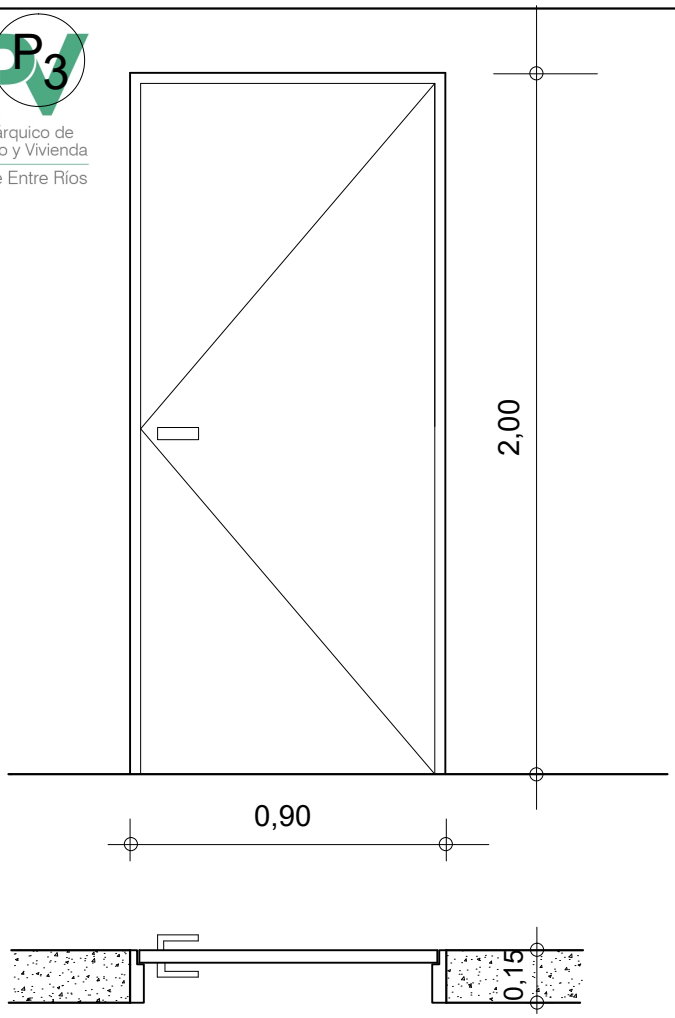

MARCO	CAJON CHAPA PLEGADA D.D. B.W.G. Nº 18 4 GRAMPAS DE AMURAR
HOJA	PLACA TERCIADO DE PINO DE 35 mm. DE ESPESOR INTERIOR NIDO DE ABEJA
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIO	
HERRAJES	3 FICHAS REFORZADAS, MANIJA DE BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN , CERRADURA COMUN.
PINTURA	MARCO 1 MANO ANTIOX.,2 MANOS ESMALTE SINTETICO HOJA 1 MANO TAPAPOROS, 2 MANOS BARNIZ
OBSERVACIONES	DOBLE CONTACTO ENTRE LAS PUERTAS Y HOJAS

PLANO 28	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

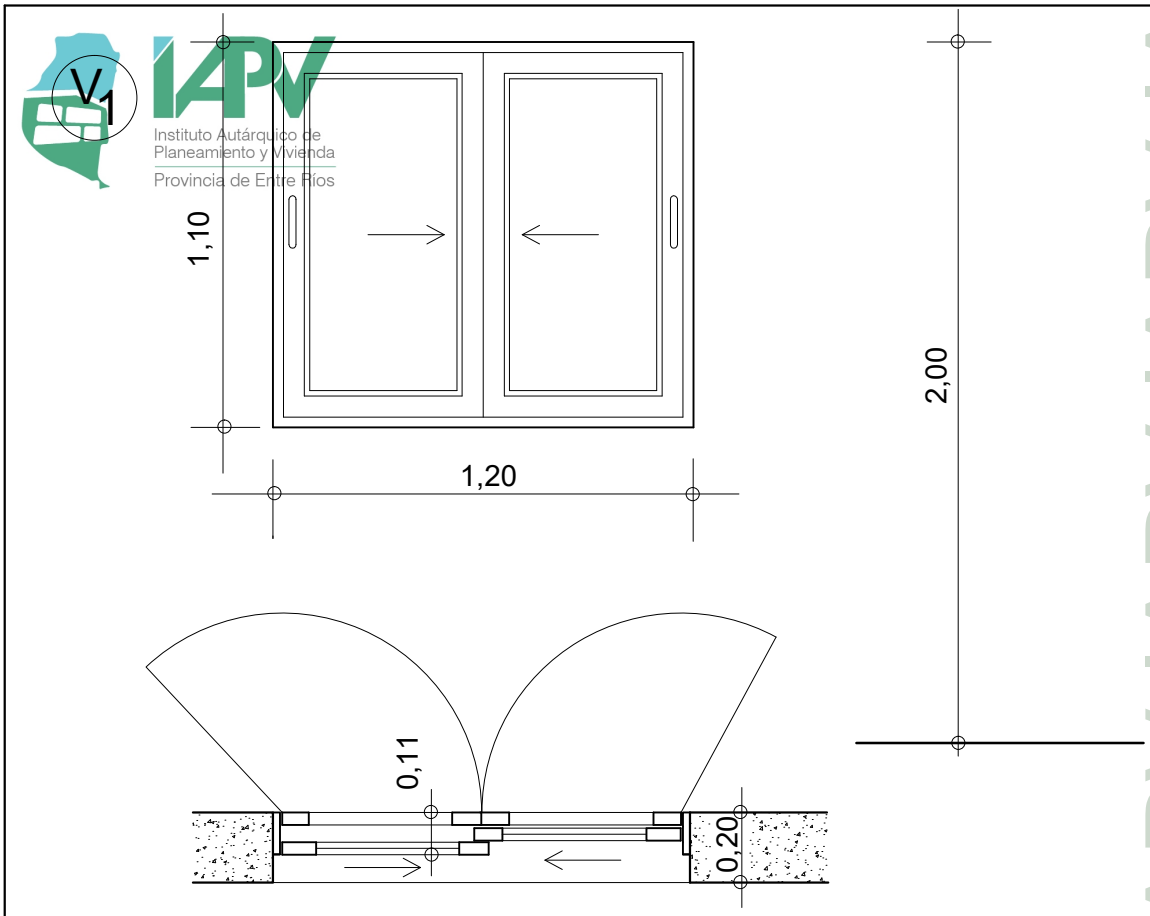


TIPOLOGIA	VENTANA CORREDIZA O SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL
MARCO	MARCO UNIFICADO DE PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD,PERIMETRAL DE 13,5 cm. CON UNIONES A 45 º POR MEDIO DE ESCUADRAS. GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
HOJA	DOS HOJAS CORREDIZAS PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD CON SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO. VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER-SAL.
HERRAJES	TIRADORES LATERALES DE POLIMERO. DISPOSITIVO ANTIRRUIDO. CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN OPCION BLANCO.
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO COLOR BLANCO)
OBSERVACIONES	

PLANO 29	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

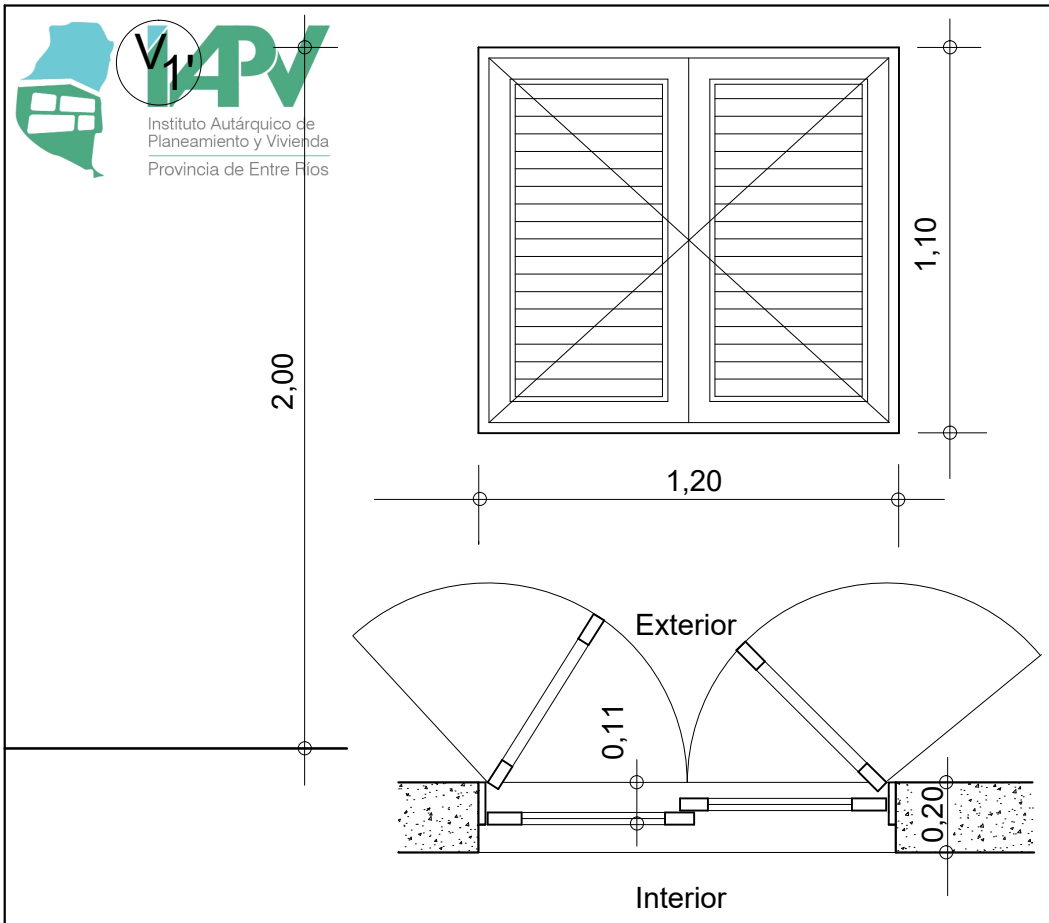

TIPOLOGIA	CELOSIA DE ALUMINIO DE REBATIR
MARCO	IDEM V1
HOJA	DOS HOJAS REBATIBLES TABLILLAS DE CELOSIAS DE 70 MM DE ALTO CON CALADO PARA VENTILACION.
HERRAJES	CIERRE CENTRAL FALLEBA EMBUTIR BRONCE PLATIL BISAGRAS ENCOLIZADAS CON REGULACION DE ALTURA SELLADO PERIMETRAL CON FELPA DE POLIPROPILENO SILICONADO.
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO COLOR BLANCO)
OBSERVACIONES	COLOCAR A PLOMO EXTERIOR

PLANO 30	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016


IAPV IAPV IAPV

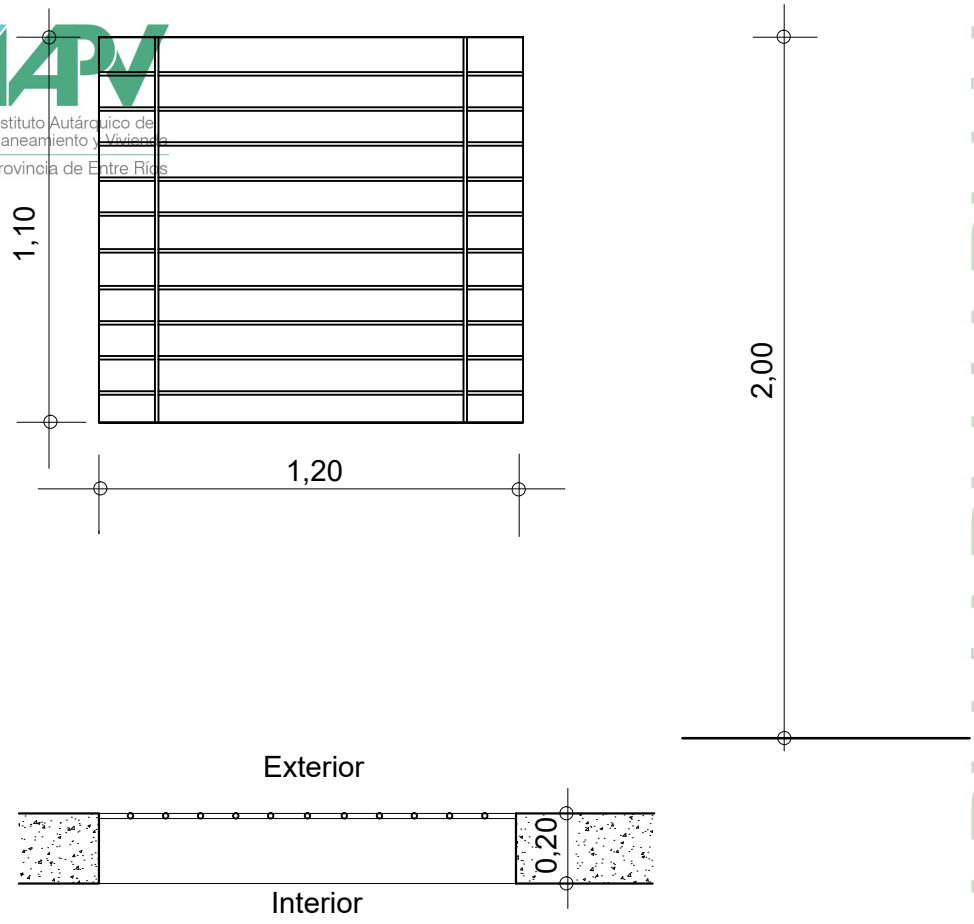

TIPOLOGIA	REJA DE HIERRO DE DIAMETRO 12, LISO CON PLANCHUELA
MARCO	AMURADO
HOJA	
HERRAJES	
PINTURA	ANTIOXIDO MAS SINTETICO COLOR BLANCO
OBSERVACIONES	

PLANO 31	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

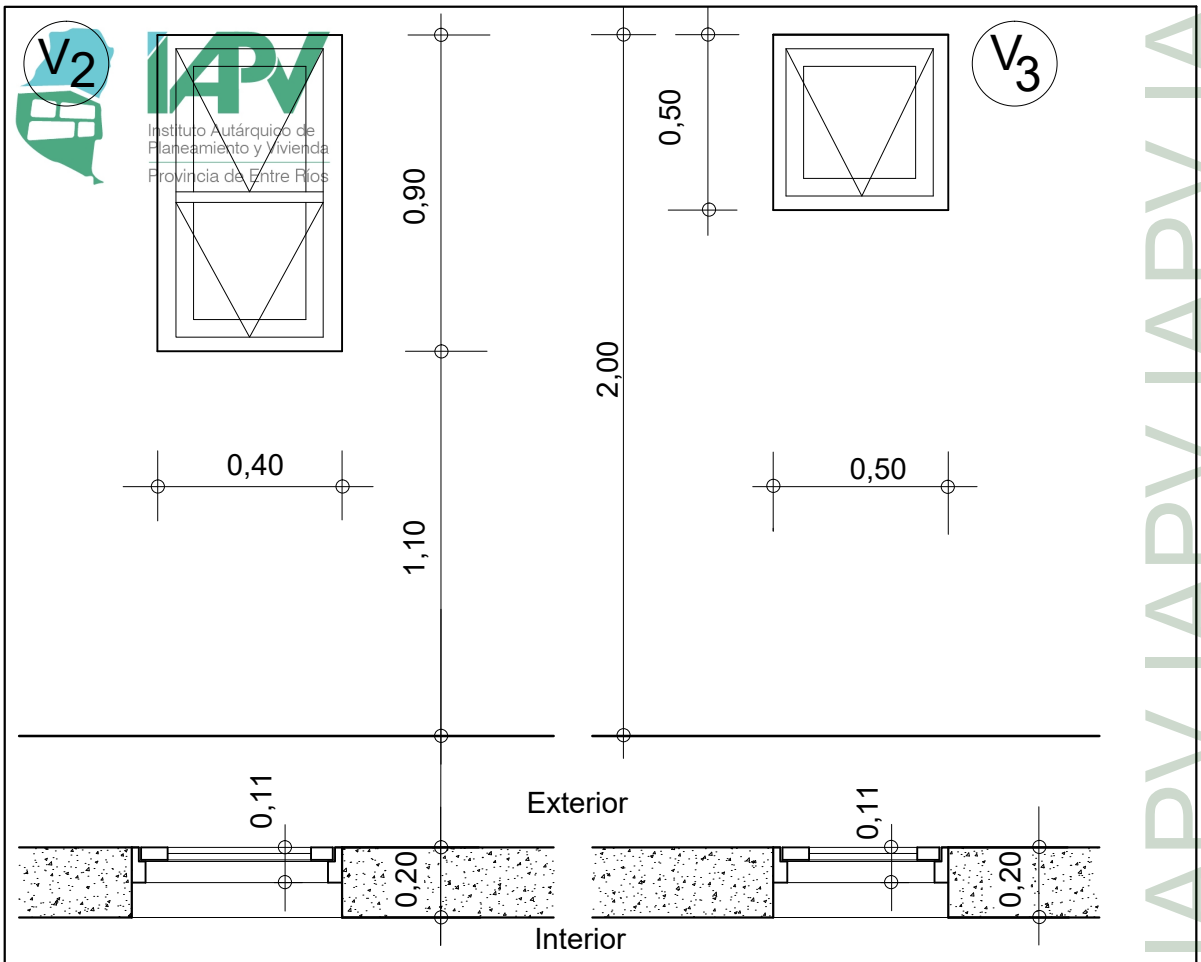

TIPOLOGIA	VENTANA REBATIBLE
MARCO	PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD PERIMETRAL DE 75mm. CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE ESCUADRAS. GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
HOJA	Ventana c/ sistema de proyeccion hacia el exterior mediante Brazo de Empuje PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVERSAL
HERRAJES	TIRADORES LATERALES DE POLIMERO. DISPOSITIVO ANTIRRUIDO. CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN OPCION BLANCO.
PINTURA	PERFIL DE MARCO Y HOJA: (PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

PLANO 32	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES	FECHA:2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

ESTRUCTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

TECHO DIGNO

PROTOTIPO SITUACIONES ESPECIALES


I.A.P.V.

AGOSTO 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE FUNDACION

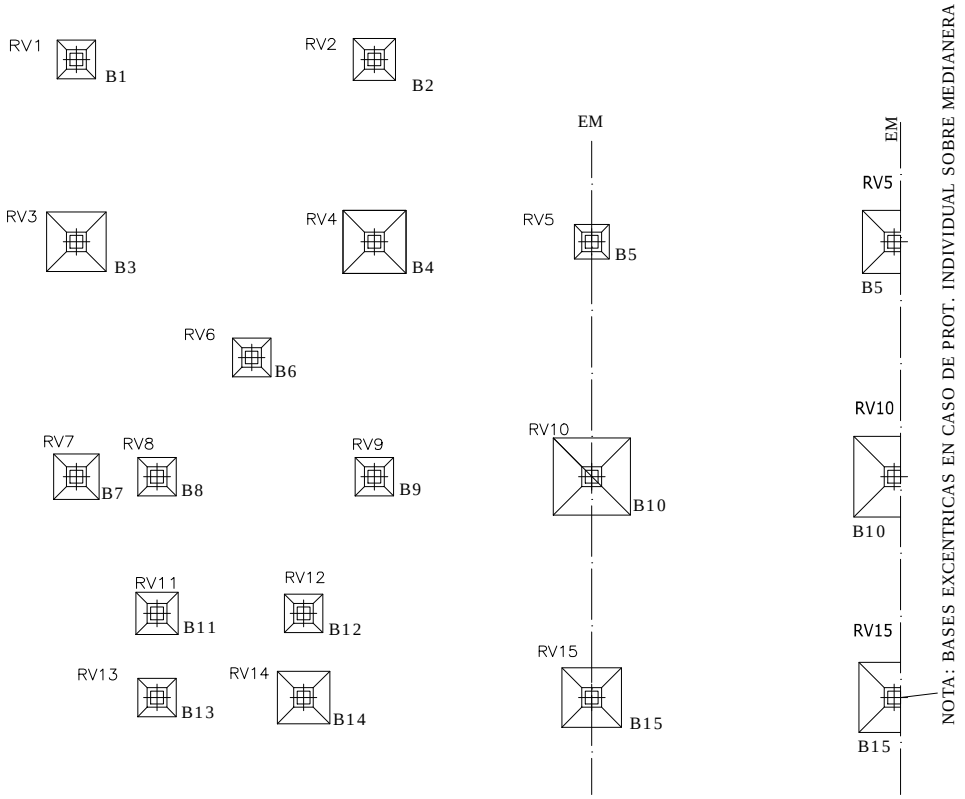

HORMIGON H-20
ACERO ADN420

RV: RIOSTRAS VERTICALES 18x18 - 4Ø8, est.1Ø4.2 c/15cm
LAS RIOSTRAS VERTICALES LLEGAN HASTA LA ALTURA SUPERIOR DE LA MAMPOSTERIA
LOS FUSTES DE LAS RIOSTRAS VERTICALES SON DE 23x23 cm Y EN EL CASO DE
EL DE LAS BASES EXCÉNTRICAS VAN ARMADOS CON 4Ø12. est. 1Ø6 c/15cm.-
Pf: -1.10m de T.N. (estimada, ver informe geotécnico).-


NOTA: En el caso que el Estudio de Suelos recomiende la ejecución de platea, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente, conforme al Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas Particulares, y la misma formará parte de la propuesta básica.

PLANO 37	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO DISCAP.	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCTURA DE FUNDACION	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE ENCADENADOS INFERIORES

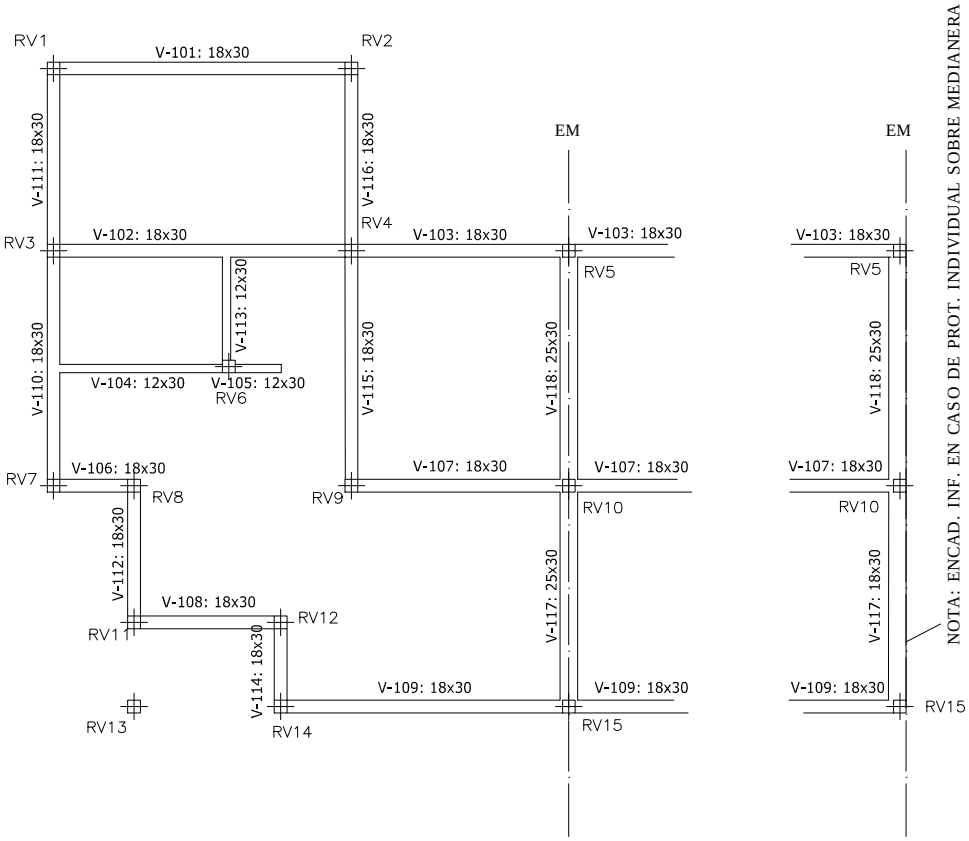


HORMIGON H-20
ACERO ADN420

PLANO 38	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO DISCAP.	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCT. DE ENCAD. INFERIORES	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE ENCADENADOS SUPERIORES

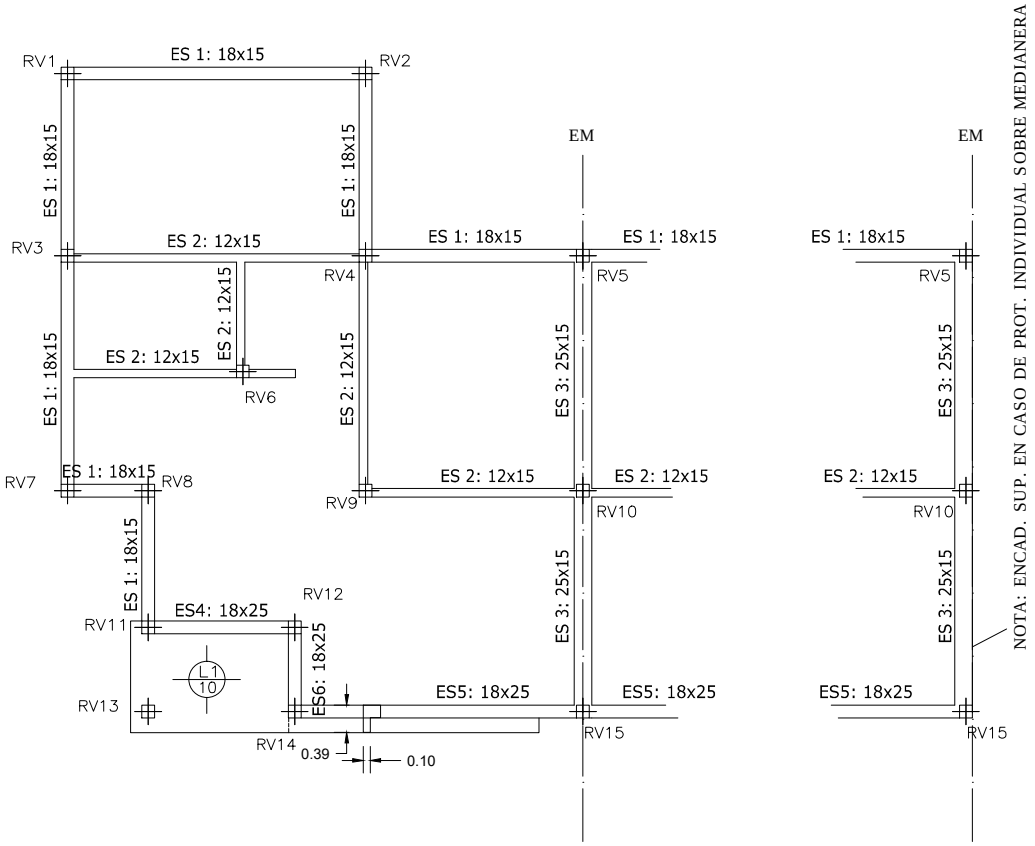

HORMIGON H-20
ACERO ADN420


LOSA L1: LLENA Armadura Inferior 1Ø6 c/15 cm, ambos sentidos → 8 (25) —(en Vigas)

PLANO 39	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO DISCAP.	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCT. DE ENCAD. SUPERIORES	FECHA: 08-16

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

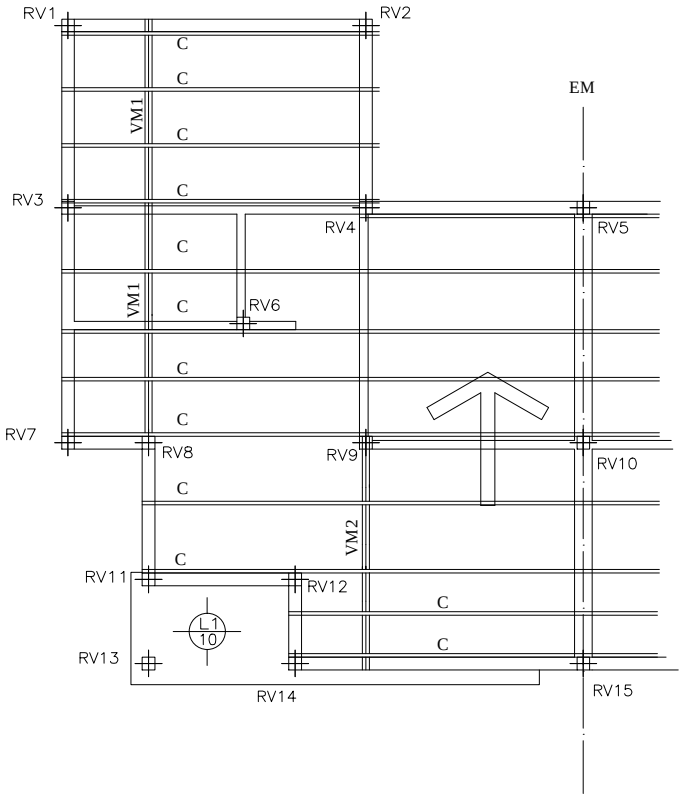

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 25
C: correas (clavadores) en un perfil C de 80x40x15 de 1.60 mm
VM1: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C
compuestas de dos C de 80x40x15 de 1.60mm
VM2: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C
compuestas de dos C de 100x50x15 de 1.60mm

Los perfiles C (clavadores) van anclados a los Encadenados Superiores en su punto de apoyo.-


PLANO 40	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	OBRA: TECHO DIGNO - PROTOTIPO DISCAP.	ESC.: 1:100
	PLANO DE: ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA	FECHA: 08-16


IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Planilla de: **BASES CENTRADAS**
Obra: **TECHO DIGNO - PROT. DISCAPACITADO APAREADO**
Planta: **FUNDACION**
Fecha: **04-08-16**

Hormigón: H-20 T.A.Suelo **1,00** kg./cm2
Acero: A.D.N. 420 Profundidad: **- 1,10** T.N.



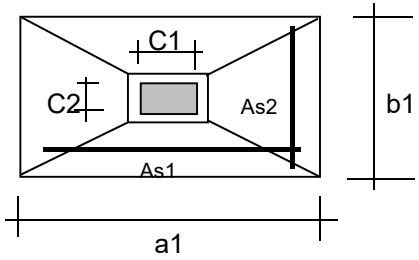


				HORMIGON									ARMADURAS							
Posic.	N	Pt.	S	**a1**	**b1**	d	C1	C2	h	**do**	M1	M2	As1			As2			V	OBSERV.
	tn	tn	m2	**cm**	**cm**	cm	cm	cm	cm	**cm**	tncm	tncm	cm2	Nº	Ø	cm2	Nº	Ø	m3	**Tens. Trab.**
B1	2,62	2,88	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,95**
B2	2,86	3,15	0,31	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,26	5	8	0,26	5	8	0,063	**0,87**
B3	6,02	6,62	0,66	**85**	**85**	15	**23**	**23**	25	**30**	34	34	0,64	7	8	0,64	7	8	0,157	**0,92**
B4	7,39	8,13	0,81	**90**	**90**	15	**23**	**23**	25	**30**	46	46	0,87	7	8	0,87	7	8	0,176	**1,00**
B5	4,28	4,71	0,47	**70**	**70**	15	**23**	**23**	20	**25**	17	17	0,40	7	8	0,40	7	8	0,097	**0,96**
B6	2,14	2,35	0,24	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,16	5	8	0,16	5	8	0,053	**0,78**
B7	3,35	3,69	0,37	**65**	**65**	15	**23**	**23**	15		11	11	0,36	5	8	0,36	5	8	0,073	**0,87**
B8	2,67	2,94	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,97**
B9	2,50	2,75	0,28	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,18	5	8	0,18	5	8	0,053	**0,91**
B10	10,31	11,34	1,13	**110**	**110**	15	**23**	**23**	30	**35**	89	89	1,37	9	8	1,37	9	8	0,285	**0,94**
B11	2,96	3,26	0,33	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,26	5	8	0,26	5	8	0,063	**0,90**
B12	2,23	2,45	0,25	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,16	5	8	0,16	5	8	0,053	**0,81**
B13	0,81	0,89	0,09	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	2	2	0,06	5	8	0,06	5	8	0,053	**0,29**
B14	4,80	5,28	0,53	**75**	**75**	15	**23**	**23**	20	**25**	22	22	0,51	7	8	0,51	7	8	0,111	**0,94**
B15	6,54	7,19	0,72	**90**	**90**	15	**23**	**23**	25	**30**	41	41	0,77	7	8	0,77	7	8	0,156	**1,00**


IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Planilla de: **BASES CENTRADAS**
Obra: **TECHO DIGNO - PROT. DISCAPACITADO INDIVIDUAL**
Planta: **FUNDACION**
Fecha: **04-08-16**

Hormigón: H-20 T.A.Suelo **1,00** kg./cm2
Acero: A.D.N. 420 Profundidad: **- 1,10** T.N.



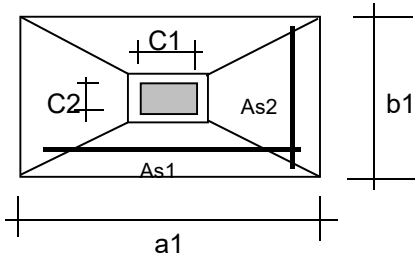


				HORMIGON									ARMADURAS							
Posic.	N	Pt.	S	**a1**	**b1**	d	C1	C2	h	**do**	M1	M2	As1			As2			V	OBSERV.
	tn	tn	m2	**cm**	**cm**	cm	cm	cm	cm	**cm**	tncm	tncm	cm2	Nº	Ø	cm2	Nº	Ø	m3	**Tens. Trab.**
B1	2,62	2,88	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,95**
B2	2,86	3,15	0,31	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,26	5	8	0,26	5	8	0,063	**0,87**
B3	6,02	6,62	0,66	**85**	**85**	15	**23**	**23**	25	**30**	34	34	0,64	7	8	0,64	7	8	0,157	**0,92**
B4	7,39	8,13	0,81	**90**	**90**	15	**23**	**23**	25	**30**	46	46	0,87	7	8	0,87	7	8	0,176	**1,00**
B6	2,14	2,35	0,24	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,16	5	8	0,16	5	8	0,053	**0,78**
B7	3,35	3,69	0,37	**65**	**65**	15	**23**	**23**	15	**20**	11	11	0,36	5	8	0,36	5	8	0,073	**0,87**
B8	2,67	2,94	0,29	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,19	5	8	0,19	5	8	0,053	**0,97**
B9	2,50	2,75	0,28	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	6	6	0,18	5	8	0,18	5	8	0,053	**0,91**
B11	2,96	3,26	0,33	**60**	**60**	15	**23**	**23**	15	**20**	8	8	0,26	5	8	0,26	5	8	0,063	**0,90**
B12	2,23	2,45	0,25	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	5	5	0,16	5	8	0,16	5	8	0,053	**0,81**
B13	0,81	0,89	0,09	**55**	**55**	15	**23**	**23**	15	**20**	2	2	0,06	5	8	0,06	5	8	0,053	**0,29**
B14	4,80	5,28	0,53	**75**	**75**	15	**23**	**23**	20	**25**	22	22	0,51	7	8	0,51	7	8	0,111	**0,94**


IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

Planilla de: **BASES EXCENTRICAS**
Obra: **TECHO DIGNO - PROT. DISCAPACITADO INDIVIDUAL**
Ubicación: **FUNDACION**
Planta: **04-08-16**

Hormigón: H-20 T.A.Suelo **1,00** kg./cm2
Acero: A.D.N. 420 Profundidad: **- 1,10** T. N.



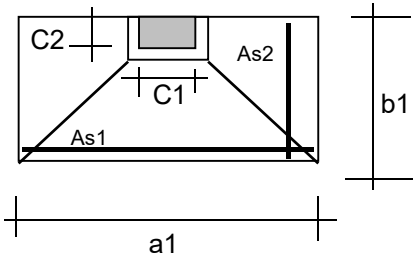

				HORMIGON									ARMADURAS							
Posic.	P	Pt.	S	**a1**	**b1**	**d**	C1	C2	h	**do**	M1	M2	As1			As2			V	OBSERV.
	tn	tn	m2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	tncm	tncm	cm2	Nº	Ø	cm2	Nº	Ø	m3	**Tens. Trab.**
B5	3,39	3,73	0,37	**70**	**55**	20	**23**	**23**	25	**30**	13	32	0,25	5	8	0,59	7	8	0,096	**0,97**
B10	9,16	10,08	1,01	**145**	**70**	20	**23**	**23**	45	**50**	118	145	1,23	7	8	1,51	11	8	0,333	**0,99**
B15	5,01	5,51	0,55	**105**	**55**	20	**23**	**23**	30	**35**	40	47	0,63	5	8	0,73	9	8	0,156	**0,95**

Las Bases deberan ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas

IAPV IAPV IAPV

ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. INFERIORES

Sistema de unidades: M.K.S
Luz (m)
Momentos (t·m)
Áreas (cm²)
Corte (t)

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-101(RV1-RV2)	18 X 30	4.25	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	1.53	-1.53
			0.90	1.60	0.90	1.55	3.01	1.54		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-102(RV3-RV4)	18 X 30	4.25	0.00	-----	-1.00	-----	-----	1.68	1.15	-1.69
			0.70	1.20	0.20	1.28	2.14	0.48		

Arm.Superior: ----- 4Ø8
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12
Estribos: 1eØ6c/0.20

V-103(RV4-RV5)	18 X 30	3.10	-1.00	-----	0.00	1.69	-----	-----	1.49	-0.83
			-----	0.50	0.30	-----	0.88	0.59		

Arm.Superior: 4Ø8 -----
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

IAPV IAPV IAPV

V-103(RV4-RV5)	18 X 30	3.10	-1.00	-----	0.00	1.69	-----	-----	1.49	-0.83
Tensor:0.36cm2			-----	0.50	0.30	-----	0.88	0.59		

Arm.Superior: 4Ø8 -----
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: **2Ø10**
Estribos: 13x1eØ6c/0.20

V-103 EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL CON BASES EXCENTRICAS

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-104(A0-RV6)	12 X 30	2.50	0.00	-----	-0.10	-----	-----	0.32	0.62	-0.72
			0.20	0.40	0.10	0.36	0.71	0.32		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

V-105(RV6-)	12 X 30	0.75	-0.10	-----	0.00	0.32	0.32	0.32	0.38	0.00
			-----	0.00	0.00	-----	-----	-----		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-106(RV7-RV8)	18 X 30	1.15	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.64	-0.66
			0.10	0.20	0.10	0.48	0.48	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-107(RV9-RV10)	18 X 30	3.10	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.92	-0.92
			0.40	0.70	0.40	0.70	1.34	0.71		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 3Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-107(RV9-RV10)	18 X 30	3.10	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.92	-0.92
Tensor:1.35cm2			0.40	0.70	0.40	0.70	1.34	0.71		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: **3Ø12**
Estribos: 1eØ6c/0.20

V-107 EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL CON BASES EXCENTRICAS

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-108(RV11-RV12)	18 X 30	2.09	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.72	-0.72
			0.20	0.40	0.20	0.48	0.71	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-109(RV14-RV15)	18 X 30	4.11	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	1.48	-1.48
			0.80	1.50	0.80	1.44	2.81	1.45		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-109(RV14-RV15)	18 X 30	4.11	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	1.48	-1.48
Tensor:0.53cm2			0.80	1.50	0.80	1.44	2.81	1.45		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: **3Ø12**
Estribos: 1eØ6c/0.20

V-109 EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL CON BASES EXCENTRICAS

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-110(RV7-RV3)	18 X 30	3.35	0.00	-----	-1.20	-----	-----	1.95	2.10	-2.21
			1.10	1.60	0.20	1.99	2.97	0.48		

Arm.Superior: ----- 4Ø8+1Ø8
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10
Estribos: 1eØ6c/0.24

IAPV IAPV IAPV

V-111(RV3-RV1)	18 X 30	2.60	-1.40	-----	0.00	2.49	0.64	-----	1.50	-0.35
			-----	0.10	0.10	-----	0.48	0.48		

Arm.Superior: 4Ø8+1Ø8 -----
Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-112(RV11-RV8)	18 X 30	1.95	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.78	-0.79
			0.20	0.40	0.20	0.48	0.72	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-113(RV6-A1)	12 X 30	1.65	0.00	-----	0.00	0.02	-----	-----	0.43	-0.39
			0.10	0.20	0.10	0.32	0.32	0.32		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-114(RV14-RV12)	18 X 30	1.20	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.38	-0.39
			0.10	0.10	0.10	0.48	0.48	0.48		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-115(RV9-RV4)	18 X 30	3.35	0.00	-----	-0.50	-----	-----	0.93	0.80	-1.14
			0.40	0.60	-----	0.63	1.04	-----		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 3Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.20

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
V-116(RV4-RV2)	18 X 30	2.60	-0.50	-----	0.00	0.92	-----	-----	1.14	-0.71
			-----	0.40	0.20	-----	0.66	0.48		
Arm.Montaje: 2Ø8										
Arm.Inferior: 2Ø8										
Estribos: 1eØ6c/0.20										
V-117(RV15-RV10)	25 X 30	3.15	0.00	-----	-1.60	-----	-----	2.80	2.15	-3.24
			0.80	1.30	-----	1.54	2.54	-----		
Arm.Superior: ----- 4Ø8+1Ø12										
Arm.Montaje: 2Ø8										
Arm.Inferior: 3Ø12										
Estribos: 1eØ6c/0.20										
V-118(RV10-RV5)	25 X 30	3.35	-1.60	-----	0.00	2.81	-----	-----	3.18	-2.15
			-----	1.40	0.90	-----	2.74	1.63		
Arm.Superior: 4Ø8+1Ø12 -----										
Arm.Montaje: 2Ø8										
Arm.Inferior: 3Ø12										
Estribos: 1eØ6c/0.20										

NOTA: EN TODOS LOS CASOS DE CONTINUIDAD DE VIGAS, LA ARMADURA SUPERIOR EN EL APOYO SE ESTABLECE CON LA PROLONGACION DE LA ARMADURA SUPERIOR(PERCHAS) HACIA LA VIGA ADYACENTE UNOS 80cm, LO MISMO PARA ÉSTA: 2Ø8+2Ø8=2.0cm2 MAS (+) EL ADICIONAL CUANDO CORRESPONDA.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. SUPERIORES

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES 1	18 X 15		----	-----	-----	----	-----	---	----	-----
			----	-----	-----	----	-----	---	----	-----

Arm.Superior: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ4.2c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES 2	12 X 15		----	-----	-----	----	-----	---	----	-----
			----	-----	-----	----	-----	---	----	-----

Arm.Superior: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ4.2c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES 3	25 X 15		----	-----	-----	----	-----	---	----	-----
			----	-----	-----	----	-----	---	----	-----

Arm.Superior: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ4.2c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES-4 (RV11-RV12)	**18 X 25**	2.09	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.48	-0.49
			0.20	0.30	0.20	0.39	0.57	0.39		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.15

IAPV IAPV IAPV

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES-5(RV14-RV15)	**18 X 25**	4.11	-0.20	-----	0.00	0.48	-----	-----	1.02	-0.79
			0.40	0.80	0.50	0.94	1.83	1.17		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø12
Estribos: 1eØ6c/0.15

Viga	Sección	Luz	M.Izq.	M.Cent.	M.Der.	A.Izq.	A.Cent.	A.Der.	Cort.Izq.	Cort.Der.
ES-6 (RV14-RV12)	**18 X 25**	1.20	0.00	-----	0.00	0.39	-----	-----	0.02	-0.28
			0.00	0.10	0.00	-----	0.39	0.39		

Arm.Montaje: 2Ø8
Arm.Inferior: 2Ø8
Estribos: 1eØ6c/0.15

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLES CONSTRUCTIVOS


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO 2016

I.A.P.V.

IAPV/IAPV/IAPV/

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE DE CIMIENTOS

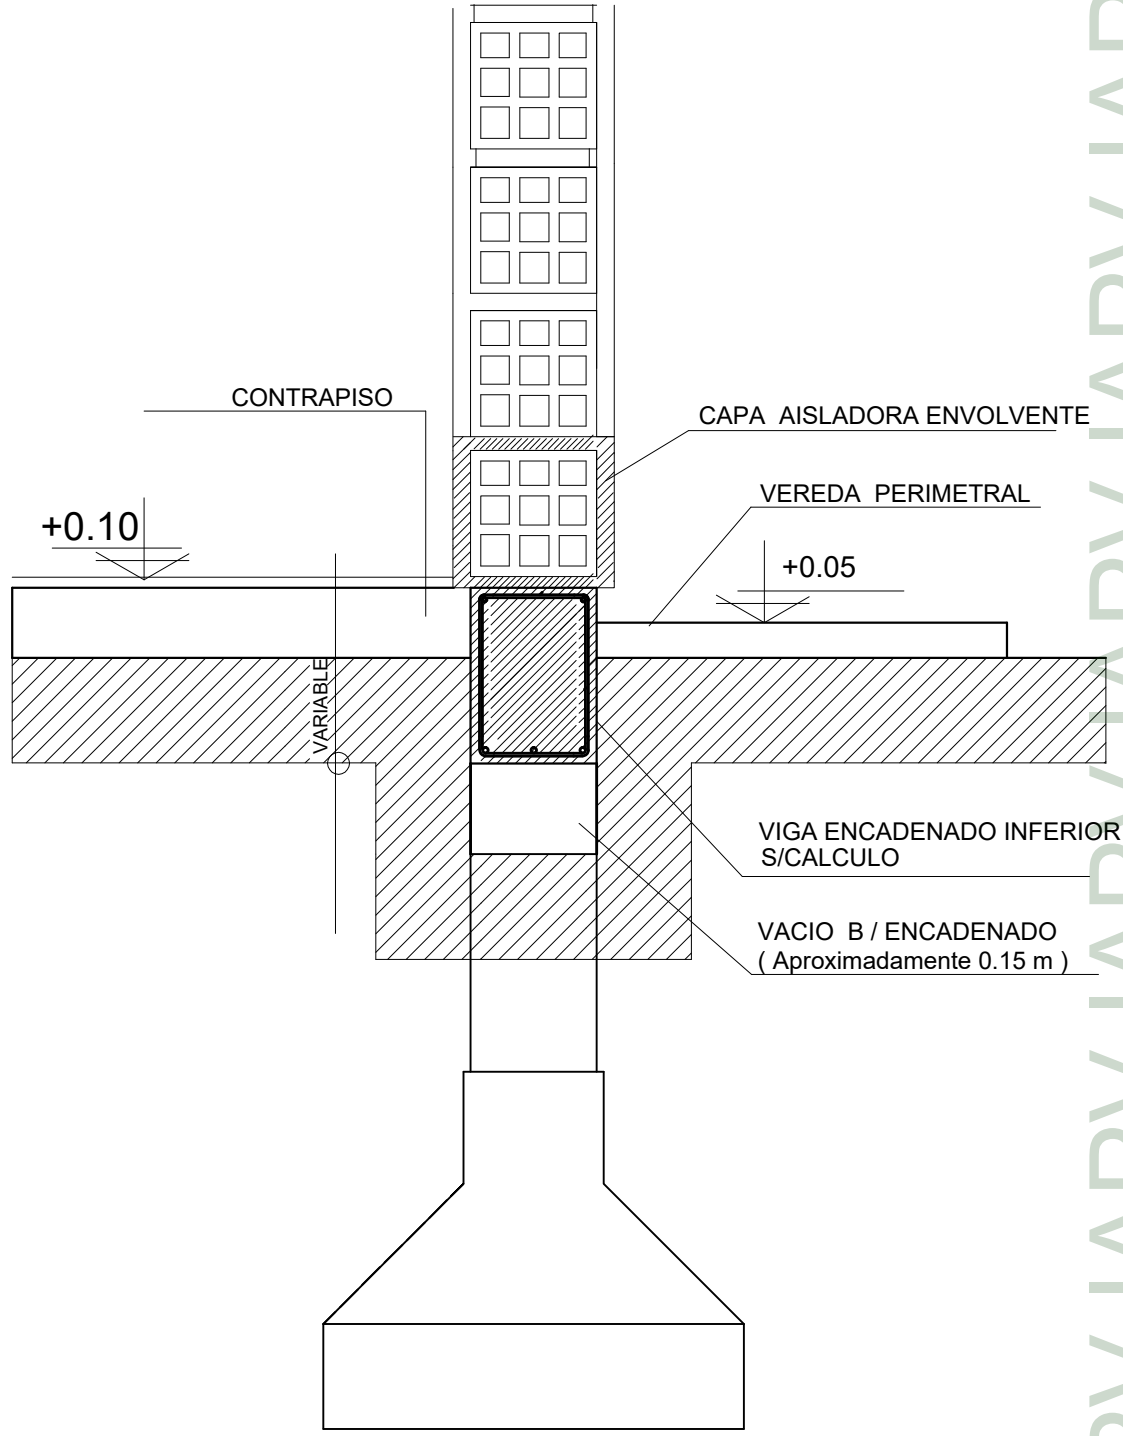


PLANO 41	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE DE CIMIENTOS

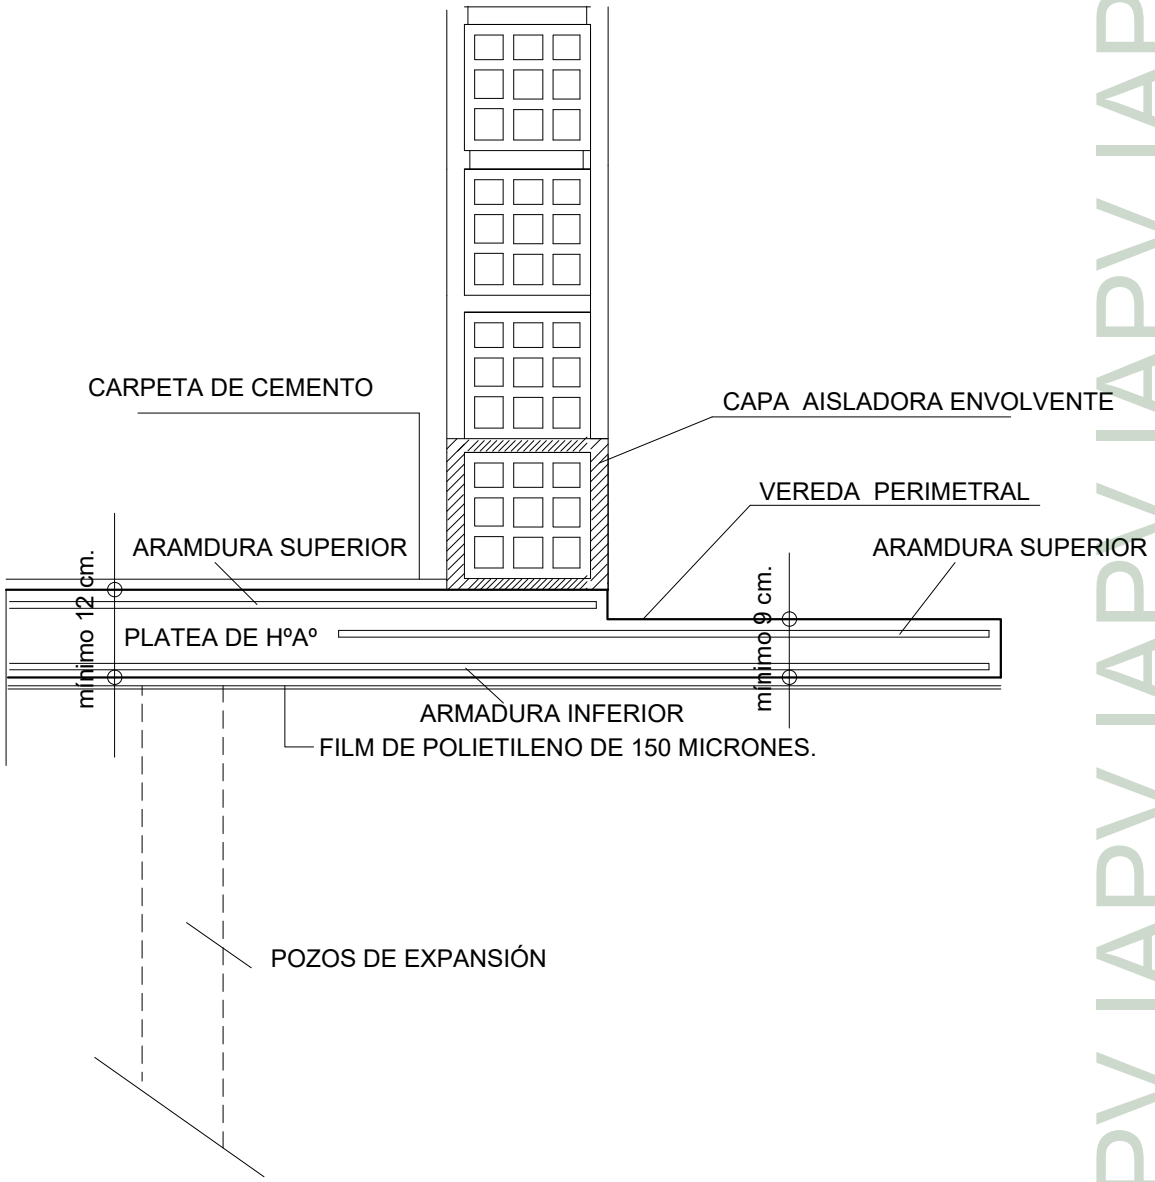


PLANO 42	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:20
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE
MURO MEDIAMERO

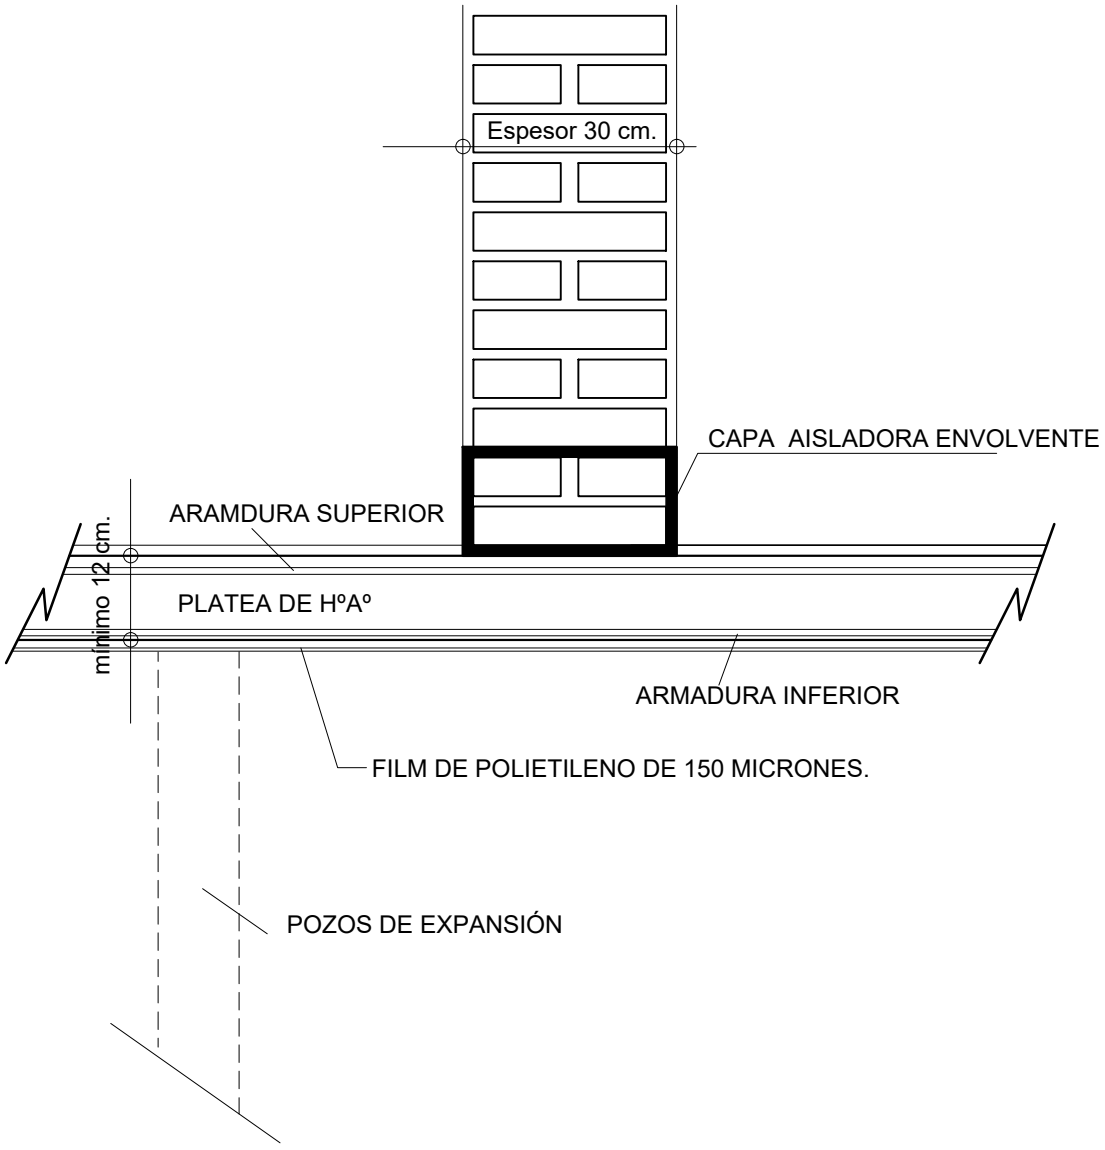

PLANO 43	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:10
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE DE CIELORRASO



REFERENCIAS

① Fijacion perimetral:tarugos de expansion de nylon con tope nº 8 y tornillo de acero de 22x44mm.

② Perfil perimetral de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm.x 20mm. prepintados de blanco.

③ Perfil larguero de chapa de acero galvanizado tipo T de 24mmx32mm. prepintados de blanco.

④ Perfil travesaño de chapa de acero galvanizado tipo T de 24mmx32mm. prepintados de blanco.

⑤ Placa de yeso desmontable de 6,4mm de espesor. de 0,61m x 0,61m


⑥ Alambre galvanizado nº14 o varilla con nivelador.

PLANO 44	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE CARGA LATERAL

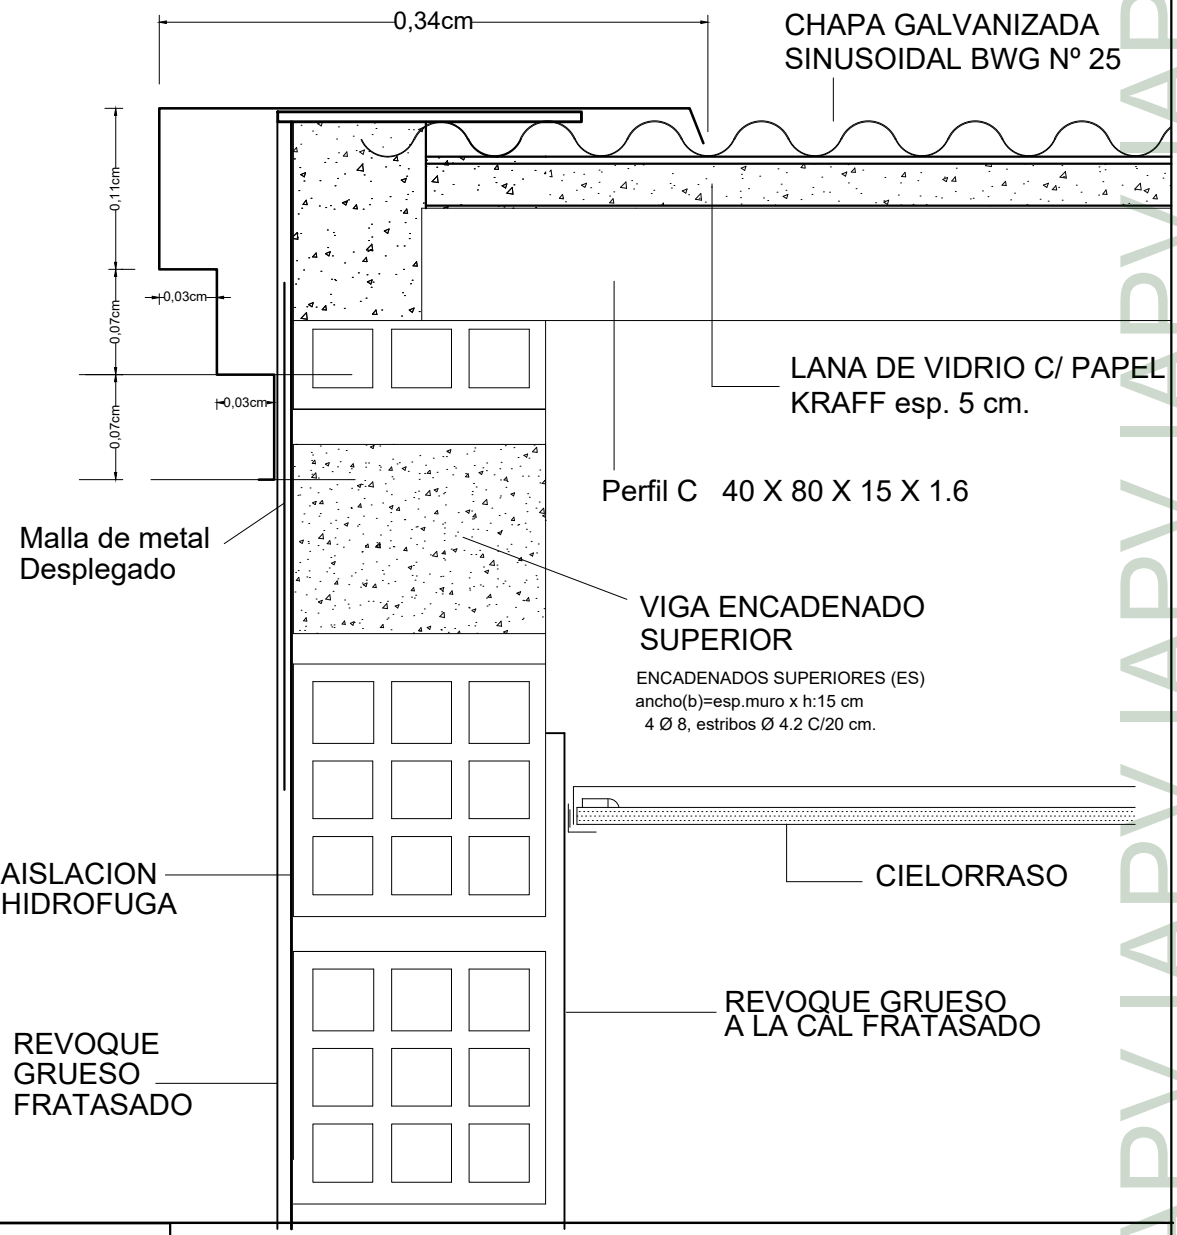


PLANO 45	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:10
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

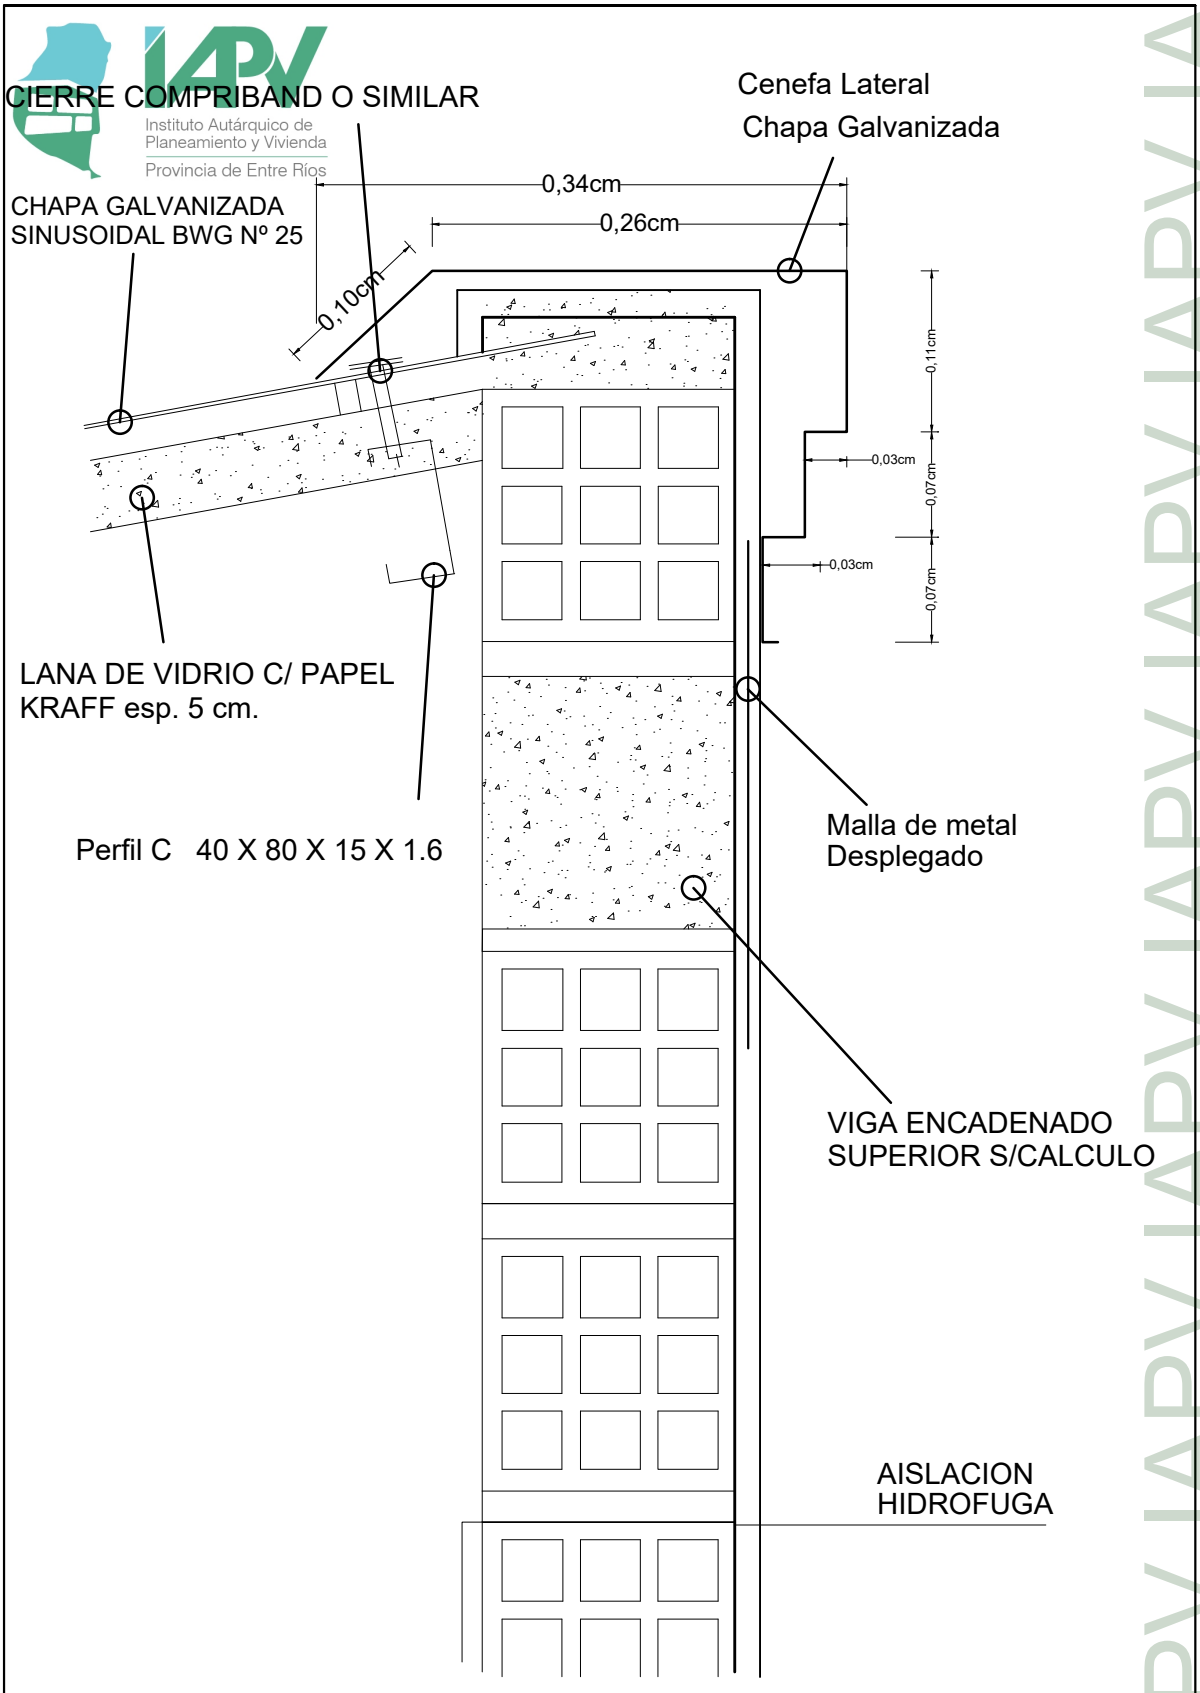

PLANO 46	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:10
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

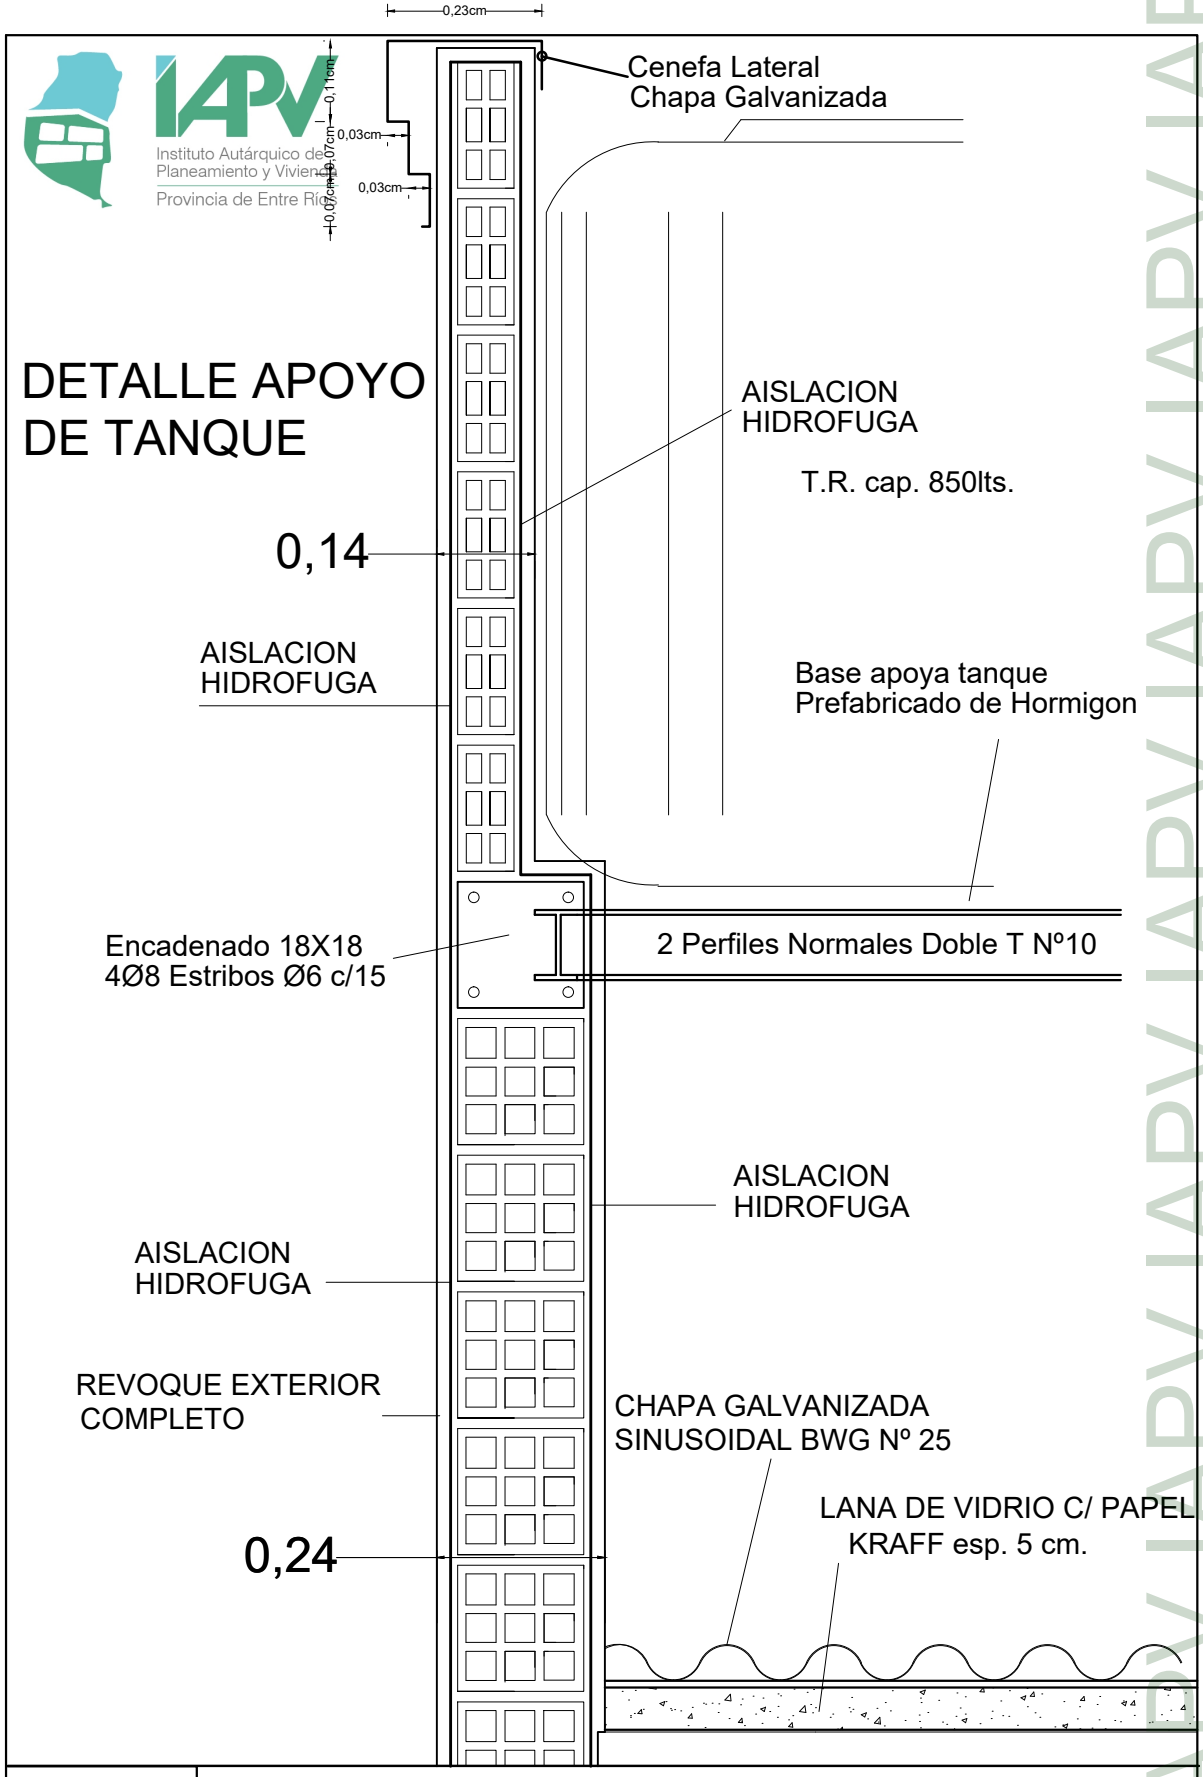


PLANO 47	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE CARGA LATERAL

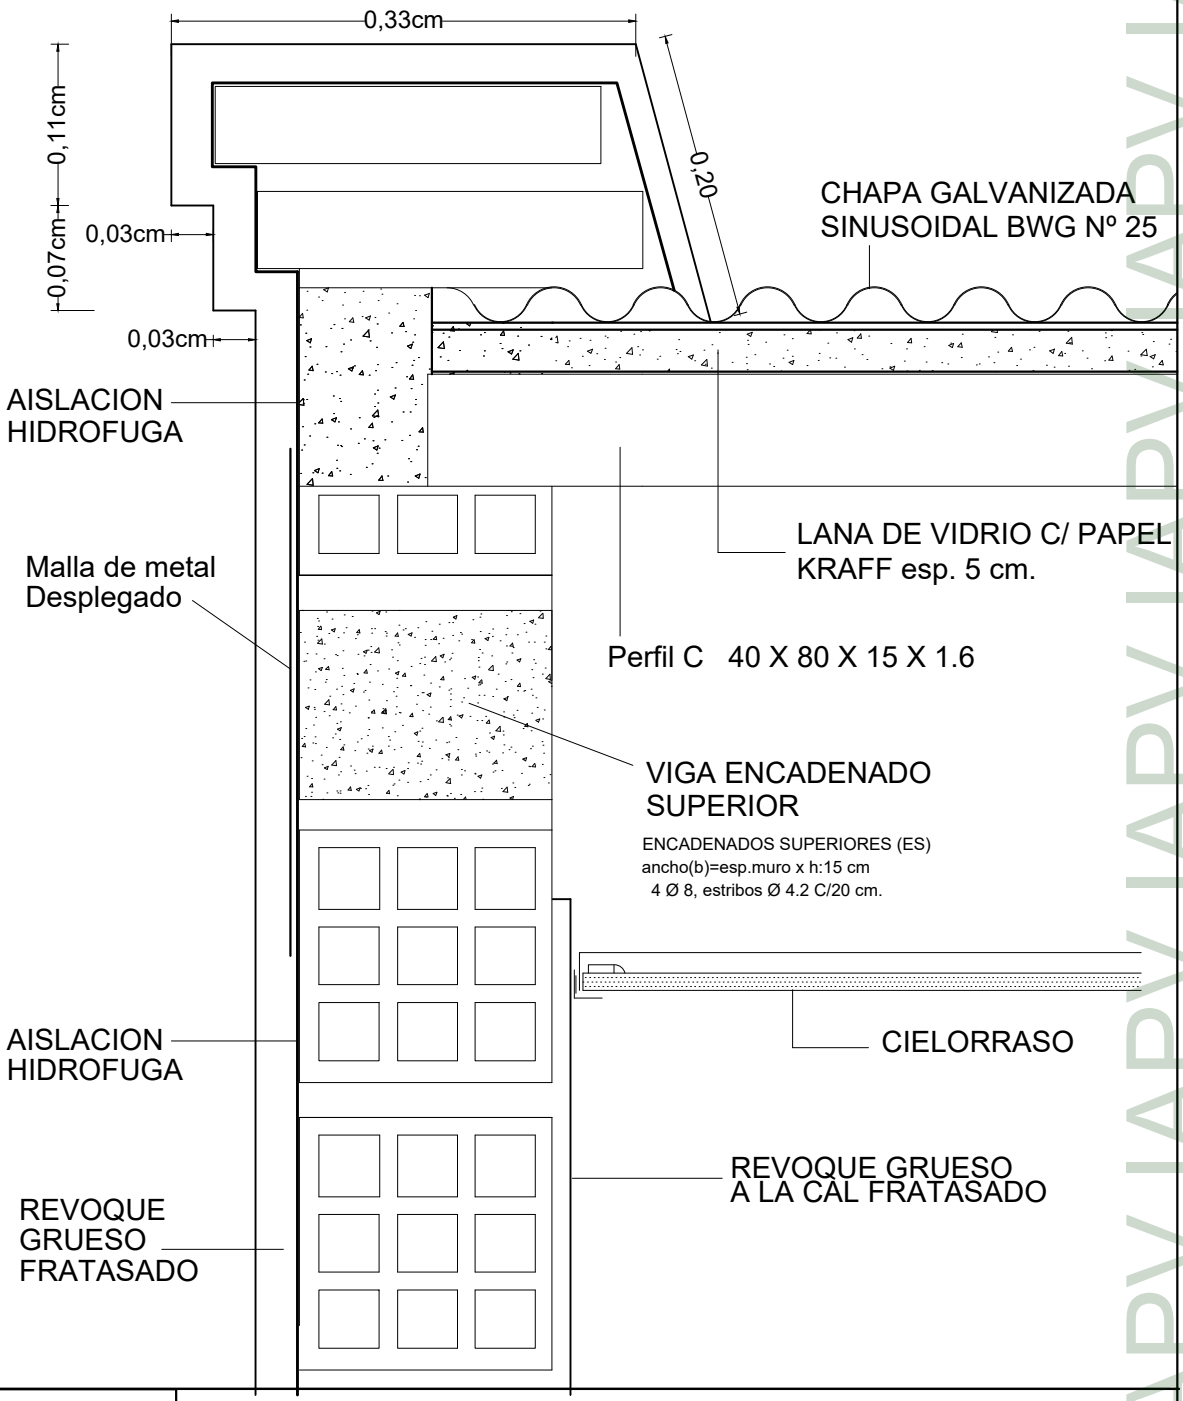

PLANO 48	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:10
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

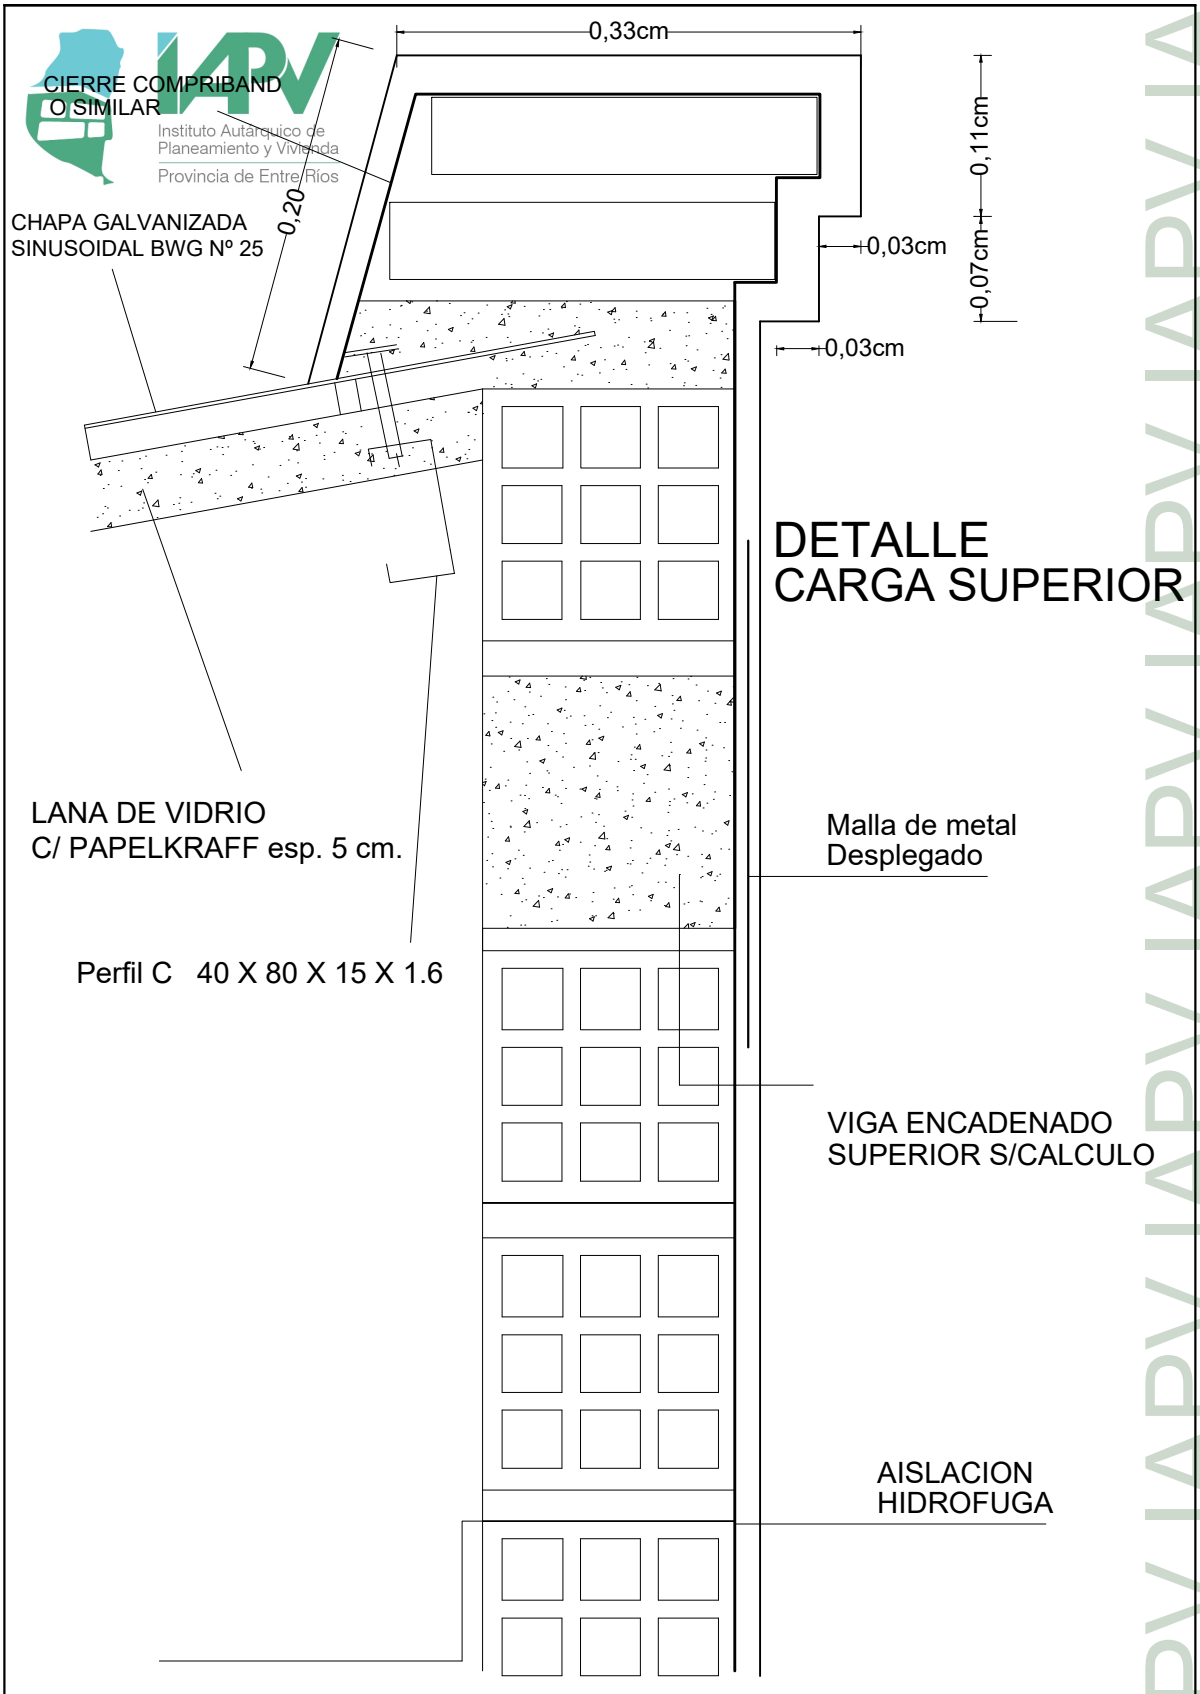


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

PLANO 49	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC:1:10
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016


IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

DETALLE APOYO DE TANQUE

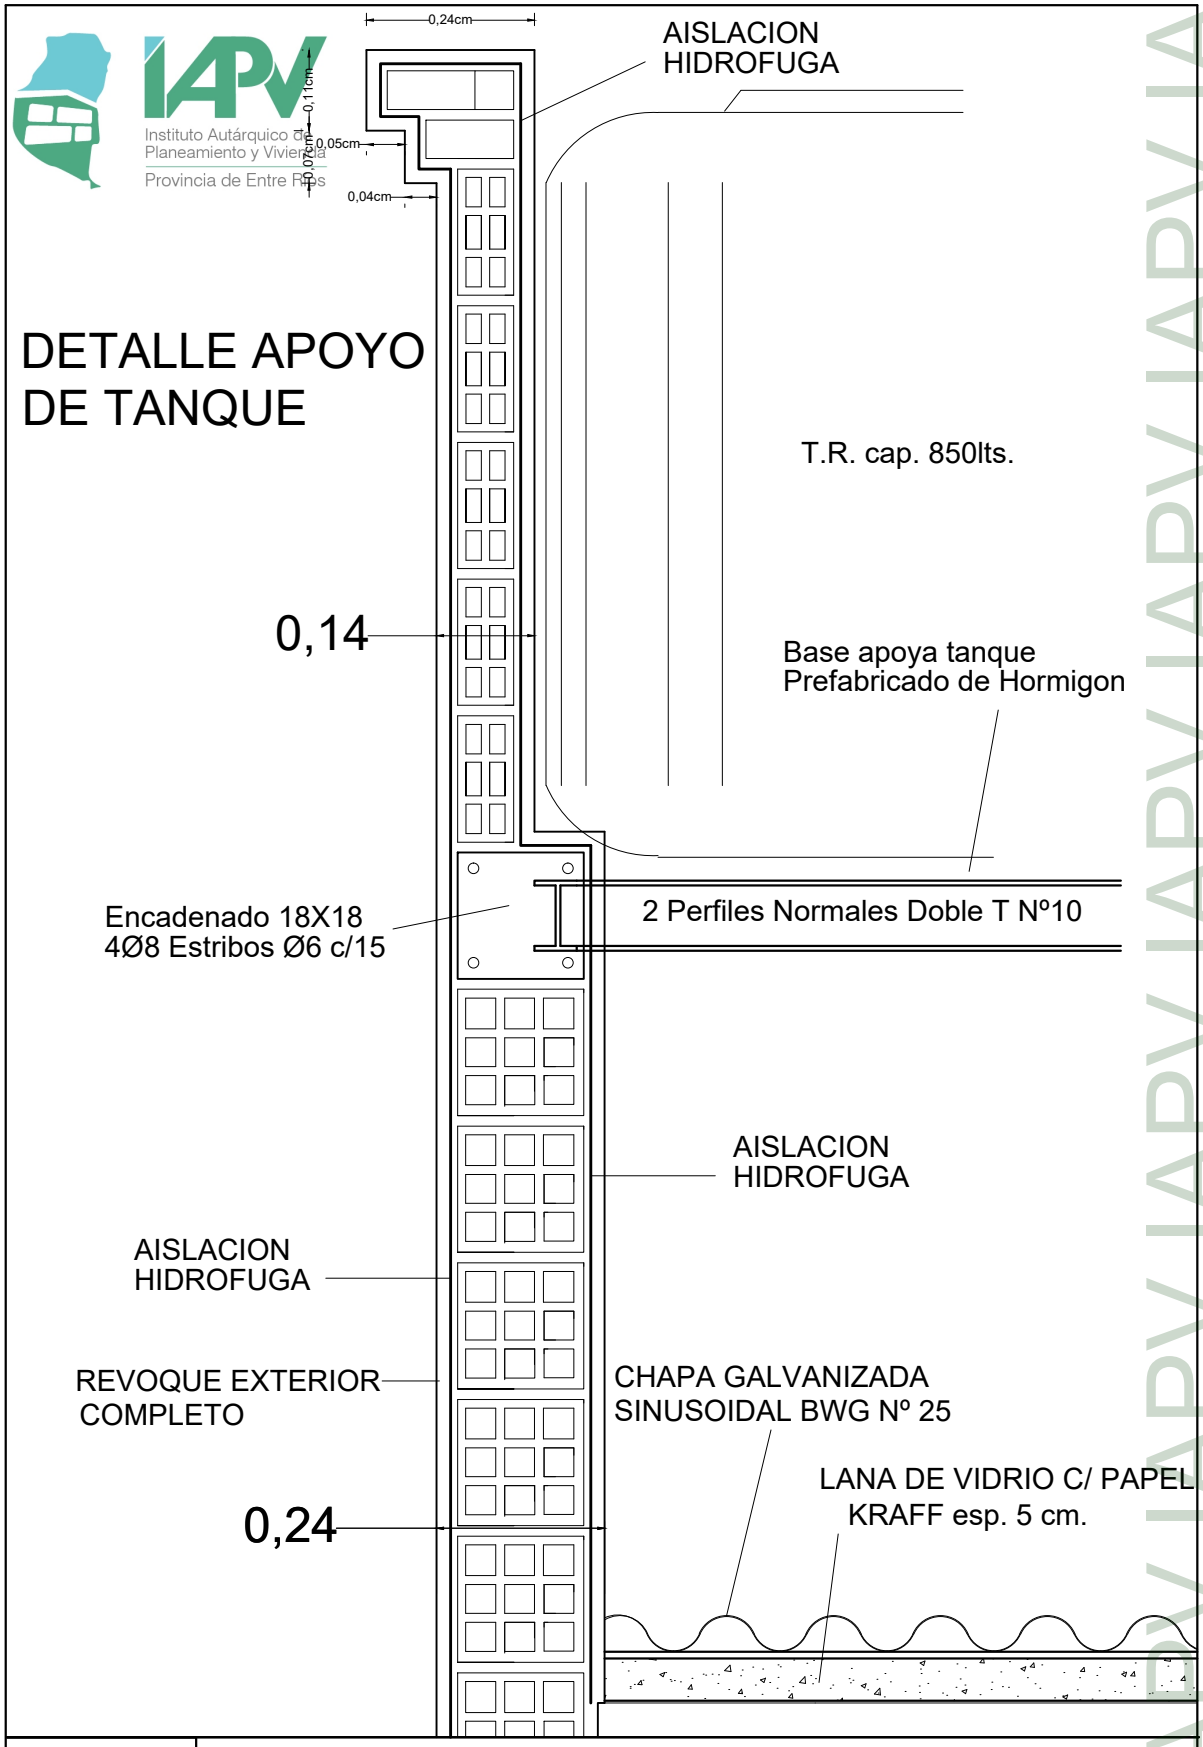


PLANO 50	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

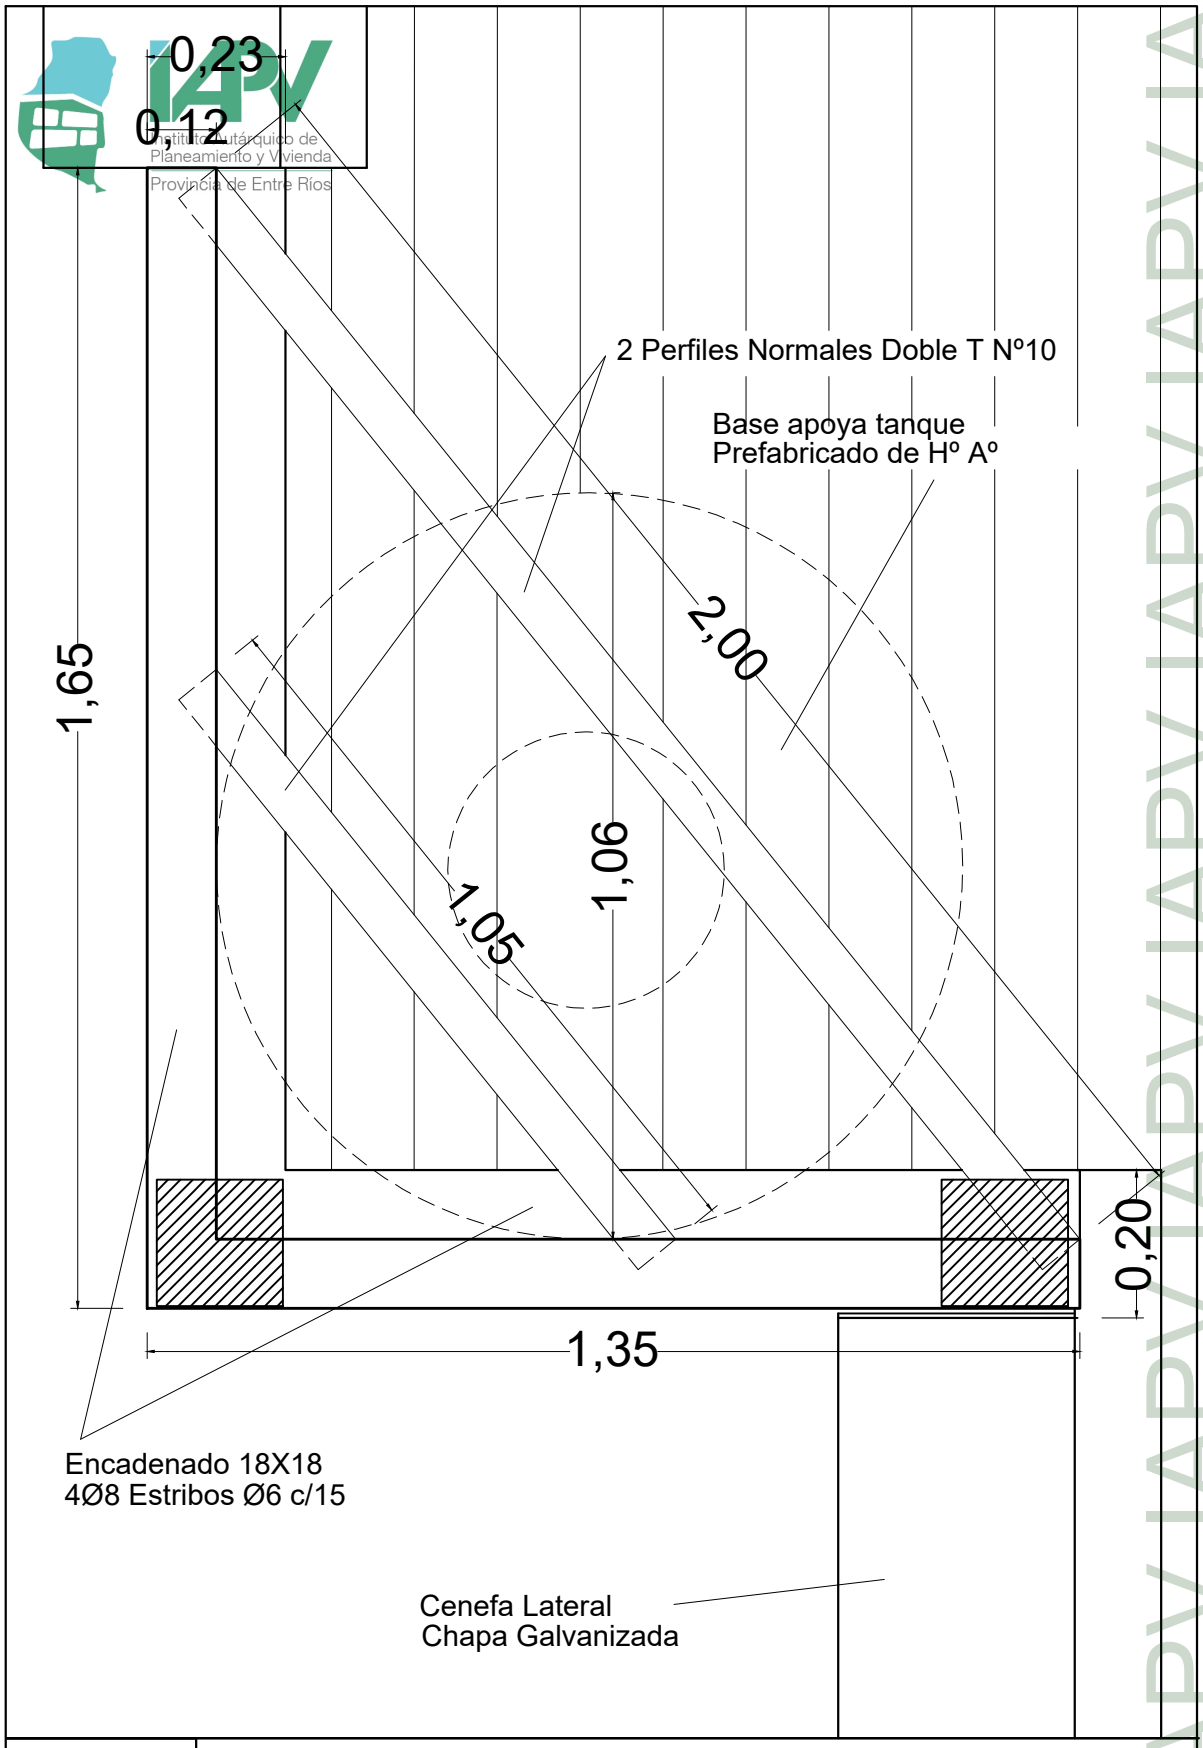

PLANO 51	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	PLANO DE: DETALLE Tanque de Reserva	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

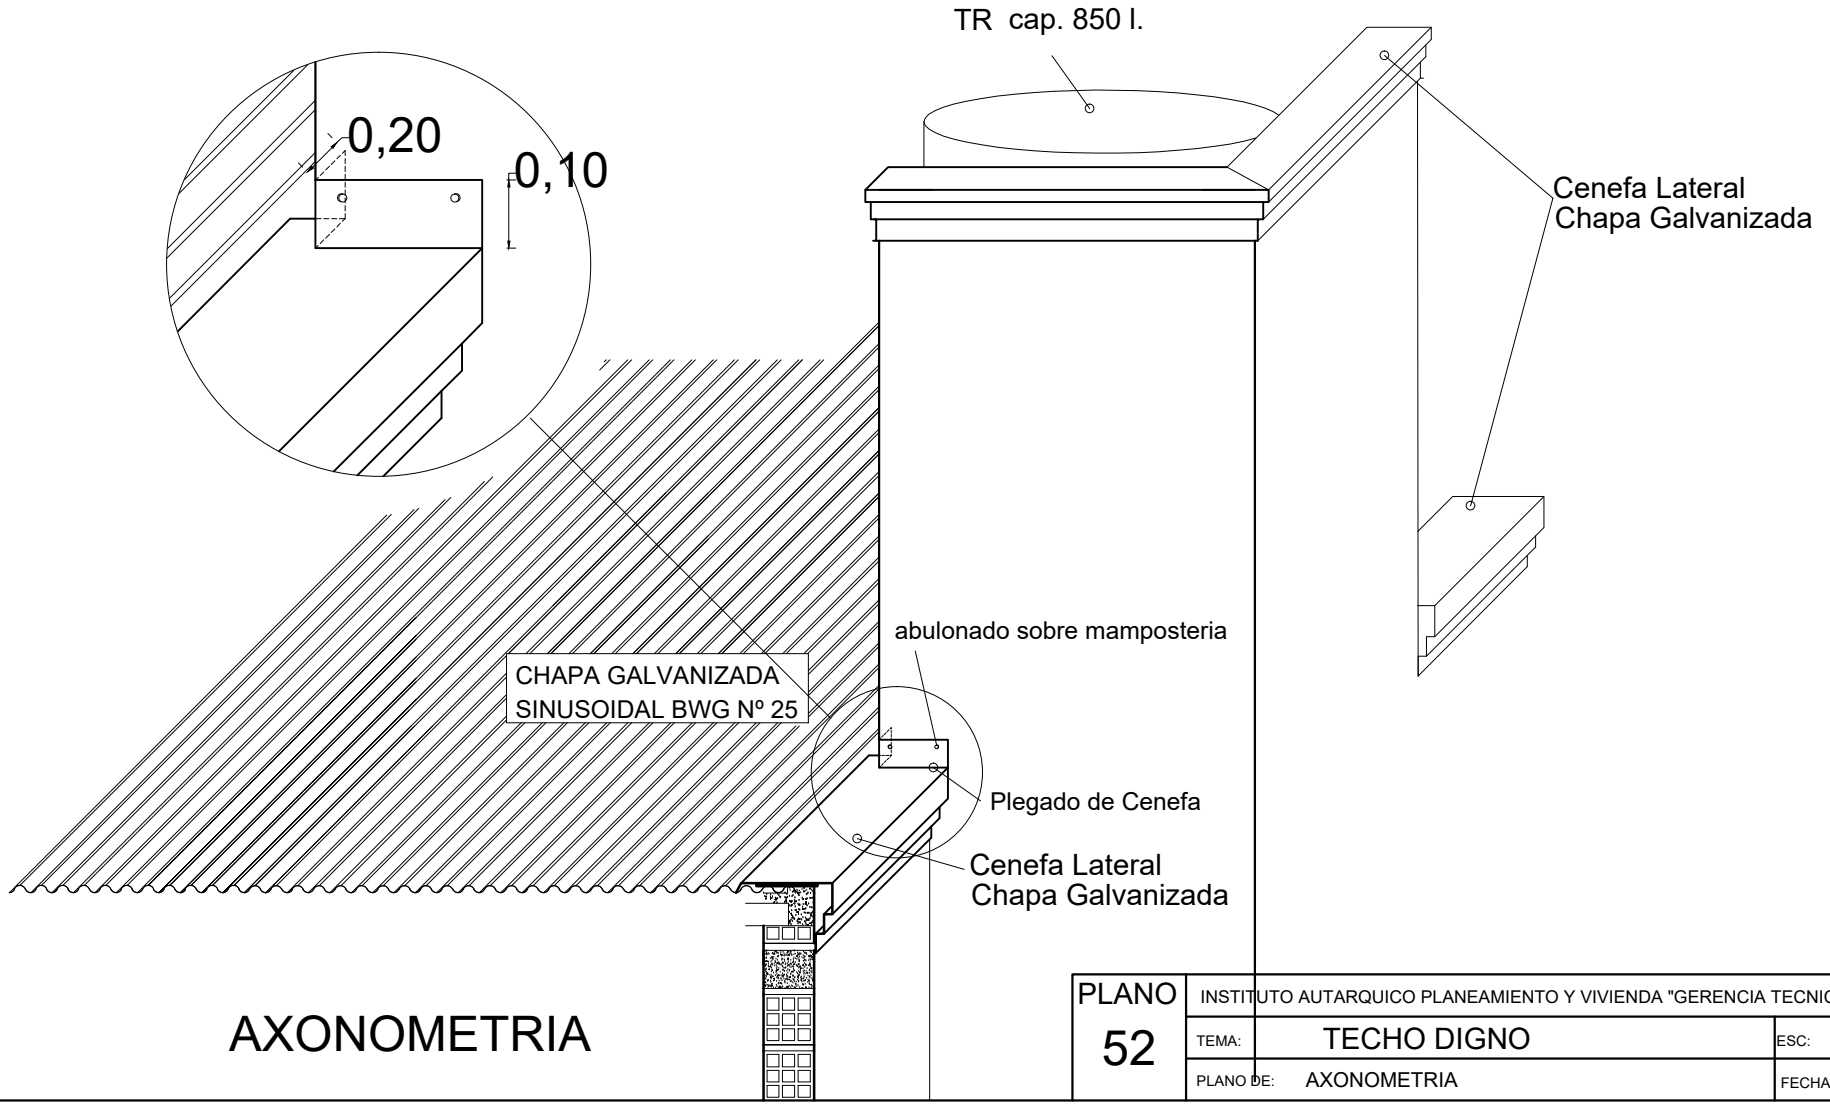

AXONOMETRIA

PLANO	INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA "GERENCIA TECNICA"	
52	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:25
	PLANO DE: AXONOMETRIA	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ELEMENTOS URBANOS


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

DETALLE
TALUDES entre LOTES

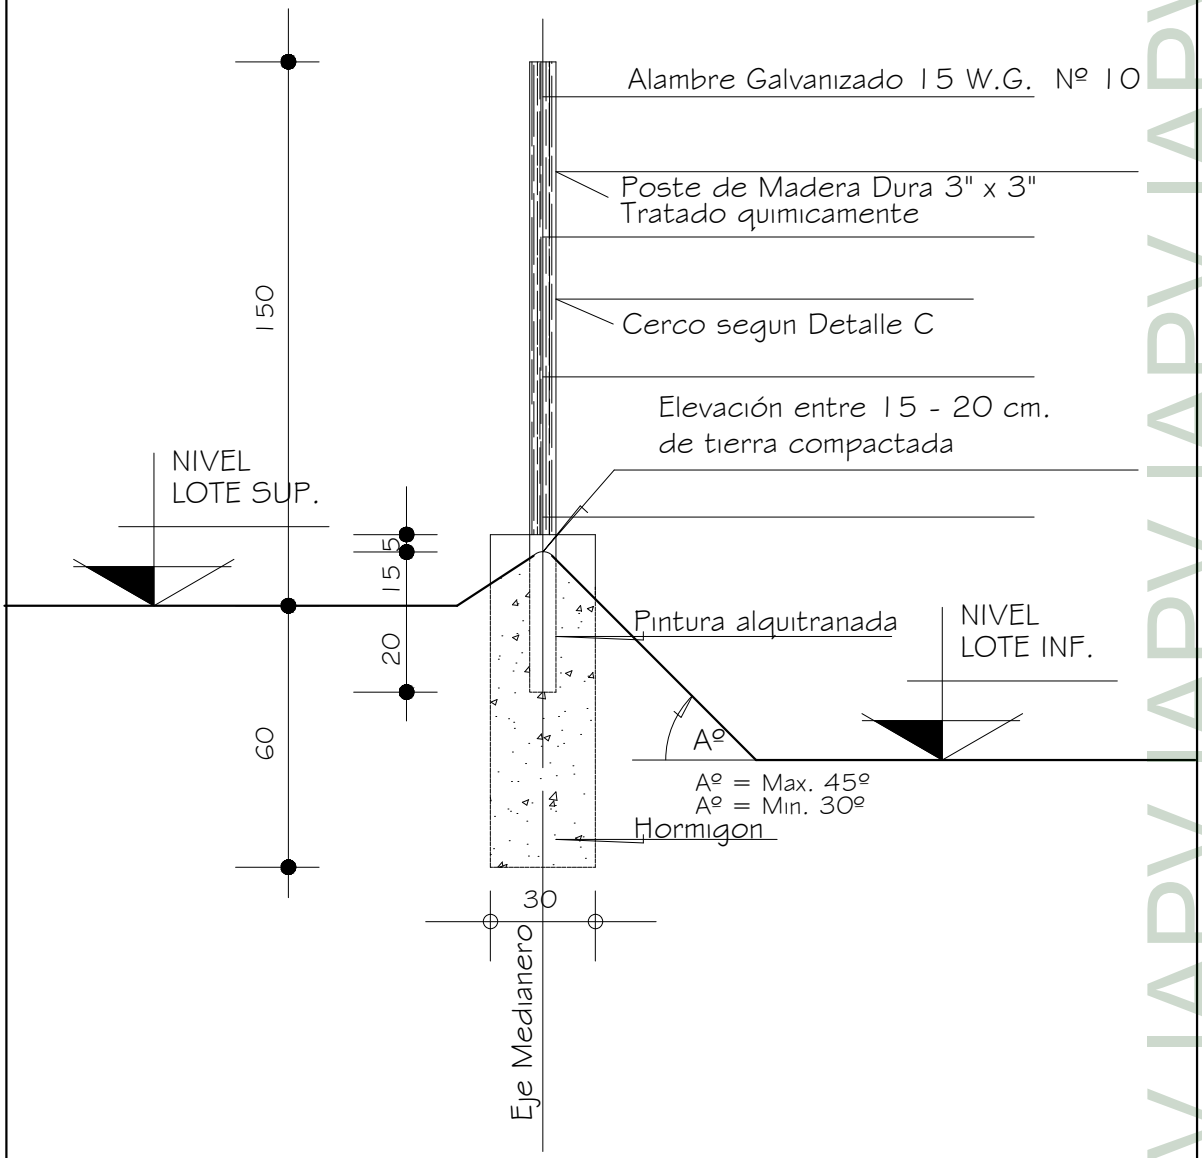


PLANO 53	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:5
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

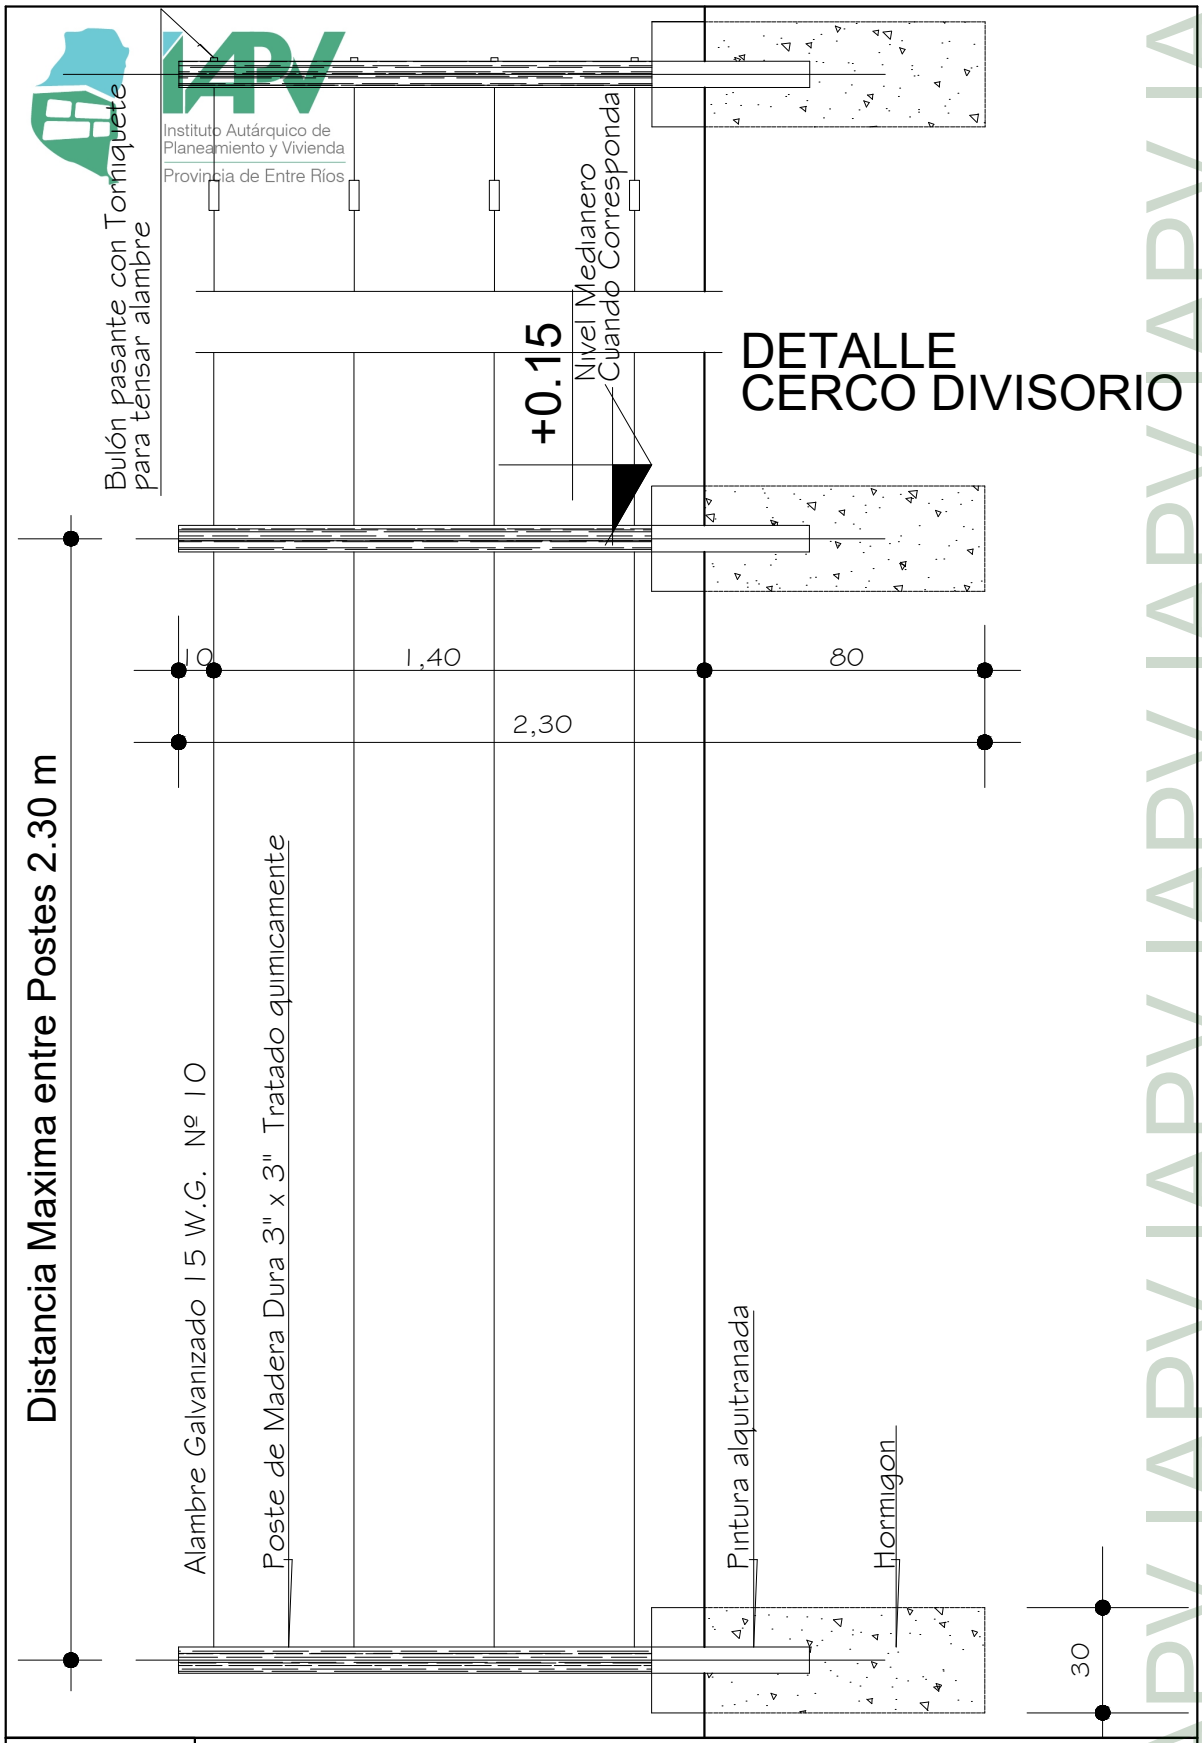

PLANO 54	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:5
	PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO	FECHA: 2016


IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

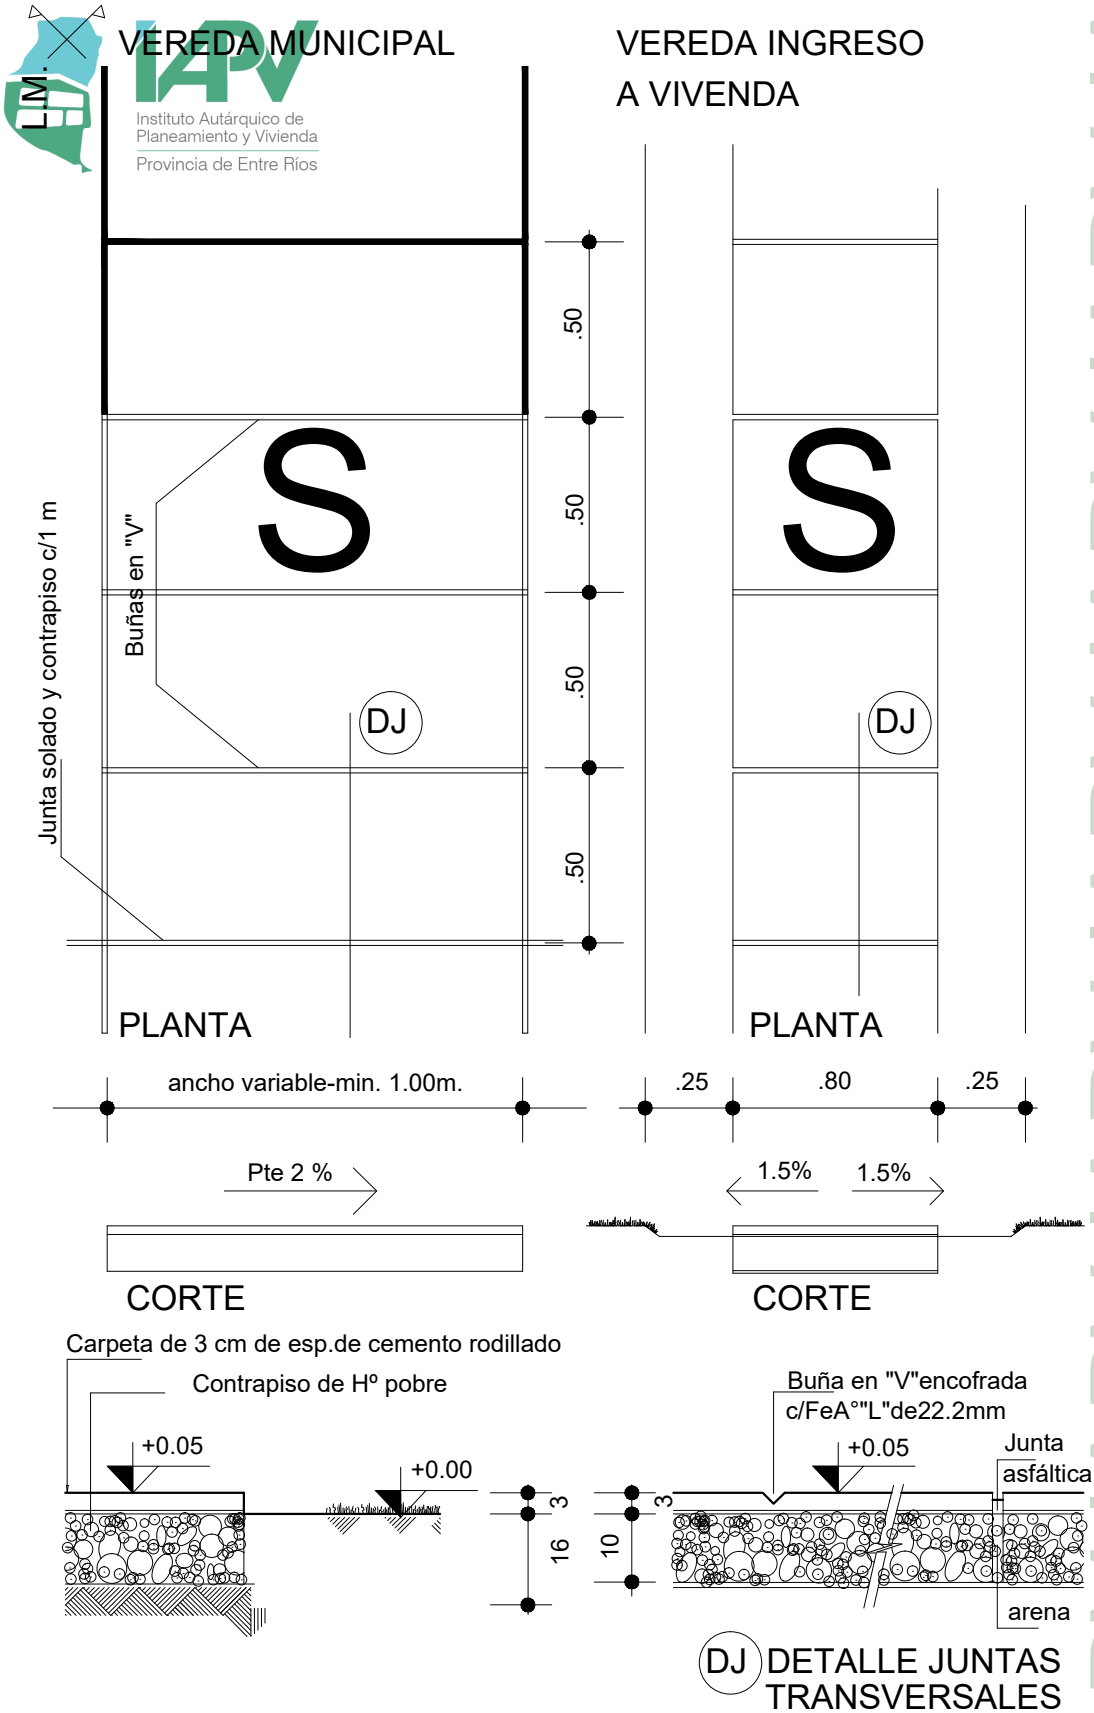


PLANO 55	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20 1:10
	DETALLE CONSTRUCTIVO - SOLADOS S	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

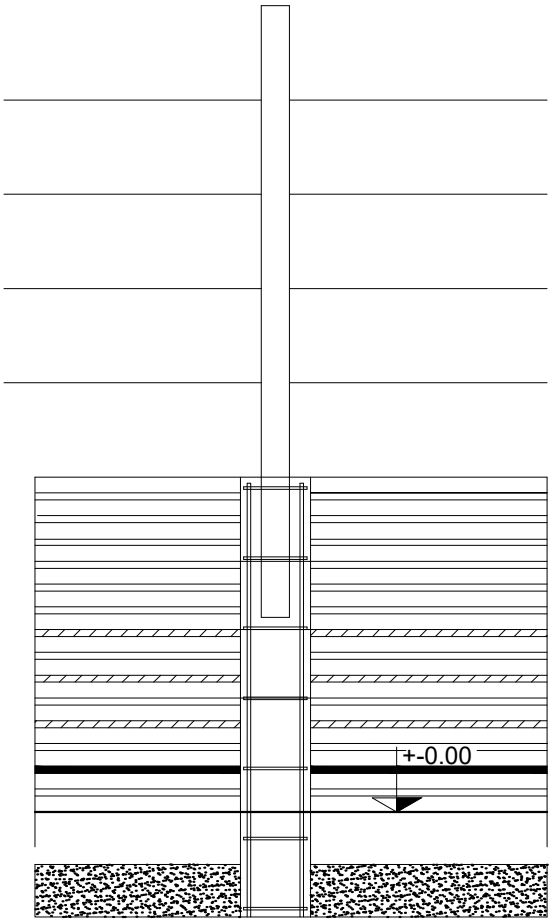

REFUERZO H°A° 4Ø6
ESTRIBOS Ø4,2c/20cm.
PELOS FEØ4,2c/4 hiladas

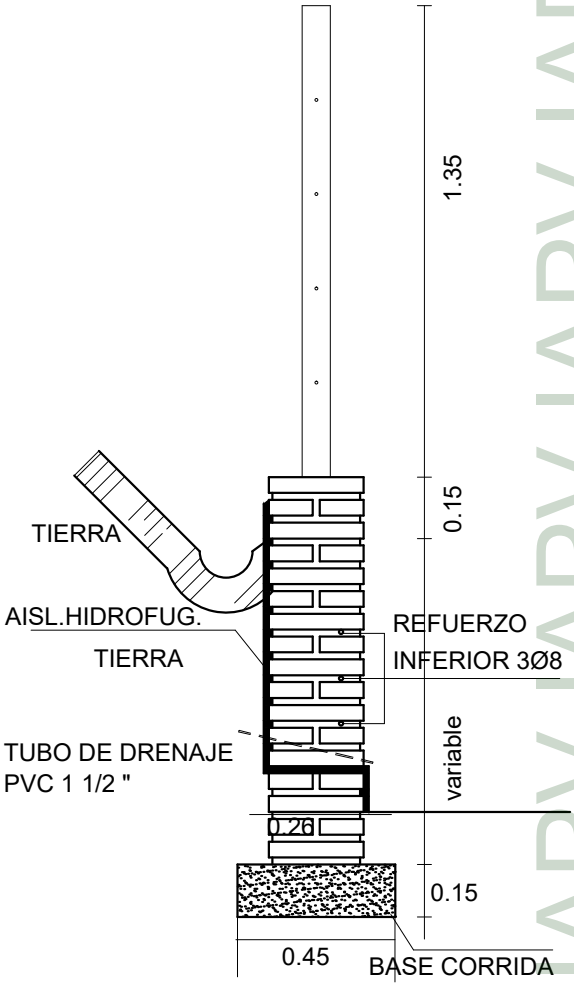

VISTA

(REFUERZO
VERT. EN CORTE)


CORTE

MC

MURO DE CONTENCION DESDE 0,60 m.
DE DESNIVEL ENTRE LOTES


PLANO	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
56	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	M.C. MURO CONTENCION	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

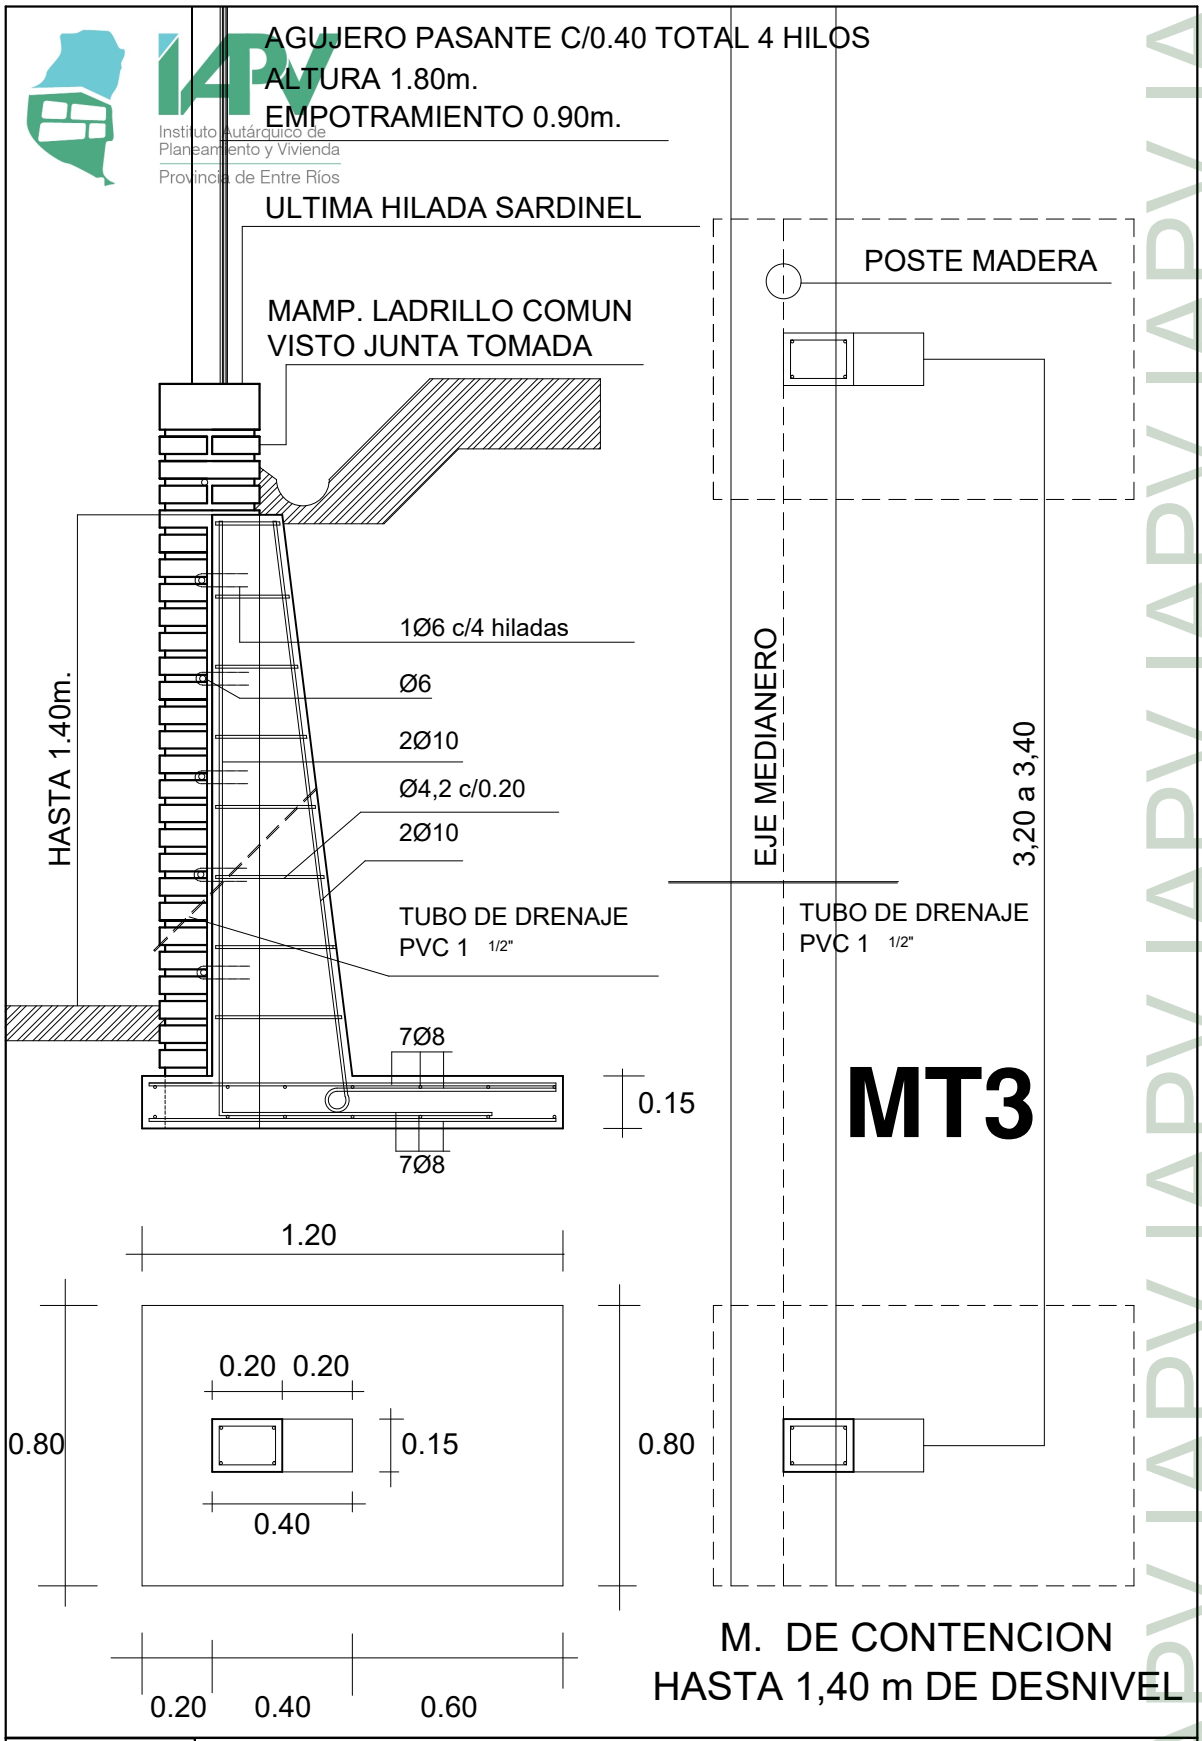


PLANO 57	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:20
	M.C. 3 MURO CONTENCION	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

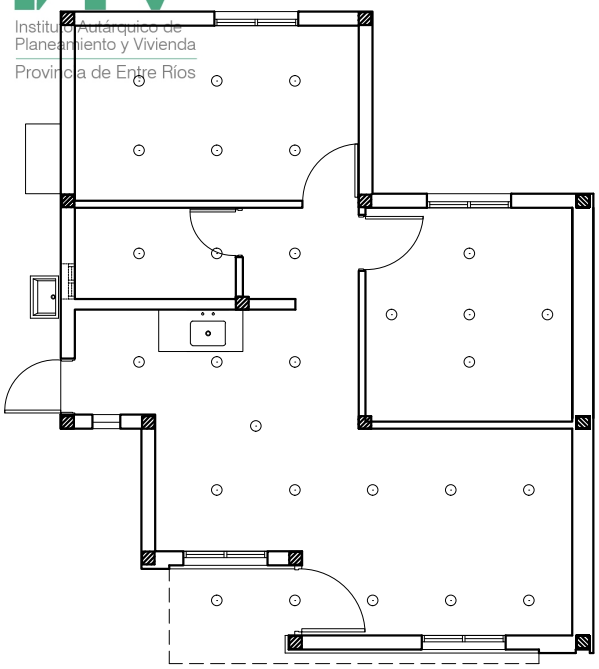

UBICACION DE 28
POZOS DE EXPANSION

PROTOTIPO 55,00m2

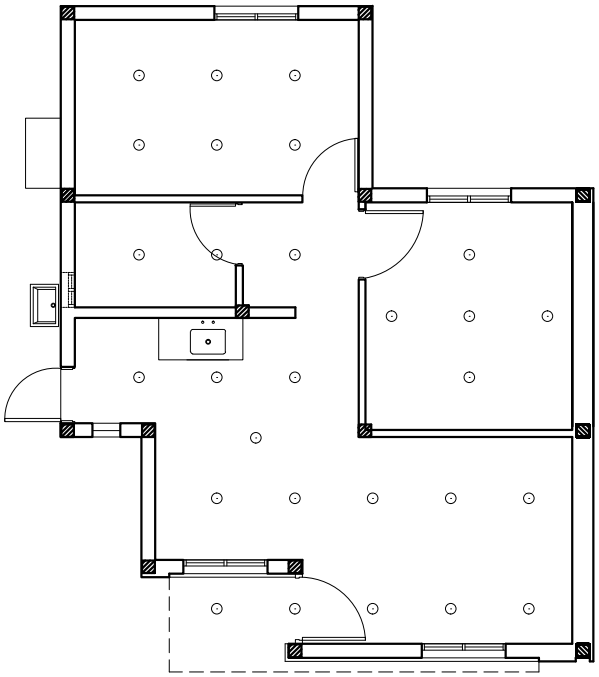


UBICACION DE 28
POZOS DE EXPANSION

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

PLANO 58	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:100
	UBICACION DE POZOS DE EXPANSION	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV


DETALLE POZO ABSORBENTE

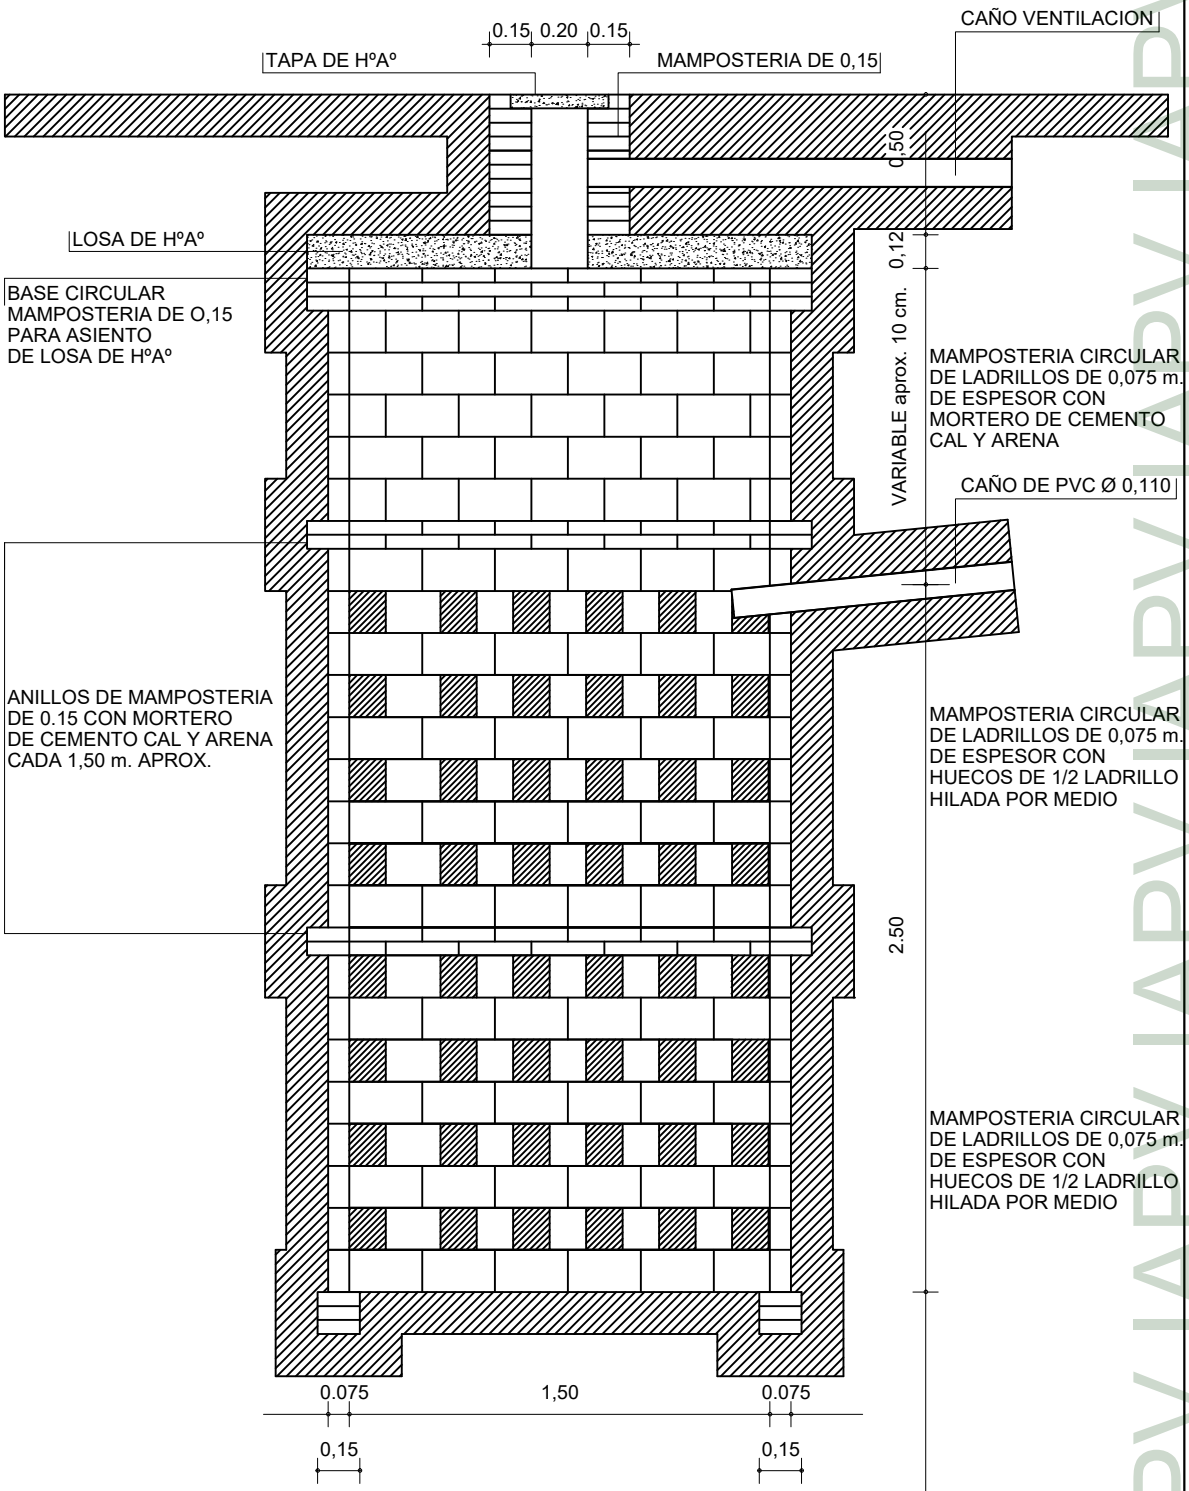


PLANO 59	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:25
	DETALLE CONSTRUCTIVO DE POZO ABSORBENTE	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Provincia de Entre Ríos

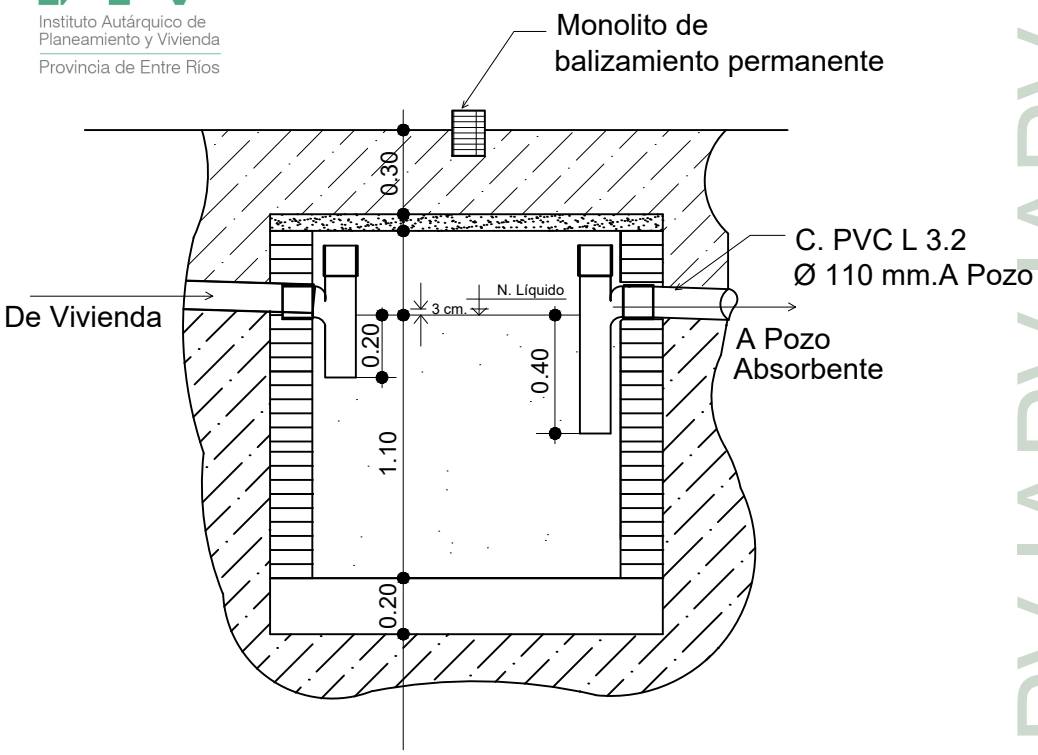

CORTE

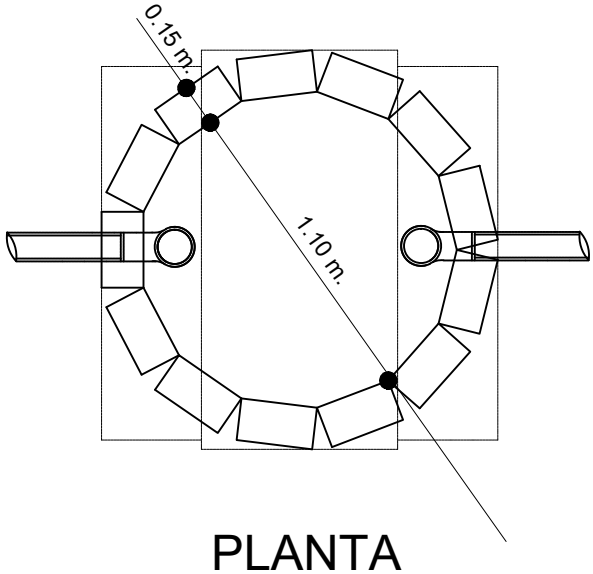

PLANTA

PLANO 62	INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA	
	TEMA: TECHO DIGNO	ESC: 1:25
	DETALLE CONSTRUCTIVO CAMARA SEPTICA	FECHA: 2016

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

1.TRABAJOS PRELIMINARES:

1-1LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO Antes de iniciarse la construcción, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, maleza, etc., que hubiere. Se cegaran los pozos que se encuentren en el predio.
Los terrenos destinados a la ejecución de las obras, deberán estar perfectamente nivelados, de acuerdo a las cotas de niveles del proyecto. Tarea que deberá realizar el encargado de ejecutar la Obra, a su cargo.

1-2VALLADO,CARTEL,OBRADORYOFICINADEINSPECCION: Se deberá
ejecutar un vallado de malla tipo sima o tejido romboidal sujetadas a postes. La factura y materiales deberán ser aptos para conservar su estabilidad y apariencia, sin deterioro ni deformaciones durante todo el plazo de ejecución de obra, a exclusivo juicio de la inspección de obra.

El cartel de obra se ejecutara de acuerdo al modelo adjunto.

Obrador: deberá construir locales para el abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. Los locales para cables, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán piso de tablones, aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua. No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir su consistencia o duración o sufrir en aspecto. La provisión de agua y energía para la construcción será por cuenta exclusiva del contratista, cualquiera sea su forma de obtención. Debiendo además cumplir con las Instalaciones sanitarias para el personal obrero.

Para la Inspección: se deberá proveer una habitación de 10 m² mínimo mas un baño en condiciones de habitabilidad, ira provisto con un escritorio, tres sillas, un equipo de computación con impresora, útiles de oficina, y además un espacio semicubierto para la protección de un vehículo, todo esto, a exclusivo juicio y aprobación de la inspección.

1-3REPLANTEO: Se procederá al exacto trazado de las bases de columnas, de los ejes de encadenados inferiores y ejes principales de la construcción, siendo verificados por la inspección, empleando para ello caballetes de madera e hilos tensos relacionado con el nivel que indiquen los planos. Estos hilos no serán

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de los mismos.
El trazado de las obras se ajustara estrictamente a los planos aprobados y las indicaciones que imparta la inspección.
Al hacer el replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencias para líneas y niveles, en forma inalterable, durante la construcción estos puntos deberán conservarse.

2-SUELOS

2-1. ESTUDIO DE SUELOS

Los estudios de suelos deberán proveer información sobre:

a) Trabajos realizados en campaña: indicando número de perforaciones, niveles de referencia, distribución de las mismas, profundidad, etc, etc.

b) Ensayos de laboratorio: Con determinación de:
Límites de Atterberg LL-LP(según normas IRAM). Humedad natural.
Granulometría.
Lavado sobre Tamiz N° 200. Densidad seca y húmeda.
Ensayos de compresión determinando los valores de cohesión y ángulo de fricción interna.
Representación de los ensayos realizados en terreno y laboratorio correspondiente a cada uno de los sondeos, etc., etc.-

c) Descripción del perfil hallado.

d) Recomendaciones.

Notas aclaratorias:
No se aceptarán *"Calicatas", ni "Informes geotécnicos preliminares".-.*
Los estudios de suelos deberán ser realizados por laboratorios y especialistas reconocidos en la materia. Los informes deberán estar firmados, sellados y en lo posible en hojas con logotipo. En caso de dudas de quien lo otorga, el I.A.P.V. se reserva el derecho de solicitarle información adicional. Deberán ser entregados en forma escrita y en soporte magnético.-

2-1-1.-Tratamiento de suelos: Si fuera factible el movimiento de suelos en forma mecánica deberán removerse los 0.50 m superficiales y recompactarse.
Bajo la superficie de vivienda y veredas perimetrales se deberán ejecutar hoyos de relajación de 0.15 m de diámetro y de 1.50 m de profundidad sin rellenar, a

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

razón de uno por cada m2, independientemente de la estructura fundacional que se adopte.-

2-1-2.Rellenos: Todos los rellenos de excavaciones se efectuarán con suelo del lugar débilmente compactado.-

2-1-3.Terraplenamientos: En caso de ser necesario elevar el nivel del terreno natural, el material de aporte a utilizar deberá tener un índice plástico menor a 12%, siendo ventajoso mezclar el mismo con un 20% de arena. En caso que esto no fuese posible resultará imprescindible que la compactación sea muy débil.

2-1-4.Excavaciones: Las excavaciones, se realizaran de acuerdo a la profundidad indicada en los planos, respetándose los anchos mínimos iguales a las bases correspondientes. Su fondo será completamente plano y previo humedecimiento estará apisonado y nivelado, con sus taludes bien verticales. Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no deberá realizarse el relleno posterior con tierra, arena, cascote, etc., debiendo hacerse con el mismo material con que se construirá la fundación. Si se ha considerado la ejecución de platea, su fondo será completamente plano y previo humedecimiento estará apisonado y nivelado.

3.HORMIGON ARMADO: Será de aplicación el Reglamento **CIRSOC 201** - 2005 “Reglamento Argentino de Hormigón Armado" de acuerdo a lo establecido por Resolucion **734 del M.P.I.y S.** vigente a partir de Enero del 2015. En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. La Resistencia característica mínima del hormigón a utilizar a los 28 días será **H-20**: 200 kg/cm2 y, cuando se trate de la fundación, bases ó plateas, el contenido de cemento no será inferior a 300 kg/m3.
El acero empleado en barras será ADN-420 y para mallas AM-500.

3-1-Basesdefundación: Deberán tener las dimensiones indicadas en las planillas de calculo de bases, como también se deberá respetar la profundidad indicada. Para el cálculo se tendrá en cuenta además del peso trasmitido, la resistencia del terreno, obtenida mediante el Estudio de Suelos. En cuanto a la superficie de asiento se deberá respetar lo indicado en el punto 2.

3-2-Fustes: En lo posible deberán ser prefabricados y aislado su perímetro del suelo circundante mediante escombros o material suelto.-

3-3-Vigasdefundación: Serán de un ancho igual al del muro que soportan y por debajo de la misma deberá preverse un sistema constructivo que asegure un vacío de 0.15 m de alto entre el nivel inferior de la viga y el suelo subyacente. Se deberán dejar “pelos” de anclaje para contrapisos y veredas, el nivel superior de la viga coincidirá con el del contrapiso y sobre ella se ejecutará la capa aisladora.-

3-4-Refuerzos verticales: Se deberán ejecutar en forma conjunta con las mamposterías, las que contarán con “pelos” de anclaje.-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

3-5-Veredaslaterales: Ancho mínimo 0.60 m, con pendiente acusada hacia el exterior, con junta de dilatación cada 1.20 m. aprox.-

3-6-. Estructurasoportedetanque:
El Tanque de Reserva se apoyará sobre mampostería reforzada y perfil normalizado doble T N° 10. El mismo, de ser de polietileno de alta densidad, se apoyará sobre una Base para tanque prefabricada de H°A°, destinada para ese fin. El tanque será sujetado de manera que este garantizada su estabilidad.

3-7LosaingresodeHºAº
La losa deberá ser proyectada como una losa de hormigón calculado con una resistencia característica mínima según lo indicado en el Item 3, armada como se lo indica en plano.

3.8-PLATEADEFUNDACIÓN:

3.8.1:DelEstudiodeSuelos: La propuesta de ejecución de losas de cimentación o plateas integrales deberá ser avalada o aconsejada por quienes realizan el estudio de suelos donde se emplazará la obra, incluyendo las sugerencias o precauciones a tener en cuenta.
Se debe considerar como una fundación apoyada en un medio elástico, por lo tanto el estudio de suelo debe estar acompañado de los datos del valor del "coeficiente de balasto" o "coeficiente de compresibilidad" vertical "Ks" admisible en kg/cm3, como así también la tensión admisible superficial en kg/cm2 del Terreno.
El dato aportado en el punto anterior será una condición necesaria al momento de aconsejar una fundación superficial, además del estudio convencional a las profundidades estipuladas y los números de pozos que los especialistas del estudio de suelo lo determinen.

3.8.2:DelProyecto: La platea podrá proyectarse como solo una losa de fundación en toda su superficie, o losas rigidizadas por vigas, en ambos casos debe incluirse e integrase las veredas perimetrales de las viviendas, excepto la vivienda que este sobre medianera que no posee vereda perimetral, en éste caso la losa de fundación terminará siempre en una **Viga de Borde**, la cual tendrá una altura mayor o igual a **25cm**.
El espesor de la Losa de Fundación no será menor de **12 cm** en el interior, y **9 cm** en la vereda perimetral. Estos espesores son mínimos e independientes de otros mayores que pueda determinar el calculista.
A la platea, en la vereda perimetral, no se le practicaran juntas, porque se debe tomar como estructura, salvo alguna que pueda determinar el calculista.
Aun en el caso que el estudio de suelo no lo disponga se ejecutara previamente a cada platea, pozos de expansión de Ø 0,20 m y 1,50m de profundidad en la cantidad aproximada de uno cada metro cuadrado distribuido en tresbolillo o bien en su reemplazo zanjas de expansión de 0,20m de ancho por 0,40m de profundidad, ejecutadas en cruz en cada ambiente de la vivienda sin que los extremos de las zanjas lleguen a la vereda perimetral. Debe tomarse la precaución que al llenado de las plateas no ingrese hormigón a los pozos o zanjas.
Sobre el suelo preparado para recibir la platea se colocara un film de polietileno de 150 micrones en toda la superficie de la platea. En caso de solapes no será menor de 15 cm.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

En el caso que por planimetría de la obra se tenga que disponer de juntas de dilatación la que puede estar acompañada a veces por desniveles, se dispondrá siempre de vigas de borde para los cuales se presentaran los detalles respectivos. 3.8.3: Calculo y Dimensionamiento: Para el cálculo de esfuerzos se debe emplear software desarrollados para este tipo de fundación (losas/vigas apoyadas en un medio elástico, utilizando mallas o emparrillados que dividan la platea en una medida no mayor a 60cmx60cm.
Se colocará una armadura mínima superior e inferior en toda la superficie de la platea, admitiéndose como tal la malla electrosoldada **Ø6** mm 15x15 con un solape entre ellos minimo de dos cuadros. **más** los refuerzos necesarios donde el cálculo así lo indique, considerando para el mismo y su ejecución un **recubrimiento mínimo** inferior y superior de **2.5cm**.

3.8.3 :Presentacion de Documentacion
Estudio de Suelo: Cumplimentando lo descrito en punto 3-1
Memoria de Calculo: Debe contener esquema de cargas, tipos, valores y ubicación- Diagramas de características- Planilla resumen indicando tipo de hormigón, los puntos y valores de mayores esfuerzos, con el dimensionamiento correspondiente. Verificación de los puntos de mayor desplazamiento que no supere las tensiones admisibles del terreno, dado por el estudio de suelo.
Planos de obra: esquemas o planos donde quede indicadas dimensiones y espesores de la platea, con especificación de armadura, ubicación, Ø, longitudes de corte, empalmes, etc.

3.8.5 : JUNTAS DE DILATACION: En los casos donde se produzca continuidad en las viviendas, se deberá ejecutar junta de dilatación en medianera, conforme al detalle constructivo, y en los lugares donde indique la Inspección de Obra. En ningún caso se aceptará una distancia entre ambas juntas superior a 18 mts.

4-MAMPOSTERÍA EN ELEVACION

4-1. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES: Los espesores serán los indicados en planos provistos en el prototipo adjunto.
Los ladrillos a utilizar serán de primera calidad, de estructura compactada, uniforme y sin vitrificaciones utilizando como material ligante un mortero de asiento con un dosaje ¼:1:4 (cemento-cal-arena).

4-2.MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS CERÁMICOS: Los espesores serán los indicados en planos provistos en el prototipo adjunto.
Serán de primera calidad, no aceptándose ladrillos rotos o con rajaduras, Se ejecutara conforme a lo especificado en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.
La mampostería se ejecutara con sujeción a las siguientes exigencias:

a) Los ladrillos se colocaran mojados.
b) Se les hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla apretándolos de manera que esta rebase por las juntas.
c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas.
d) Las juntas serán alternadas de modo que no se correspondan ni vertical ni horizontalmente, en hileras sucesivas y tendrán un espesor de 0,02 m.
e) La trabazón habrá de resultar perfectamente regular.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

f) Los surcos que se crucen o empalmen, serán trabados convenientemente.
g) Los muros se levantaran empleando la plomada; el nivel; las reglas; etc. a fin de que resulten bien horizontales, a nivel y a plomo.
h) Las paredes, tabiques y pilares deberán quedar perfectamente a plomo y no se admitirán pandeos en sus caras.
i) No se permitirá llenar huecos de andamios con ripio o basura, sino con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida necesaria.
j) Vanos, los antepechos de todas las ventanas llevaran dos hierros de Ø 6, en sus dos hiladas inmediatas inferiores superando con su largo 50 cm. a cada lado el ancho del vano. Tendrán la pendiente necesaria para asegurar el libre escurrimiento del agua lanzada por los botaguas y estarán revestidos con el revoque exterior.
El encadenado superior cumplirá también la función de dinteles en vano de ventanas y puertas.

5-CAPAS AISLADORAS: En todo el desarrollo de los muros, se ejecutarán a modo de aislación hidrófuga dos capas aisladoras horizontales de 2 cm. de espesor como mínimo, unidas verticalmente entre sí (selladas). La aislación se realizara con mortero de cemento 1:3 (cemento-arena) con 1 kgr, de hidrófugo cada 10 ltrs. en el agua de amasado, aplicada en forma prolija y uniforme, perfectamente nivelada. Por sobre la capa aisladora horizontal superior se extenderá un revoque con hidrófugo hasta una altura de 20cm.

6-CUBIERTA:

6-1 De chapa galvanizada: Se emplearan chapas metálicas galvanizadas sinusoidales BWG Nº 25, sobre la estructura de perfil estructural "C" de fleje laminado en frío y conforme al plano respectivo, empotrados estos en la mampostería de ladrillos, y anclándose en el encadenado superior de hormigón armado. Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes
con arandela de neoprene, los que atravesaran la chapa en la parte superior de la onda en ningún caso habrá menos de 6 tornillos por m2 de techo. Las chapas se colocaran del largo requerido a un solo faldón, evitando los solapes transversales.
Entre la chapa metálica y los perfiles, y a los efectos de actuar como barrera de vapor y aislante térmico, se colocara una manta de lana de vidrio **hidrorepelente**, revestido en una de sus caras con papel kraft plastificado, de 5,0 cm de espesor total (la lana de vidrio se colocará con el papel Kraft hacia el inferior). La misma se sujetará además con alambres cruzados a fin de evitar el pandeo.

La cumbrera, y las cenefas laterales se ejecutaran según detalles adjuntos.

7-REVOQUES:

7-1REVOQUE INTERIOR: Se ejecutara un grueso a la cal fratasado, con posterioridad a la correcta preparación de los paramentos de muros. El revoque una vez terminado, no deberá presentar rebabas, fuera de plomo, u otros defectos cualesquiera. Se ejecutará hasta una altura de 10cm. por sobre el nivel de cielorraso, a excepción de la pared medianera que se revocará hasta la altura de cubierta.

7-2REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO: En baño se ejecutara con mortero de cemento, mezcla

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

1:3 (cemento-arena) con 10 % de hidrófugo a una altura de 1,60 m. en todo el perímetro y una franja de 0,30 m. de ancho hasta 2,10 m. de alto en coincidencia con la ducha.
En cocina y lavadero la misma mezcla en paredes en contacto con la mesada y la pileta de lavar, con una altura de 0,60 m. sobre el nivel de mesada.

7-3REVOQUE EXTERIOR: Llevara un azotado de cemento y arena mezcla 1:3 con 10% de hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado, para el cual se exigirán las mismas consideraciones descriptas en el punto 7-1.
Donde se indica revestimiento formulado en base a resinas acrílicas y cargas minerales se aplicaran con llanas.

8-CIELORRASO

8-1: CIELORRASO DESMONTABLE DE YESO: Se realizara con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm. de ancho y 32 mm. de alto, con vista prepintada en blanco y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm. por 20mm. prepintados en blanco.
Los perfiles perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. . Los perfiles largueros se ubicaran en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m– suspendidos de la cubierta mediante doble alambre galvanizado nº 14 o varillas con nivelador,. La estructura se completara colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de0.61m, separación.; de manera que queden conformados módulos de 0.61m x 0, 61m. Sobre la estructura de perfiles descripta anteriormente se apoyaran placas de yeso desmontables Durlock o similar de 6,4mm. de espesor, de 0,606m. x 0,606m, con bordes rectos y pintadas.
En el caso que las placas durante su colocación resultasen dañadas en su pintura, las mismas deberán ser repintadas con látex color idéntico al utilizado en las placas.
Se deberán presentar muestras del material a utilizar a la Inspección para su aprobación definitiva.

9- CONTRAPISOS: Se ejecutara donde lo indique la planilla de locales, con un espesor de 0,12 m. en interior y 0,10 m. en vereda perimetral con un dosaje de ¼:1:3:6 (cemento, cal, arena, cascote). Se deberá apisonar previamente el terreno, mojándolo antes de ejecutar el contrapiso.

10. PISOS: En el interior de la vivienda y en veredas perimetrales, sobre el contrapiso, se ejecutará una carpeta de cemento de 2 cm. de espesor, mezcla cemento - arena 1:3 con terminación fratasada. En las veredas perimetrales deberá preverse juntas de dilataciones cada 1,20 m. aproximadamente.

En el caso de haberse previsto platea de fundación también se ejecutará una carpeta de cemento de 2 cm. de espesor, mezcla cemento - arena 1:3 con terminación fratasada en el interior de la viviendas y en la vereda perimetral se ejecutará un fratazado al momento de ejecutar el hormigón, con pendiente hacia el exterior.

Sobre la carpeta mencionada en el local baño se colocará un piso de cerámico esmaltado

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

de color claro de 20x20 o de similares dimensiones, en el resto de los locales se colocara un piso cerámico de tono oscuro de 35x35, todos estos pisos deberán ser de 1º calidad, cuya resistencia al roce deberá ser PI 4 y se ejecutará conforme a el Pliego General de Especificaciones Técnicas y en los lugares indicados en la planilla de locales. Su colocación se hará con pegamento para cerámico, las juntas irán tomadas con pastina de color acorde al piso.

11-ZOCALOS:
11.1: INTERIOR: Se colocará zócalo de cerámico de 10 cm de altura de 1º calidad y en los lugares indicados en la planilla de locales, de igual características del piso.

12-REVESTIMIENTO En baño se ejecutará un revestimiento cerámico de color claro de 20x20 o 30x30, hasta una altura de 1,80 m., en coincidencia con la ducha en un ancho de 0,30 cm. se llevara la altura a 2,10 m. Su colocación se hará con pegamento, con juntas tomadas uniformando las mismas con pastina acorde al color del revestimiento.
En cocina se ejecutará un revestimiento del mismo material con una altura de 0,60 m. sobre mesada, por detrás y lateralmente del artefacto cocina dicho revestimiento se colocará hasta el nivel de piso.
Sobre pileta de lavar se colocara el mismo revestimiento en una superficie de 0,60 x 0,60 m.

13-ABERTURAS: Se seguirán las especificaciones dadas en planos y planillas de carpintería, resolviendo en forma idónea lo no especificado y presentando muestras a la inspección, esta última circunstancia debe ser estrictamente respetada.

13-1De madera: Serán de 1º Calidad. Se deberá tener en cuenta el adecuado secado de la madera utilizada en la abertura como el tratamiento preservador. Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Deberá exigirse el doble contacto entre hojas y marcos.
Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes; las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras; las cabezas de los tornillos con que se sujeten contramarcos, botaguas, zócalos, etc. deberán ser bien introducidas en el espesor de las piezas. Cuando se utilicen maderas terciadas estas serán bien estacionadas encoladas en seco.
13-2De aluminio: Se ha considerado toda la carpintería exterior en de Aluminio Linea Standart de primera calidad, el marco y hoja esta determinado en las correspondientes planillas de aberturas, como también su terminación. Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los marcos de puertas y ventanas.

14-INSTALACIONES:

14-1- INSTALACIÓN SANITARIA INTERNA

14-1-1 TRAMITES OFICIALES:
La Contratista deberá ejecutar bajo su cargo la elaboración de la documentación técnica de proyecto y realizara la presentación del mismo ante el Organismo prestatario del servicio,

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

según las "Normas de O.S.N.", abonando los aranceles que correspondan. Tal documentación deberá ser visada previamente por el I.A.P.V., dentro de los treinta días de firmado el Acta de Entrega del terreno, dado que no se podrá dar inicio a los trabajos específicos, sin la obtención de la aprobación del Organismo Prestatario del servicio.
Los trámites reglamentarios correspondientes a la ejecución de las obras, deberán ser realizados por la Contratista, abonando los aranceles correspondientes (inspección de obra, aprobación de PLANOS CONFORME A OBRA, etc.) y confeccionando los PLANOS CONFORME A OBRA, correspondientes.

14.1.2. PROVISIÓNDEAGUA

Se ejecutara de acuerdo a los planos correspondientes.
Las conexiones domiciliarias desde la red hasta la llave de paso se ejecutaran en cañería de PEN d = 13 mm. (polietileno negro) de 8 kg/cm2. de presión de trabajo (C-8) con piezas especiales "inyectadas" y unión a enchufe (dilatación por calentamiento).-
Los tubos para las conexiones domiciliarias pueden curvarse en frío, sin inconvenientes, con un radio de curvatura de aproximadamente ocho (8) veces su diámetro exterior.

En las localidades de servicio medido se incluirá el MEDIDOR DE CONSUMO, debiendo ser de marca de calidad reconocida y de las siguientes características:

-Principio de funcionamiento: a chorro múltiple.
-Tipo de cuadrante: húmedo.
-Sistema de lectura: directo – digital.
-Conexión: para cañería de P.E.N. d: 13 mm. y /o el diámetro que se indica en los planos correspondientes.
Previo a la adquisición de los medidores, la Empresa Contratista, deberá presentar catálogos correspondientes a la marca que proponga, los cuales serán sometidos a aprobación del ente prestatario del servicio correspondiente.
La cañería de alimentación desde la llave maestra hacia toda la vivienda, se ejecutara en caño de Ppr (con uniones roscadas o por termofusión utilizándose solo un sistema u otro)
Sistema con uniones roscadas:
d: 13mm de e:2.8mm, con piezas especiales inyectadas con uniones roscadas. Para cada una de las viviendas se ejecutará e instalará:

a) Tanque de reserva de 850 litros de capacidad de Polietileno A. D. (Bicapa).
La altura mínima de fondo de cuba, con respecto al nivel de ducha será de **2.50** metros.

b) Dos (2) bajadas del tanque de reserva:
1- Para distribución de agua fría, en cañería de polipropileno, con uniones roscadas de 13 mm. de diámetro (e min.: 2,8 mm.).
2- Para alimentación de calefón, en caño de polipropileno con uniones roscadas de 19 mm. de diámetro (e min.2,5mm.).
c) La distribución de agua caliente se ejecutara en caño de polipropileno, con uniones roscadas de diámetro 13 mm.(e min.: 2,8 mm.).
Las válvulas y llaves de paso a instalar, serán esféricas (1/4 vuelta), de plástico inyectado, de diámetros según se indican en los planos, y con campana las que correspondan al calefón.
Sistema con uniones de termofusión :
En el caso que se utilice el sistema de cañerías con PPCR (tipo 3) para

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

termofusión se tomarán las mismas consideraciones que para el sistema anterior
- Teniendo en cuenta los diámetros equivalentes con el sistema anterior asi : Ø 13mm. rosca equivalente en termofusión Ø 20 mm.
Ø 19 mm. rosca equivalente en termofusión Ø 25 mm.

14.1.3DESAGÜECLOACAL:

Se ejecutara según plano, se construirá con caños y accesorios de P.V.C. rígido, fabricados según NORMAS IRAM Nros. 13.325, 13.326 y aprobados por O.S.N.- Las uniones de los caños entre si y de estos con las piezas especiales se efectuaran por el sistema de espiga y enchufe con interposición de un adhesivo especial s/ NORMA IRAM Nro. 13.385, constituido por resina de policloruro de vinilo disuelta en un solvente fácilmente volátil.
En el momento de ser utilizado el adhesivo presentara una buena dispersión de la resina en el solvente y un estado suficientemente liquido como para permitir una fácil extensión a pincel sobre la superficie a unir, las cuales deberán limpiarse con prolijidad preferentemente con el mismo solvente, a efectos de eliminar grasitud, pudiendo también efectuarse un suave esmerilado para facilitar la acción del adhesivo. La profundidad del enchufe y de la espiga en la cual se acople no será inferior a la establecida en la NORMA IRAM nro. 13.331, eventualmente también podrá realizarse la unión por soldadura, empleando a ese efecto varilla de policloruro de vinilo, aplicada mediante aire caliente a soplete sin llama, sobre el borde libre de enchufe y la periferia de la espiga.

Este procedimiento puede completar la unión con adhesivo en los casos en que la Inspección o el instalador lo juzgue necesario.
No se admitirán dobleces y arqueamientos de los caños para efectuar cambios de dirección, debiendo emplearse a ese efecto piezas especiales exclusivamente moldeadas por inyección y aprobadas por O.S.N., según las características indicadas en las NORMAS IRAM Nro. 13.331(parte I.
En el caso que no existan en plaza accesorios moldeados por inyección, podrán usarse piezas moldeadas en fabrica, a partir de tubos de P.V.C. rígido que responden a las NORMAS IRAM Nro. 13.324 y 13.331 (parte II.
Los desagües cloacales de las viviendas descargaran a **Cámaras de Inspección de 0,60x0,60 m y Camara Septica (capacidad minima de 1000lts) reglamentarias**. y su construcción se ajustara a las NORMAS IRAM y GRÁFICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES DE O.S.N.

14.1.3 CAÑERIADECONDUCCIONDE GAS

a) Sistema Roscado: Caño Hierro Negro con piezas especiales con revestimiento Epoxi Ø en pulgadas.
b) Sistema Termofusión: Polietileno de media densidad con alma de acero, Ø en mm.
Equivalencias de Ø entre Sistemas:
½" Epoxi = 20 mm. Fusión
¾" Epoxi = 25 mm. Fusión 1" Epoxi =
32 mm. Fusión
1 v1/4" Epoxi = 40 mm. Fusión
Para el diseño de las cañerías se deberán usar las tablas correspondientes para cada sistema, para luego ser aprobado el proyecto por el Ente Prestatario del Servicio.

14.1.4 DESAGÜE PLUVIAL

Las plantas de techo desaguaran a canaletas de chapa galvanizada Nº 25, de acuerdo a

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

lo indicado en planos y detalles correspondientes. Para la colocación de las mismas se deberán seguir estrictamente las reglas del buen arte. Previo a la definición de la compra, se deberá presentar muestra a la Inspección de Obra, para obtener la correspondiente conformidad.
Los Caños de Lluvia Verticales (Bajadas), serán de C. PVC (L. 3,2) de Ø 110 mm (según Planos), desaguado a Vereda perimetral de vivienda, mediante Codo PVC a 90º.
Para el DESAGÜE del Terreno, se instalaran dos (2) Bocas de Desagüe Abiertas, de 20 x20 cm., de Cemento Comprimido, incluido rejilla de FºFº.

14.1.5RTEFACTOS Y ACCESORIOS COCINA:

Para la cocina deberá proveerse e instalarse:

-Mesada de acero inoxidable, con bacha de acero inoxidable de dimensiones 0,50 x 0,40 x 0,18 m., (Tipo E 50 18 de Johnson Acero S.A.) y o similares con Juego mezclador de bronce cromado, con pico móvil, sopapa y tapón plástico, para mesada.

-Pileta de lavar, será de cemento premoldeado, con soporte de hormigón armado, de 0,60 x 0,40m, con dos (2) canillas de bronce cromado (una con pico para manguera), sopapa y tapón plástico.

BAÑO:

Se deberá proveer e instalar:

-Depósito de inodoro, a mochila, de colgar, de loza vitrificada blanca.

-Inodoro pedestal, de loza vitrificada blanca, tipo FERRUM, línea FLORENCIA o similar, con asiento con tapa de plástico reforzado.

-Bidet de loza vitrificada blanca, tipo FERUM línea FLORENCIA o similar, con juego mezcladora de grifería FV o similar.

-Lavabo de loza vitrificada blanca, tipo FERRUM, línea FLORENCIA o similar, con grifería mezcladora FV o similar

-Juego para lavatorio con desagüe incluido, cadena y tapón línea.

-Pie de loza vitrificada blanca, para lavabo.

-Brazo y ducha cromados; con juego de llaves mezclador para ducha, y pico lava pies, de bronce cromado.

-Un perchero de loza blanca simple.

-Portarrollo de 0,15 x 0,15 m. de loza blanca.

-Tohallero de loza blanca con barral de madera laqueado.

-Jabonera de loza blanca de 0,15 x 0,15m. c/ agarradera, en ducha.

-Jabonera de loza blanca de 0.075x 0,15m en lavabo.

El contratista deberá presentar para su aprobación por la Inspección, muestras de cada tipo de artefactos, accesorios y griferías de baño y cocina. Tal presentación deberá efectuarse previo a la definición de la compra.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

14.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA:

14.2.1. La Acometida Eléctrica deberá ser del tipo **DOBLE AISLACION** cumpliendo con disposiciones y condiciones generales detalladas en la RESOLUCION N° 158/08 del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ENERGÍA (E.P.R.E.), teniendo presente los diferentes elementos que son parte integrante de ésta: conexión a la red, protección de la alimentación, línea de alimentación, gabinete de medición, línea principal, tablero principal y línea seccional

En aquellos Municipios que lo acepten, se podrá adoptar como tipo constructivo, **PILARES PREMOLDEADOS.** Previo a su instalación debe verificarse que el modelo de pilar y fabricante se encuentre detallados en el registro de Pilares Premoldeados de Hormigón Armado para Servicio Eléctrico (REPIPSE) según Resolución EPRE Nº 005/07, que garantizará que su construcción esté de acuerdo a lo estipulado en la Resolución EPRE Nº 227/06

Estos se emplazaran a razón de un pilar individual premoldeado por servicio, sobre la línea municipal dentro de los límites del lote, a no menos de 15 cm de la línea medianera, **no admitiéndose bajo ningún concepto el uso de pilar doble premoldeado.**

14.2.2. La interconexión entre los bornes de salida del Tablero principal y los bornes de entrada del tablero Seccional, se realizará mediante acometida subterránea, con cable tipo sintenax, conductor de cobre 2 x 4 mm2 de mínima

Cuando deba tenderse cable subterráneo debajo de veredas, pisos o Plateas de Hormigón Armado, este deberá ir entubado en caño de P.V.C. rígido de 18.6 mm. (7/8") de diámetro interior como mínimo.-

El interruptor Diferencial a instalar será de 2x40 Amp., ubicado según Norma Vigente del Ente prestatario del servicio.(En tablero Gral. o Tablero Seccional)

14.2.3. En el Tablero secundario se instalarán los Interruptores Automáticos Termomagnéticos de 20 Amp. que correspondan según prototipo, a razón de uno por circuito. Deberán contar con sello de aprobación de las normas IRAM .-

14.2.4. Los Tableros secundarios serán de Chapa Nº 18 y doble Tapa o de material sintético aptos para uso eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA 90364.-

14.2.5. Los caños a utilizar para la instalación interna serán de acero semi- pesado, de espesor de pared superior al milímetro, o caños de material sintético aptos para el uso eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA90364.

14.2.6. Las cajas serán de chapa Nº 20 o de material sintético aptos para el uso eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA90364, y se utilizaran de acuerdo a sus dimensiones para:

- Paso y derivación: caja cuadrada (100 x 100 x 40) y Octogonal grande (90 x 90 x 40)
- Salida para centro y brazo de luz: caja octogonal chica (70 x 70 x 40)
- Llave y toma corriente: caja rectangular (100 x 50 x 40) Las

dimensiones están consideradas en milímetros.-

14.2.7. Los conectores a utilizar serán de chapa galvanizada.

En caso de utilizarse caños y accesorios de material sintético, los conectores deberán corresponderse con la cañería y accesorios adoptados

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

14.2.8. La cañería y accesorios se instalaran en forma embutida en un todo de acuerdo a lo estipulado en AEA 90364 y al material elegido-

14.2.9. cables serán aislados en P.V.C. con conductores de cobre, aptos para uso en instalaciones eléctricas domiciliarias con tensión de servicio 220/380V (norma IRAM NM 247/3 ex IRAM 2183 y sus normas relacionadas). La identificación de los conductores será mediante código de colores con Neutro celeste (invariable) y fase castaño, negro o rojo.

14.2.10. Se instalarán bocas de luz con portalamparas de 3 piezas, con rosca E27 EDISOU de baquelita, la rosca sera de chapa y la base de porcelana aislada, los Toma corrientes con descarga a tierra, para fichas de 3 espigas planas, tipo 10 A. – 250 V; según norma IRAM Nº 2071 . La Campanilla eléctrica (Timbre) a instalar, será embutida con transformador 220/12 V (S/ Norma) y se incluirá Cañería, Cableado y Pulsador.-

14.2.11. La puesta a tierra de la Instalación, se efectuará mediante jabalina de cobre laminado con núcleo de acero (tipo Copperweld) según norma IRAM N° 2309 de 1,50 m. a 3,00 m. de longitud y 5/8" de diámetro, conectada al tablero seccional, por conductor de cobre aislado con forro bicolor (verde y amarrillo) de 4 mm2 como mínimo y el cableado, por toda la instalación, de un conductor de 2,5 mm2 sección, apto para uso en instalaciones eléctricas domiciliarias con tensión de servicio 220/380V (IRAM NM 247/3 ex IRAM 2183 y sus normas relacionadas.

Desde caja de inspección de puesta a tierra, ubicada dentro de la vereda perimetral, hasta el tablero seccional, el caño para el conductor de la línea de protección, será metálico o sintético y exclusivo.

En caso de cajas de medición, de tableros y demás cajas metálicas la Línea de Protección (PE) estará conectada y fijada mediante terminales de cobre estañado debidamente indentados.

14.2.12. La Contratista, deberá realizar por su cuenta y cargo todas las tramitaciones de aprobación, que correspondan, ante los Organismos de contralor y/o prestatarios de los servicios (Municipalidades, Cooperativas, etc).-

14.2.13. Para aspectos no indicados en esta especificación, regirá lo establecido en la "Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina, y que cuenta con la adhesión del EPRE en Jurisdicción provincial (Resolución N° 129/01).-

14.3 INSTALACIÓN DE GAS

14.3.1. DOCUMENTACIÓN:

La contratista, para dar comienzo con los trabajos, deberá contar con la autorización correspondiente, otorgada por el Ente prestatario del Servicio (Sociedad intermedia autorizada por el ente regulador del gas ENARGAS), dependiendo de la Localidad; mediante la aprobación del Legajo de proyecto y el pago del arancel que correspondiere; efectuando la entrega de copia aprobada del mismo a la Inspección de Obra, para así poder dar inicio a los trabajos. Instaladas las Cañerías completas de alimentación de gas y Conducto de ventilación de calefón y Ventilaciones complementarias, la Contratista deberá gestionar la "Inspección PARCIAL " (Recorrido Total de Cañerias Instaladas) sin artefactos (Bocas Taponadas), para luego el adjudicatario pueda pedir la "Inspeccion FIINAL" previamente conectado el o los artefactos que el Ente Prestatario del Servicio le exija.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

14.3.2. La instalación se proyectará de acuerdo a las posibilidades que brinde la localidad donde se realicen; subdividiéndose de la siguiente forma:

a) Localidad con servicio de gas natural existente y que la instalación se realice en el área servida:
Se realizará para funcionar directamente con gas natural, con nicho para medidor y regulador (0,40 x 0,50 x 0,25 mts).) ubicado sobre Línea Municipal para el caso de Viviendas individuales; y para el caso de Viv. colectivas, nicho p/regulación en
L.M. (tamaño de acuerdo al consumo), Instalación de conjunto, y nichos p/medidores, ubicados convenientemente.-

b) Localidad con servicio de gas natural existente y que la instalación se realice en el área no servida:
En el caso de no contar con factibilidad del ente prestatario, que garantice la habilitación del servicio en el momento en que se terminen las viviendas, se deberá hacer la Instalación **COMBINADA**, incluyendo los tramos de Cañería en Vivienda, Gabinete para dos Cilindros de Gas Envasado (sin provisión de los mismos y con Regulador de 3 m3/h), Cañería de Prolongación y **Nicho de 40 x 50 x 25cm** (en Línea Municipal), para Medidor y Regulador de Gas Natural de 6 m3/h.-

c)Localidad que no cuente con servicio de gas natural:

Se realizará la instalación para funcionar por medio de Equipo individual de cilindros de 45 Kg cada uno, de acuerdo a capítulo 2, punto 2.1. del reglamento vigente .-
Salvo casos especiales donde se plantee funcionar con equipos de Gas Licuado de petróleo.-
14.3.3. Cañerias de Conducción de Gas se podrán realizar de dos formas: SISTEMA ROSCADO: Caño hierro negro con piezas especiales con revestimiento EPOXI Ø en pulgadas

SISTEMA TERMO FUSION: Polietileno de media densidad con alma de acero, Ø en mm.-

Equivalencias de Ø entre sistemas
½" Epoxi = 20 mm Fusion
3/4" Epoxi = 25 mm Fusion
1" Epoxi = 32 mm Fusion
1 1/4" Epoxi = 40 mm Fusion
Para el diseño de las cañerías se deberán usar las tablas correspondientes para cada sistema, para luego ser aprobado el proyecto por el Ente Prestatario del Servicio.-

a) CAÑERIAS DE HIERRO CON REVESTIMIENTO EPOXI
Toda cañería y accesorio que se instale será de hierro negro, con revestimiento epoxi; las que estén en mampostería, se pintarán todas las uniones entre caño y accesorio como así también las raspaduras en los caños, con pintura epoxi; en el caso en que estén en contacto con terreno natural o por contrapiso, las uniones y raspaduras deberán protegerse con revestimientos plásticos aprobados para tal fin (cinta polyguard ó similar); para cañerías que queden a la vista (aéreas), se cubrirán con pintura epoxi; a toda cañería que se le coloquen grampas de amarre, se le interpondrá entre ésta y el caño, algún elemento aislante (cinta polyguard ó símil); aplicándose el mismo criterio para cañerías en contacto con otra ó metal (hierros etc.).-

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

b) CAÑERIAS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON ALMA DE ACERO
Todas las tuberías como los accesorios utilizados deberán contar con la aprobación respectiva ante ENARGAS.
Según la Norma NAG 210, del Enargas , en ambientes habitables las tuberías de Termofusión no deberán instalarse a la vista en ambientes habitables por ejemplo : cocinas, lavaderos, dormitorios, garages, salas de estar. Dentro de nichos deberá instalarse cañerías con recubrimiento epoxi.
Para el cálculo de diámetros debe emplearse el método indicado en LAS DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS . NAG 200 -.
Las cañerías embutidas deben empotrarse como tuberías metálicas, con morteros reforzados con cemento 1:3, cada 1,50 a 2 metros. Y una vez probadas e inspeccionadas por la autoridad correspondiente, se pueden tapar con mezclas comunes, no demasiado fuertes.
Los puntos de anclaje y fijación deben estar a una distancia mínima de 0,20 m de cualquier unión.

Dado que el polietileno ofrece alta resistencia a sustancias ácidas y básicas, las tuberías de termofusión no requieren protección anticorrosivo alguna.
Las cañerías no podrán estar en contacto con ningún conducto o artefacto eléctrico. En el caso que se cruce con cañerías embutidas debe interponerse algún elemento aislante perfectamente asegurado.
Se podrán instalar cañerías a la vista en ambientes **NO HABITABLES** según lo indicado en el artículo 5.5 de LAS DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS VIGENTE – NAG 200.

Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse para evitar que la luz solar degrade prematuramente el polietileno. Se recomienda la aplicación de cinta con film de aluminio virgen y máxima adherencia aprobada para tal fin. Conforme con lo estipulado en el punto 3.3 de las DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS VIGENTE, la instalación de baja presión soportará, sin pérdidas, una presión neumática manométrica de 0,2 kg/cm2 (0 a 0,098 MPa).
14.3.4. La instalación contará con 3 bocas: para Cocina, Calefón y Calefactor de R.I.. No se contempla la provisión y colocación de artefactos.-
14.3.5. Toda cañería subterránea descansará sobre lecho de tierra (profundidad mínima 0,30 mts.), siempre y cuando esta sea resistente o se le provoque la compactación necesaria, en caso contrario se exigirá lecho de ladrillos.-
14.3.6. En el gabinete individual se proveerá e instalará el regulador de presión con sus accesorios.
El regulador deberá ser modelo aprobado por Gas del Estado de 3 m3/hs..-
14.3.7. Las ventilaciones de calefones se ejecutarán en forma individual, con cañería de chapa cinchada de 100 mm. de diámetro y remate a 4 vientos y en el caso que se deje pico para estufa de rayos infrarrojos, ó de tiro natural la ventilación que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el capítulo VIII del reglamento vigente.-
14.3.8. La obra no incluye la provisión de cilindros en caso de que esta los llevara.-
14.3.9. Terminada la Obra, La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, la Documentación aprobada de cada vivienda. La misma estará integrada por una Carpeta conteniendo: Formularios de Inspección Parcial (recorrido total de cañerias y ventilaciones c/ bocas taponadas) y copia de Plano de la Vivienda con el recorrido de la

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

cañería (aprobado por el Organismo prestatario del Servicio
o Ente regulador que corresponda) y copia de Plano de la Vivienda.-
14.3.10.Provision de Artefactos de gas:
Para los casos que se deban proveer artefactos Cocina y Calefon los mismos serán aprobados y con las siguientes características:

A) Artefacto Cocina: se deberá proveer el artefacto cocina aprobado, el mismo contara con cuatro hornallas y Horno, todos los quemadores de hornallas y horno tendrán su válvula de seguridad individual (Termo Cupla)

Este artefacto será dual, es decir contara con los juegos de inyectores para funcionar indistintamente con GN o GE.-

B) Artefacto Calefon: Se deberá proveer el artefacto calefón aprobado, el mismo será de 14 Lts./hs, Dual con la provisión de los juegos de inyectores para funcionar indistintamente con GN o GE.-

Nota: En todos los casos se contempla la provisión y colocación de materiales y mano de obra para la instalación de los mismos.

Así también las conexiones serán realizadas con cañerías y accesorios especiales revestimiento Epoxi (Rigido), para los casos que se usen conexiones especiales estas serán aprobadas y tomando todos los recaudos exigidos por los Entes Prestadores de los Servicios.-

15-VIDRIOS: Serán vidrios dobles de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpintería.

16-PINTURA:

16-1INTERIOR A LA CAL: Sobre el paramento previamente preparado, mediante la eliminación del polvo suelto mediante cepillado y lijado, se aplicarán dos manos de pintura a la cal.
Deberá preverse que la tarea del pintado se realizará después que todos los gremios que intervienen en la construcción de la vivienda, hayan terminado sus trabajos.

16-2 EXTERIOR AL LATEX: En todos los paramentos exteriores, se aplicaran dos manos de pintura al látex de primera calidad. Previo a ello se deberá preparar la superficie con un cepillado o lijado a efecto de eliminar el polvo suelto.

Deberá preverse que la tarea del pintado se realizará después que todos los gremios que intervienen en la construcción de la vivienda, hayan terminado sus trabajos.

16-3PINTURA EN CARPINTERIA METALICA: Se colocara dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color a determinar por la inspección.

16-4: PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA: Se colocara dos manos de pintura antioxido.

16-5PINTURA EN HOJAS PLACAS: Previo al tratamiento de las hojas, las superficies a pintar deberán estar lijadas y limpias, libre de polvo o aserrín,

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

posteriormente se barnizarán las superficies, primeramente se aplicará una mano de barniceta, (barniz al 50% con aguarras) y luego dos manos de barniz

17-VARIOS

17-1.MESADA: Serán de acero inoxidable con bacha incluida y con las dimensiones de 0,60 m x 1,20 m, apoyada sobre dos pilares de mampostería revocada. Los colores y granulometría a utilizar serán previamente convenidos con el Inspector de Obra.

17-2 MOLDURA EXTERIOR: Llevara un azotado de cemento y arena mezcla 1:3 con 10% de hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado, Las cuales se realizarán el el perímetro de las aberturas exteriores.

18. DETALLES URBANOS

18.1- SOLADOS: Se ejecutaran de 0,80 m. para vereda de ingreso a vivienda, y conforme a lo especificado en el plano de detalles SOLADOS TIPO S.

18.2- RAMPAS: En accesos a viviendas para discapacitados se deberá prever la ejecución de rampas para salvar cualquier tipo de desnivel. Los solados serán duros, fijados firmemente al sustrato, antideslizante, y sin resaltos, de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas. El ancho mínimo de estas rampas o veredas de ingreso será de 1,00m.

18.3-CERCO DIVISORIO: Se ejecutaran en lugares indicados en el plano de Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en e la planilla de detalles correspondiente, en lo referido a las dimensiones y tipo de materiales, asegurando el perfecto tensado de los alambres, y fijación de los postes.

18.4-MURO DE CONTENCIÓN: Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo referido a las dimensiones y tipo de materiales.

ANEXO

SITUACIONES ESPECIALES (Discapacitados):

En los casos en que se ejecute el prototipo para Situaciones Especiales (Discapacitados), se deberá prever la colocación del siguiente kits de ACCESORIOS , complementario de lo detallado planos y en las especificaciones para el correspondiente prototipo:

BAÑO:

Inodoro Ferrum Línea Espacio o similar, con asiento y deposito con accionamiento automático.

Lavatorio Ferrum Línea Espacio o similar, incluido grifería automática. Barra fijo

tipo L.

Barral rebatible de 80 x 18,5cm, para laterales del inodoro Barral rebatible con portarrollo, de 80cm.para lateral de inodoro. Barral rebatible de 60 x 18,5cm para laterales de lavatorio.

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

Silla rebatible para ducha.

Ducha manual con barral y grifería Dance III de fv o similar

COCINA:

Pileta de Acero Inoxidable para cocina 50x40x18 c/grifería :canilla automática para mesada para discapacitados. Línea Pressmatic de fv o similar. Código 0361.03

IAPV IAPV IAPV

PRESUPUESTO POR 1 VIVIENDA.-

ITEM	DESIGNACION DE TRABAJOS	UNID.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	INC. %
I	**OBRAS PRELIMINARES**					**1,42%**
1	Limpieza del terreno, Nivelación, Cartel de obra, Replanteo, Vallado, etc.	Gl	1,00			
II	**OBRAS DE VIVIENDA**					
2	**EXCAVACIONES**					**0,49%**
2-1	Excavación de bases	m3	4,20			
2-2	Excavación para encadenados	m3	3,90			
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº.-**					**9,59%**
3-1	Bases	m3	3.68			
3-2	Fustes	m3	0,35			
3-3	Encadenado inferior	m3	2,81			
3-4	Riostras verticales	m3	1,47			
3-5	Encadenado superior	m3	1,49			
3-6	Losa Ingreso	m2	2,22			
4	**MAMPOSTERIA EN ELEVACION**					**10,58%**
4-1	De ladrillos comunes de 0,30 m de espesor	m2	17,75			
4-2	De ladrillos huecos de 0,20 de espesor	m2	88,95			
4-3	De ladrillos huecos de 0,15 de espesor	m2	54.90			
5	**CAPAS AISLADORAS**					**0,95%**
5-1	Envolvente en muros exteriores e interiores	m2	37,50			
6	**CUBIERTA DE TECHOS**					**10,14%**
6-1	De Ch. G. BWG Nº 25 incluido estructura metálica s/ especificaciones	m2	57,85			
7	**REVOQUES**					**13,48%**
7-1	Interior grueso a la cal fratazado	m2	150,60			
7-2	Grueso bajo revestimiento	m2	19,00			
7-3	Exterior impermeable gruezo fratazado	m2	80,70			
7-4	Revestimiento tipo venezia	m2	27,00			
8	**CIELORRASOS**					**4,44%**
8-1	De yeso tipo Durlock plano desmontable incluído perfilería de sostén con barrera de vapor	m2	55,00			
9	**CONTRAPISOS**					**5,51%**
9-1	De Hº Pº interior sobre terreno natural (espesor 12 cm)	m2	55,00			
9-2	De Hº Pº exterior sobre terreno natural (espesor 10 cm)	m2	22,25			
10	**PISOS**					**8,92%**
10-1	Carpeta cemento interior	m2	55,00			
10-2	Carpeta de cemento rodillado exterior	m2	22,25			
10-3	Cerámico esmaltado 20x20	m2	55,00			
11	**ZOCALOS**					**1,01%**
11-1	Cerámico esmaltado 10x20	ml	57,40			
12	**REVESTIMIENTOS**					**2,58%**
12-1	De azulejos 15x15	m2	17,00			
13	**ABERTURAS**					**3,86%**
13-1	Tipo P1	Unid.	1,00			
13-2	Tipo P2	Unid.	1,00			
13-3	Tipo P3	Unid.	2,00			
13-4	Tipo P4	Unid.	1,00			
13-5	Ventana V1 (con Rejas)	Unid.	2,00			
13-6	Ventana V1 (con postigón)	Unid.	2,00			
13-7	Ventana V2	Unid.	1,00			
13-8	Ventana V3	Unid.	1,00			
14	**INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA**					**3,59%**
14-1	Pilar de entrada incluida provisión y colocación c/acometida aérea c/CºHºGº completo, caja medidor, caja tablero gral. Completo y puesta a tierra reglamentaria.	Unid.	1,00			
14-2	Tablero seccional incluidoProvisión Y colocacióndе caja p/1 ID. Y 2 llaves termomagnéticas, 2 termomagnéticas 10 A, acometida subterranea y puesta a tierra reglamentaria	Unid.	1,00			
14-3	Centro y/o brazo de luz incluido provisión y colocación de cañería, cables y llaves	Unid.	11,00			

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

14-4	Tomacorriente incluido provisión y colocación de cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica	Unid.	12,00			
14-5	Tomacorriente incluido provisión y colocación de cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica para A.A.	Unid.	2,00			
14-6	Campanilla eléctrica (incluido provisión y colocación de cañería solamente)	Unid.	1,00			
14-7	Caja TV incluido provisión y colocación de cañerías	Unid.	3,00			
14-8	Caja TELEFONO incluido provisión y colocación de cañerías	Unid.	1,00			
15	**INSTALACION SANITARIA INTERNA**					**7,67%**
15-1	Provisión de agua incluido provisión y colocación de alimentación a T. R., bajadas de distribución de agua fría y caliente. Broncería	Unid.	1,00			
15-2	Artefactos y accesorios, provisión y colocación	Unid.	1,00			
15-3	Desagues cloacales, provisión y colocación incluyendo camara septica	Und.	1,00			
15-4	Desagues pluviales, provisón y colocación	Unid.	1,00			
16	**INSTALACION PARA GAS INTERNA**					**6,49%**
16-1	Inst. p/gas combinada 3 picos: cocina, calefón y calefactor s/salida al exterior incl. Prov y coloc. De cañerías desde artefactos hasta te pto.2, llp, ventilaciones, etc.	Unid.	1,00			
16-2	Prov. y coloc. de regulador GE, gab prefab, cañerías desde pto. 3 hasta regulador, puertas de ref, etc	Unid.	1,00			
16-3	Prov. Y coloc.de nicho de chapa 0,50x0,40x0,25 en L.M., cañería desde pto2 hasta NMR	Unid.	1,00			
16-4	Prov. Y coloc.de Cocina 4 hornallas y horno	Unid.	1,00			
16-5	Prov. Y coloc.de Calefon 14 Lts.	Unid.	1,00			
17	**VIDRIOS**					**1,10%**
17-1	Dobles transparentes	m2	3,71			
17-2	Dobles traslúcidos	m2	0,45			
18	**PINTURAS**					**6,15%**
18-1	Interior a la cal	m2	168,40			
18-2	Látex p/exteriores color	m2	105,00			
18-3	En carpintería metálica antioxido y esmalte sintético (marcos y hojas)	m2	5,00			
18-4	Antióxido en perfilería de techo	m2	25,00			
18-5	En carpintería de madera base y esmalte sintético	m2	9,64			
18-6	Látex para cielorrasos	m2	55,00			
19	**VARIOS**					**2,04%**
19-1	Mesada Acero Inoxidable c/bacha AºI - Colocada	m2	1,92			
19-2	Perfiles doble T Nº 10 (apoyo tanque)	Nº	2,00			
19-3	Limpieza parcial y final de obra	Nº	1,00			

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

PRESUPUESTO POR 1 VIVIENDA SITUACIONES ESPECIALES.-

ITEM	DESIGNACION DE TRABAJOS	UNID.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	INC. %
I	**OBRAS PRELIMINARES**					**1,42%**
1	Limpieza del terreno, Nivelación, Cartel de obra, Replanteo, Vallado, etc.	Gl	1,00			
II	**OBRAS DE VIVIENDA**					
2	**EXCAVACIONES**					**0,49%**
2-1	Excavación de bases	m3	4,20			
2-2	Excavación para encadenados	m3	4,10			
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº.-**					**9,59%**
3-1	Bases	m3	3,68			
3-2	Fustes	m3	0,35			
3-3	Encadenado inferior	m3	2,81			
3-4	Riostras verticales	m3	1,47			
3-5	Encadenado superior	m3	1,50			
3-6	Losa Ingreso	m2	2,22			
4	**MAMPOSTERIA EN ELEVACION**					**10,58%**
4-1	De ladrillos comunes de 0,30 m de espesor	m2	18,41			
4-2	De ladrillos huecos de 0,20 de espesor	m2	89.61			
4-3	De ladrillos huecos de 0,15 de espesor	m2	55.22			
5	**CAPAS AISLADORAS**					**0,95%**
5-1	Envolvente en muros exteriores e interiores	m2	38,20			
6	**CUBIERTA DE TECHOS**					**10,14%**
6-1	De Ch. G. BWG Nº 25 incluido estructura metálica s/ especificaciones	m2	59,35			
7	**REVOQUES**					**13,48%**
7-1	Interior grueso a la cal fratazado	m2	153,25			
7-2	Grueso bajo revestimiento	m2	20.32			
7-3	Exterior impermeable gruezo fratazado	m2	80,70			
7-4	Revestimiento tipo venezia	m2	27,00			
8	**CIELORRASOS**					**4,44%**
8-1	De yeso tipo Durlock plano desmontable incluído perfilería de sostén con barrera de vapor	m2	56,42			
9	**CONTRAPISOS**					**5,51%**
9-1	De Hº Pº interior sobre terreno natural (espesor 12 cm)	m2	56,42			
9-2	De Hº Pº exterior sobre terreno natural (espesor 10 cm)	m2	22,47			
10	**PISOS**					**8,92%**
10-1	Carpeta cemento interior	m2	56,42			
10-2	Carpeta de cemento rodillado exterior	m2	22,47			
10-3	Cerámico esmaltado 20x20	m2	56,42			
11	**ZOCALOS**					**1,01%**
11-1	Cerámico esmaltado 10x20	ml	58,20			
12	**REVESTIMIENTOS**					**2,58%**
12-1	De azulejos 15x15	m2	16,81			
13	**ABERTURAS**					**3,86%**
13-1	Tipo P1	Unid.	1,00			
13-2	Tipo P2	Unid.	1,00			
13-3	Tipo P3	Unid.	3,00			
13-4	Ventana V1 (con Rejas)	Unid.	2,00			
13-5	Ventana V1 (con postigón)	Unid.	2,00			
13-6	Ventana V2	Unid.	1,00			
13-7	Ventana V3	Unid.	1,00			
14	**INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA**					**3,59%**
14-1	Pilar de entrada incluida provisión y colocación c/acometida aérea c/CºHºGº completo, caja medidor, caja tablero gral. Completo y puesta a tierra reglamentaria.	Unid.	1,00			
14-2	Tablero seccional incluidoProvisión Y colocacióndecaja p/1 ID. Y 2 llaves termomagnéticas, 2 termomagnéticas 10 A, acometida subterranea y puesta a tierra reglamentaria	Unid.	1,00			
14-3	Centro y/o brazo de luz incluido provisión y colocación de cañería, cables y llaves	Unid.	11,00			


IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

14-4	Tomacorriente incluido provisión y colocación de cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica	Unid.	12,00			
14-5	Tomacorriente incluido provisión y colocación de cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica para A.A.	Unid.	2,00			
14-6	Campanilla eléctrica (incluido provisión y colocación de cañería solamente)	Unid.	1,00			
14-7	Caja TV incluido provisión y colocación de cañerías	Unid.	3,00			
14-8	Caja TELEFONO incluido provisión y colocación de cañerías	Unid.	1,00			
15	**INSTALACION SANITARIA INTERNA**					**7,67%**
15-1	Provisión de agua incluido provisión y colocación de alimentación a T. R., bajadas de distribución de agua fría y caliente. Broncería	Unid.	1,00			
15-2	Artefactos y accesorios, provisión y colocación	Unid.	1,00			
15-3	Desagues cloacales, provisión y colocación incluyendo camara septica	Und.	1,00			
15-4	Desagues pluviales, provisón y colocación	Unid.	1,00			
16	**INSTALACION PARA GAS INTERNA**					**6,49%**
16-1	Inst. p/gas combinada 3 picos: cocina, calefón y calefactor s/salida al exterior incl. Prov y coloc. De cañerías desde artefactos hasta te pto.2, llp, ventilaciones, etc.	Unid.	1,00			
16-2	Prov. y coloc. de regulador GE, gab prefab, cañerías desde pto. 3 hasta regulador, puertas de ref, etc	Unid.	1,00			
16-3	Prov. Y coloc.de nicho de chapa 0,50x0,40x0,25 en L.M., cañería desde pto2 hasta NMR	Unid.	1,00			
16-4	Prov. Y coloc.de Cocina 4 hornallas y horno	Unid.	1,00			
16-5	Prov. Y coloc.de Calefon 14 Lts.	Unid.	1,00			
17	**VIDRIOS**					**1,10%**
17-1	Dobles transparentes	m2	3,71			
17-2	Dobles traslúcidos	m2	0,45			
18	**PINTURAS**					**6,15%**
18-1	Interior a la cal	m2	170,76			
18-2	Látex p/exteriores color	m2	106,32			
18-3	En carpintería metálica antioxido y esmalte sintético (marcos y hojas)	m2	5,00			
18-4	Antióxido en perfilería de techo	m2	25,00			
18-5	En carpintería de madera base y esmalte sintético	m2	9,64			
18-6	Látex para cielorrasos	m2	56,42			
19	**VARIOS**					**2,04%**
19-1	Mesada Acero Inoxidable c/bacha AºI - Colocada	m2	1,92			
19-2	Perfiles doble T N° 10 (apoyo tanque)	Nº	2,00			
19-3	Limpieza parcial y final de obra	Nº	1,00			

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV

INSTITUTO AUTÁRQUICO DE
FOLIO 165

Municipalidad de Urdinarrain

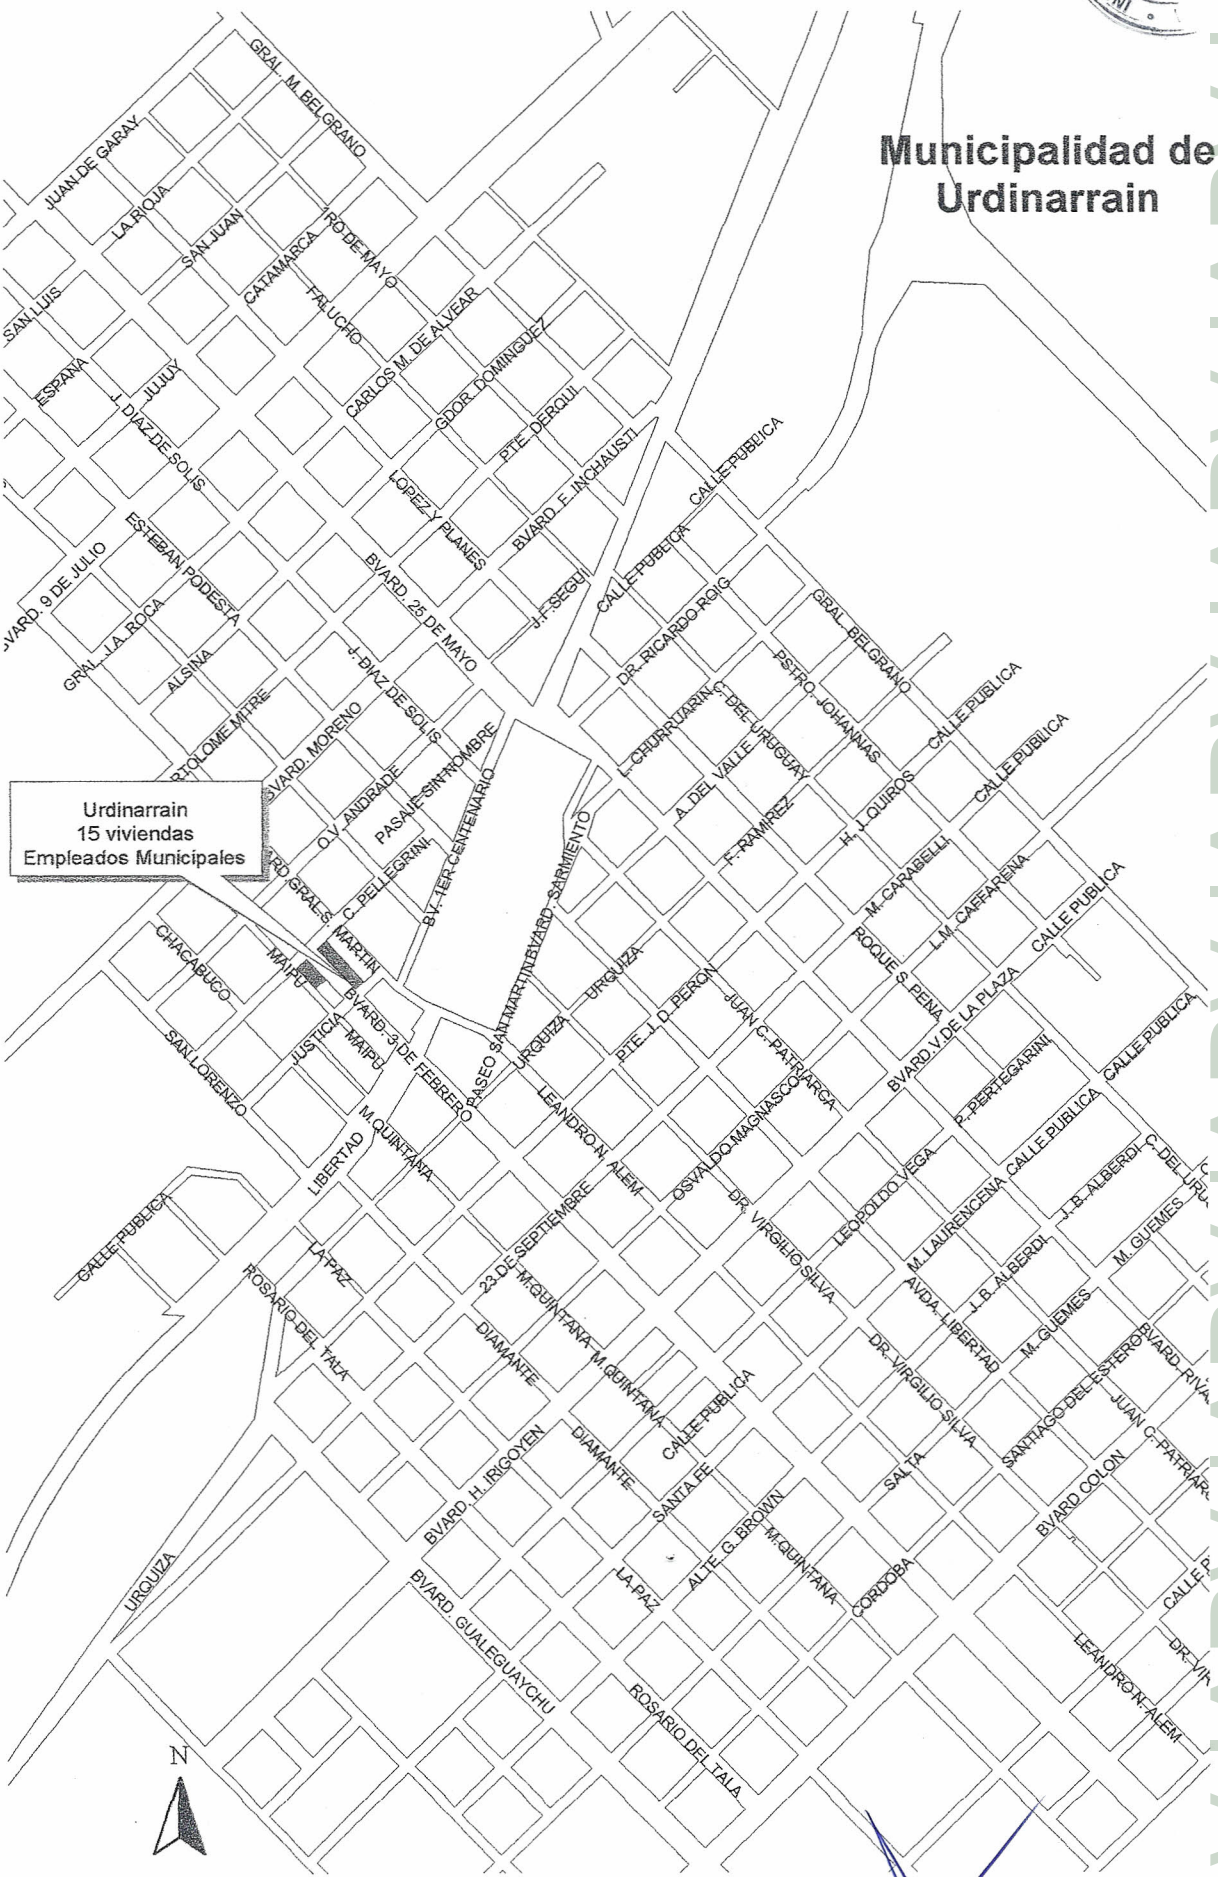

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV



Ing. AMERICO VALENTE
GERENTE TÉCNICO
I.A.P.V.

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA DE ENTRE RÍOS

OBRA: Urdinarrain *15 viviendas - Empleados Municipales*

UBICACIÓN: *Mz. nº112; Bvrd. 3 de Febrero entre calles Pellegrini y Justicia; Calles Pellegrini y Maipú*

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA FOLIO 333

IAPV IAPV IAPV

Lote 1 13185

Nº 13183

FOLIO 167

DEP. DE GUALEGUAYCHU - CIUDAD DE URDINARRAIN


MANZANA Nº 112 y 113 B.

MACCHI - SUC. DE Isidoro Amadeo


TITULO INSCRIPTO AL TOMO 46 FOLIO 333 AÑO 1933

PARTIDAS Nº 70438-70845-Gchú. Diciembre 1958

ESCALA 1:1000

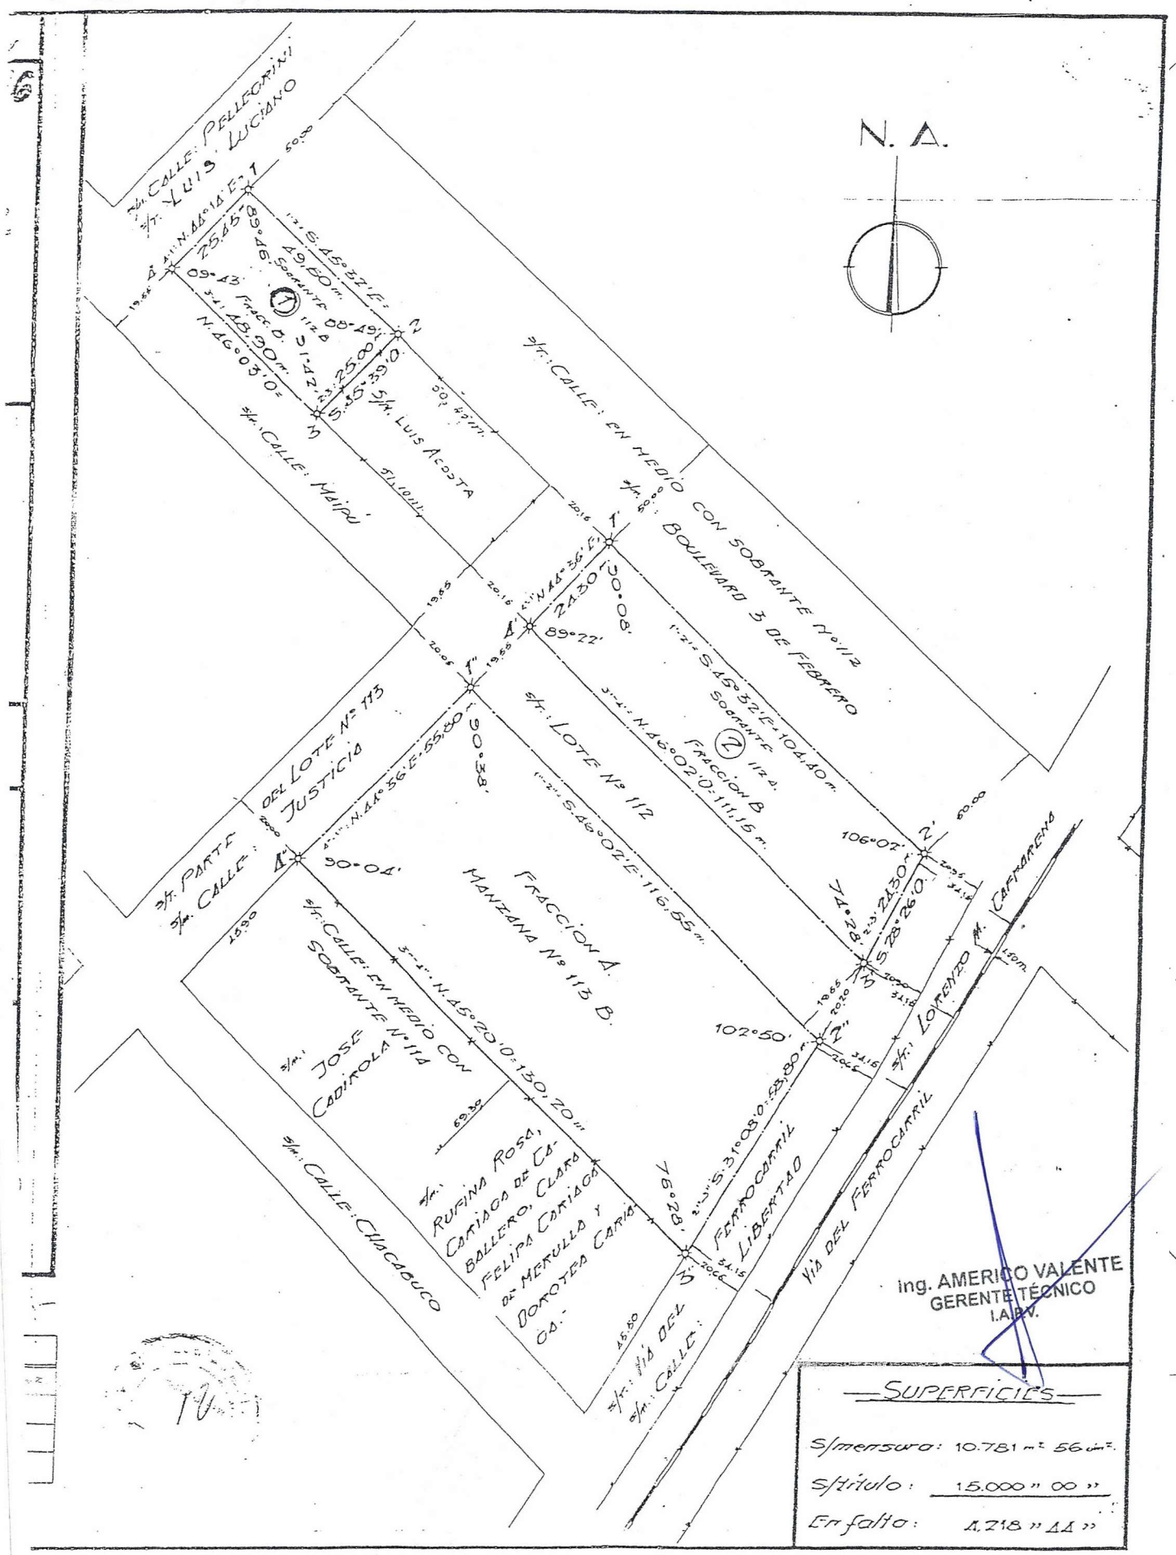

UBICACION

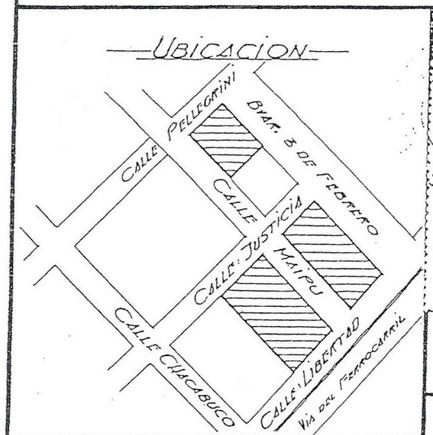

ZONA 2ª

ROBERTO F. UGARTE
MAT. 607
L. N. Golmo 812

FRACCION	LOTE	SUP. S/m.	SUP. S/T.	EN FALTA
A	---	6.972 m². 38 dm².	8.730 m². 00 dm².	1.777 m². 62 dm.
B	1	1.240 " 27 "	2.035 " 00 "	794 " 73 "
"	2	2.568 " 91 "	4.215 " 00 "	1.646 " 09 "
TOTALES		10.781 " 56 "	15.000 " 00 "	4.218 " 44 "

Ing. AMERICO VALENTE
GERENTE TÉCNICO
I.A.P.V.

IAPV IAPV IAPV

77843

PLANO DE MENSURA DE LA PARCELA UBICADA EN:
Provincia de Entre Rios Departamento Gualeguaychú Distrito Pehuajó al Norte
Municipio de Urdinarrain -- Planta Urbana Manzana N°112 A (Lote A) y 112 D Lote C1 y C2) Lote de Calle (Lote B)
Domicilio Parcelario: (Lote A) Sobre calle Pellegrini, dist. a Bvard. San Martín:25,60m y a calle Maipu: 54,25m (Lote B) Lote de calle, dist. a Bvard. San Martín:45,60m y a calle Maipu:34,55m Lote C1) Sobre calle Pellegrini, dist. a Bvard. San Martín:65,30m y a calle Maipu: 24,85m Lote C2) Sobre Calle Justicia, dist. a Bvard. San Martín:65,58m y a calle Maipu:25,50m

PROPIETARIO:

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN

INSCRIPCION DEL DOMINIO: Gualeguaychú, 16 de Junio de 2.006 Matricula N° 135.206

PARTIDA N°: 144.441


Gualeguay, Febrero de 2.010

ESCALA 1 = 750 0 7,5 15 22,5 30 75,00m.

TRAMITE PREFERENCIAL

OBJETO: Subdivisión parcelaria.-

CROQUIS DE UBICACION:

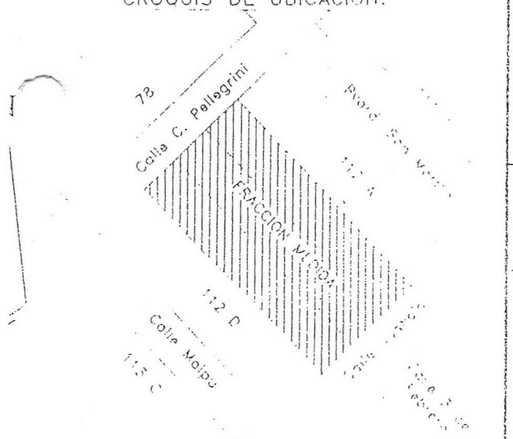

Julio R.SUAREZ
Ing.Geog. - Matricula 23.044
Córdoba N° 43 - Gualeguay

ANTECEDENTES:
Plano Nro.: 67.457


ZONA
1ra.

ESTUDIO DE AGRIMENSURA
—SUAREZ—
JULIO R. SUAREZ
Ing. Geog. - Mat. C.A.P.E.R. 23044
Córdoba 43 Tel. 03444-423062
2820 Gualeguay - E. Ríos

12 MAR 2010 ENTRADO EN LA FECHA

15 MAR 2010 REGISTRADO EN LA FECHA Depósito Calle Nº 1 y 7 Catastro

REGISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO
FECHA 15 / 03 / 2010
PARTIDA Nº 144.441
LOTE A

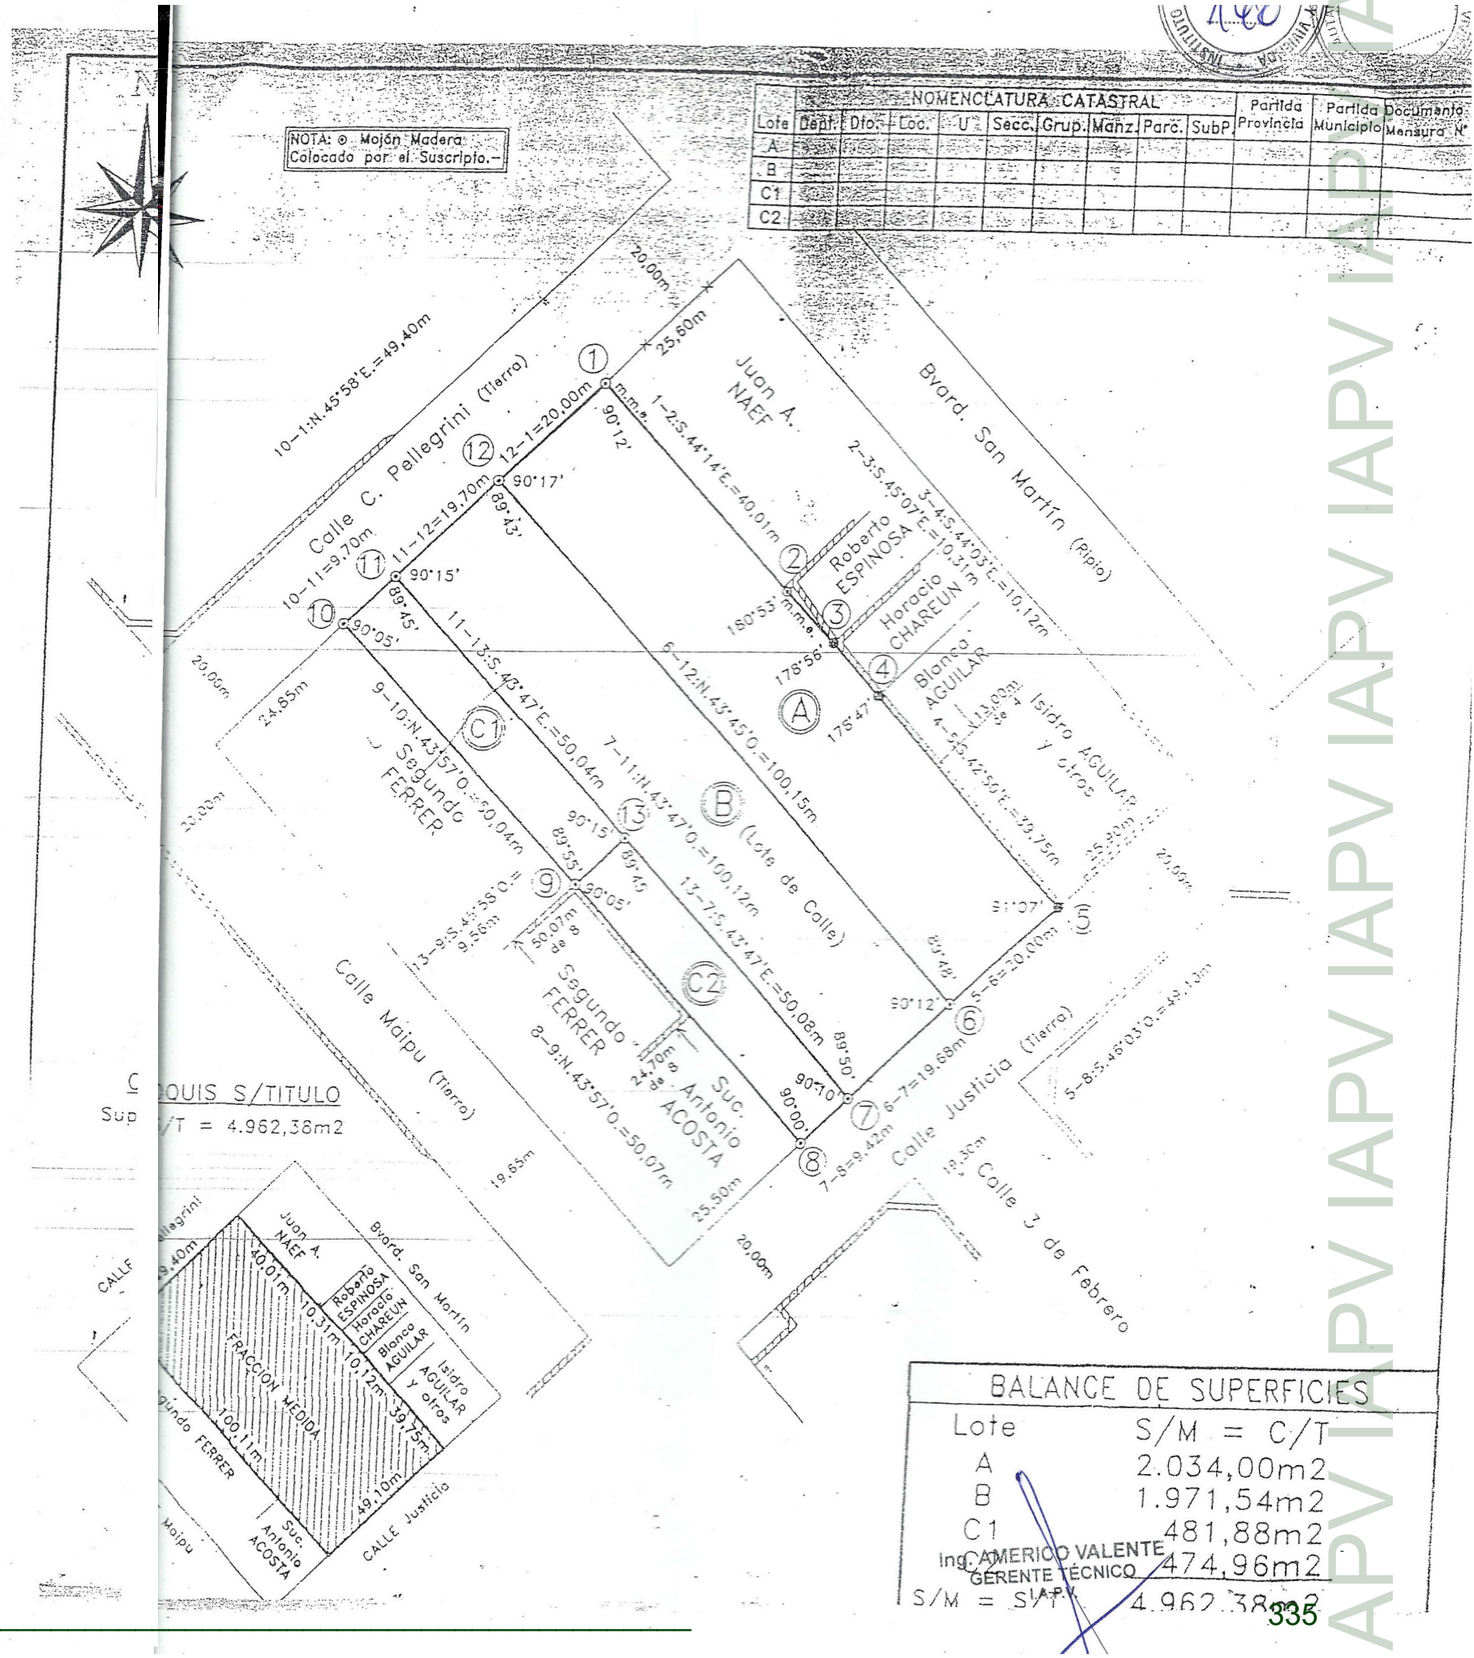

IAPV IAPV IAPV IAPV IAPV
